


Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 34. sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine, donosi

**INTERVENCIJSKI PLAN GRADA VUKOVARA IZRAĐEN U SKLOPU
PROGRAMA INTEGRIRANE FIZIČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE
REGENERACIJE MALIH GRADOVA NA RATOM POGOĐENIM PODRUČJIMA**

I.





Europska unija
Zajedno do fondova EU



Intervencijski plan Grada Vukovara

Sadržaj:

0. Uvod.....	6
0.1 Svrha i predmet dokumenta.....	6
0.1.1 Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.....	6
0.1.2 Metodologija izrade dokumenta.....	10
0.2 Sukladnost s nalazima Analize područja i opis procesa strateškog planiranja.....	14
0.2.1 Nalazi Analize područja općenito.....	14
0.2.2 Planske domene.....	15
0.2.3 Razvojne teme.....	16
0.2.4 Matrica intervencijske logike.....	17
0.2.5 Razvojni scenariji.....	17
0.3 Informiranje i javne konzultacije u procesu razvoja intervencijskog plana.....	20
I. Razvojna strategija grada.....	21
I.1 Razvojna vizija grada.....	21
I.2 Razvojni ciljevi.....	21
I.3 Zajednički pokazatelji.....	29
I.4 Horizontalne teme.....	30
II. Razvojni prioriteti.....	32
III. Plan provedbe.....	43
III.1 Prioritizacija projekata.....	43
III.1.1 Kriteriji i metodologija prioritizacije.....	43
III.1.2 Ocjena projekata.....	44
III.2 Portfolio projekata.....	46
III.2.1 Projektni obrasci.....	46
III.2.2 Vremenski plan provedbe.....	120
III.3 Upravljanje.....	121
III.3.1 Odgovornosti u provedbi IP-a.....	121
III.3.2 Organizacija i odgovornosti za provedbu individualnih projekata.....	123
III.3.3 Plan praćenja provedbe IP-a i održivost projektnih rezultata.....	124
III.3.4 Kapaciteti za provedbu.....	125
Prilozi.....	128
PRILOG 1: ANALIZA PODRUČJA GRADA VUKOVARA.....	128

PRILOG 2: POSTER PLAN GRADA VUKOVARA.....	128
PRILOG 3: AKCIJSKI PLAN IP-A GRADA VUKOVARA.....	128

Popis kratica:

EFRR	Europski fond za regionalni razvoj
EP	Elementi projekta
ESF	Europski socijalni fond
ESI fondovi	Europski strukturni i investicijski fondovi
EU	Europska unija
FZOEU	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
HGK	Hrvatska gospodarska komora
HZMO	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
HZZ	Hrvatski zavod za zapošljavanje
IP	Intervencijski plan
IVD	Indeks višestruke deprivacije
JIP	Jedinica za intervencijski plan
JLS	Jedinica lokalne samouprave
LAG	Lokalna akcijska grupa
MRMS	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
MRRFEU	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
MSP	Mala i srednja poduzeća
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NN	Narodne novine
OCD	Organizacije civilnog društva
OPKK	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.
OPULJP	Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
PPDS	Područja od posebne državne skrbi
PPUO/G	Prostorni plan uređenja općine/grada
PIP	Partnerstvo za Intervencijski plan
PRR	Program ruralnog razvoja
SC	Specifični cilj

TP	Tehnička pomoć
TZ	Turistička zajednica
UO	Upravni odjel
ŽRS	Županijska razvojna strategija
VSŽ	Vukovarsko-srijemska županija

0. UVOD

0.1 SVRHA I PREDMET DOKUMENTA

0.1.1 Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program prvenstveno obuhvaća integriranu urbanu regeneraciju 5 pilot područja malih gradova provedbenom intervencijskih planova (IP-ova) za svaki od gradova, koji će zatim poslužiti kao temelj za provedbu pojedinačnih projekata koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima utvrđenima u intervencijskim planovima. Osim samih intervencijskih planova, program obuhvaća i razvoj institucionalnog kapaciteta ključnih dionika za provedbu integriranih intervencija te komplementarne aktivnosti na središnjoj razini: unaprijeđenu statistiku siromaštva na lokalnoj i područnoj (regionalna) razini te odgovarajuće mapiranje siromaštva.

Vukovar, Beli Manastir, Petrinja, Benkovac i Knin MRRFEU je odabralo Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 18. veljače 2015. na temelju sljedećih kriterija: veličina grada iskazana brojem stanovnika (od 10.000 do 35.000 stanovnika) te stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tom je poštivana i obveza da jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnika romske manjine i stoga je pilot područje grada Belog Manastira prošireno na općinu Darda zbog značajnog udjela romskog stanovništva. Kako je moguće da pilot područja obuhvate susjedne jedinice lokalne samouprave sa sličnim potrebama i poteškoćama u zajedničke projekte, a nastojeći u skladu s opisom prioriteta u ključnim operativnim programskim dokumentima za ESI fondove dati prednost područjima s visokom zastupljenošću romske manjine, područje Belog Manastira prošireno je na općinu Darda.

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima financira se iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa koji određuju strateške i operativne modalitete njihovog korištenja: Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. (OPKK), specifičnog cilja 9b1 - *Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva* i komplementarnih aktivnosti specifičnog cilja 9.i.2 - *Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja* Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP). Ukupna alokacija iz dvaju operativnih programa za razdoblje od 2014.-2020. je 120 mil. EUR, pri čemu je 100 mil. iz EFRR-a i 20 mil. iz ESF-a, uz 15% nacionalnog sufinanciranja.

U skladu s OPKK-om, dva su glavna očekivana rezultata korištenja EFRR-a i komplementarnog korištenja ESF-a unutar ovog programa:

- Pобољшanje socioekonomskih i životnih uvjeta u najmanje pet malih gradova pilota s 10 000 do 35 000 stanovnika što će smanjiti daljnji gubitak stanovništva. Paketi intervencija rezultirat će regeneracijom degradiranih područja i doprinijeti smanjenju nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva, i
- Projektiranje i ispitivanje novog modela pristupa regeneraciji depriviranih područja temeljenog na području kroz adresiranje problema socioekonomske deprivacije koncentrirane na nekom geografskom području.

Programi su koncipirani kao integrirana teritorijalna ulaganja po uzoru na model integriranih teritorijalnih ulaganja razvijen za veće urbane aglomeracije u regulatornom okviru za ESI fondove. Taj je model na adekvatan način prilagođen potrebama i institucionalnim kapacitetima malih i višestruko depriviranih gradova.

Proces pripreme Programa, uključujući mapiranje siromaštva s ciljem identifikacije 5 pilot područja, pripremu analitičke i metodološke podloge za izradu intervencijskih planova, oblikovanje relevantnih tijela na lokalnoj razini, provedbu analiza potreba i identifikaciju ciljeva, kao i konačno samu izradu IP-ova, započeo je 2015.

MRFEU koordinira pripremu i provedbu Programa uz podršku tri vanjska tima tehničke pomoći.

1. Projekt „Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br. 06-C_UK-0259/15-90), koji provode stručnjaci iz WYG savjetovanja, prvi je započeo s radom u prosincu 2015. godine.

Projekt je pripremio analitičku i metodološku podlogu za pripremu intervencijskih planova (Metodologiju izrade analize područja i intervencijskog plana, analize područja za svih 5 područja, te Intervencijski plan za Grad Knin koji je poslužio kao pilot za razvoj ostalih IP-ova).

2. Projekt „Tehnička pomoći za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br.: 06-C-UK-0313/16-90) – ovaj projekt provode stručnjaci tvrtke Razbor d.o.o, koji su započeli s radom u kolovozu 2016. godine.

Projekt nastavlja na i djelomično teče paralelno s prethodnim. Zadaća je stručnjaka pod ovim projektom temeljem izrađene analitičke i metodološke osnove proizišle iz prethodnog, te na osnovu pilot modela Intervencijskog plana za Grad Knin, pripremiti intervencijske planove za preostala 4 područja. Osim toga, projekt ima zadatak pripremiti pozive na dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-ova te pomoći izgradnju kapaciteta jedinica za IP i partnerstava za IP u obuhvaćenim područjima.

3. Projekt „Ex-ante evaluacija intervencijskih planova za gradove Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar: projekt tehničke pomoći za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br: 06-C-U-009/16-90) koji teče paralelno s dvama prethodnim ugovorima, a provodi ga zajednica ponuditelja Urbanex d.o.o. i Equinox consulting.

MRRFEU i MRMS, u suradnji sa stručnjacima iz projekata tehničke pomoći te s jedinicama za IP u odabranim područjima (JIP-ovi) i širim partnerstvima za IP (PIP-ovima) u razdoblju od prosinca 2015. naovamo pripremili su analitički i metodološki okvir te intervencijske planove za svih 5 uključenih područja.

Za potrebe izrade intervencijskoga plana, a u skladu s Metodologijom izrade Analize područja i Intervencijskoga plana osnovana su radna i savjetodavna tijela: odlukom o imenovanju članova Jedinice za izradu intervencijskog plana Grada Vukovara od 18.02.2016., te odlukom o imenovanju članova Partnerstva za intervencijski plan Grada Vukovara od 01.03.2016. U periodu od 24. veljače do 10. srpnja 2016. godine, uz pomoć tehničke pomoći „Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“, izrađena je analiza područja s teritorijalnim atlasom za Grad Vukovar. Tijekom procesa, održane su 3 radionice s dionicima (Partnerstvo za Intervencijski plan). Dokument analize područja usvojen je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU 10. srpnja 2016. godine.

Na temelju ovih intervencijskih planova, MRRFEU će, i dalje uz podršku timova tehničke pomoći i adekvatno uključivanje JIP-ova i PIP-ova, pripremiti i provesti relevantne pozive na dostavu projektnih prijedloga te poduprijeti provedbu na adekvatan način ocijenjenih i odobrenih projekata.

Intervencijski plan zamišljen je kao integriran (međusektorski), teritorijalni i participativni dokument čiji je cilj identificirati razvojne potrebe i definirati ciljeve i razvojne prioritete te akcijski plan za provedbu intervencija fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Osnovni elementi koje ovaj dokument sadrži jesu:

- Analitički dio: Ishodišne analitičke pretpostavke, tj. identificirane ključne potrebe područja u odnosu na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju (temeljene na prethodno izrađenim dokumentima Analize područja)
- Strateški dio: Opis razvojne strategije, uključujući:
 - razvojnu viziju
 - razvojne ciljeve i prioritete
 - modalitete prioritizacije projekata
- Operativno/provedbeni dio:
 - Akcijski plan, uključujući projektni portfelj i vremenski plan provedbe
 - popis upravljačkih mehanizama

Intervencijski plan korespondira sa i nadopunjuje postojeće strategije regionalnog i lokalnog razvoja te nacionalne sektorske strategije relevantne za razvoj područja grada Vukovara. Ovdje izdvajamo najvažnije.

Strategija obnove i razvoja grada Vukovara 2016. – 2020. definira razvojne ciljeve koji se u velikoj mjeri poklapaju s razvojnim ciljevima IP-a (razvoj poduzetništva, unaprjeđenje kvalitete života, revitalizacija društvene infrastrukture), stoga je pri identifikaciji intervencija unutar IP-a dana posebna pozornost komplementarnosti provedbe dvaju dokumenta (Strategija VU 2016 – 2020 i IP) kako bi se postigle potrebne sinergije i izbjegla dupliciranja u financiranju razvojnih projekata.

Isto tako, intervencijski je plan usklađen sa Županijskom razvojnom strategijom 2007. – 2013., te su razvojni ciljevi i prioriteti kompatibilni sa županijskim strateškim okvirom: 1.2 Jačanje poduzetništva i privlačenje ulaganja. 2.1 Razvoj sustava obrazovanja i njegova prilagodba potrebama razvoja, te 4.4 Unapređenje sportske infrastrukture i razvoj sportskih programa.

Intervencijski plan definiran je također u sukladnosti s programskim dokumentima na nacionalnoj razini, prvenstveno *OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.*, *OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.* i *Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.* Budući da je IP direktno hijerarhijski ugrađen u ta dva OP-a, on je ujedno i indirektno sastavni dio provedbe europskog strateškog dokumenta *Europa 2020*, koji postavlja okvir za čitavu kohezijsku politiku EU i sve njezine instrumente. Sam Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima u skladu je s ciljem artikuliranim u strategiji Europe 2020 kao „**Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti**“. Strateško usmjerenje ka provedbu ciljeva Europe 2020 očituje se i u strukturi intervencija u IP-u koje su oblikovane prema trima oblicima regeneracije: društvenoj, gospodarskoj i fizičkoj, pri čemu je društvena regeneracija vođena ciljem uključivog rasta, gospodarska ciljem pametnog rasta, a svi oblici fizičke regeneracije (predviđena ulaganja u fizičku infrastrukturu i prostorni razvoj općenito) artikulirani su imajući u vidu snažan naglasak na aspektima održivosti, osobito u smislu promocije korištenja obnovljivih izvora energije i visoke energetske učinkovitosti. IP je dakle jedan od važnih instrumenata koji ciljevima **uključivog, pametnog i održivog rasta** doprinosi na lokalnom nivou rizicima siromaštva i socijalne isključenosti posebno izloženih područja.

U obzir su prilikom izrade Intervencijskog plana uzimane i za planske domene najrelevantnije nacionalne sektorske strategije, kao što su razvojna usmjerenja iz *Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.*, *Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.* te *Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020.* Osobito je za Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima značajna *Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.)*, koja uključuje tri okvirna cilja: *osiguravanje uvjeta za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; osiguravanje uvjeta za sprečavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba te uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.* Za ostvarenje navedena tri prioriteta i pripadajuće glavne ciljeve predviđene su aktivnosti u okviru osam strateških područja: obrazovanje i cjeloživotno učenje; zapošljavanje i pristup zapošljavanju; stanovanje i dostupnost energije; pristup socijalnim naknadama i uslugama; pristup zdravstvenom sustavu; skrb o starijim osobama; borba protiv zaduženosti i financijska neovisnost; uravnoteženi regionalni razvoj. Ovaj dokument usmjeren je na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti kroz intervencije u infrastrukturu potrebnu za obrazovanje te cjeloživotno učenje, na razvoj usluga s ciljem većeg samozapošljavanja, otvaranja većeg broja radnih mjesta i podizanja konkurentnosti postojećih gospodarskih subjekata.

Intervencijski plan definira, na temelju i povrh ovih strateških dokumenata, ciljane teritorijalna ulaganja usmjerena na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju specifičnih područja. Time on donekle ublažava i dokida slabosti općih strategija razvoja kao što su nedostatak financijskih sredstava za provedbu, nedostatak prioritizacije i sektorska fragmentiranost, i na taj način on efektivno postaje glavni instrument upravljanja razvojem u pet pilot područja. Upravo stoga on funkcionira i kao strateški, ali i kao vrlo operativan dokument kojim će se intervencije usmjeriti na rješavanje najrelevantnijih potreba i iznalaženje najučinkovitijih rješenja za područje grada Vukovara.

0.1.2 Metodologija izrade dokumenta


Metodologija izrade ovog dokumenta utemeljena je na dokumentu pripremljenom u MRRFEU, uz podršku projekta tehničke pomoći: „Metodologija izrade analize područja i intervensijskog plana“ (kolovoz, 2016.).

Metodologija izrade podrazumijeva sljedeće korake u pripremi dokumenta:

- 1) **Uspostava lokalnog partnerstva i relevantnih kapaciteta na lokalnoj razini** koji omogućuju participativni pristup izradi analize područja i strateškom planiranju.

Formalizacija partnerskog pristupa postignuta je oblikovanjem:

- Jedinice za IP-e (JIP), zadužene za vođenje planskog procesa i izradu kvalitetnog plana (multidisciplinarni tim službenika Grada te po potrebi ostalih javnih tijela).
- Partnerstva za IP (PIP); koji osigurava adekvatnu uključenost svih relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji mogu aktivno pridonijeti procesu



2) Izrada Analize područja

Analiza područja je zasebni dokument kojim su identificirane teritorijalne potrebe, područja i domene intervencije i prezentirane u obliku tematskih i/ili prostornih razvojnih opcija koje predstavljaju podlogu za daljnje planiranje, tj. izradu intervensijskog plana.

Proces analize obuhvaćao je:

- Identifikaciju i analizu mreže **dionika** (pred-korak, koji je omogućio oblikovanje JIP-a i PIP-a)
- **Analizu pisanih izvora** (prostorno-planskih i strateških dokumenata te dokumentacije o postojećim programima i projektima i baza podataka)
- **Operativnu analizu**, uključujući:

- o identifikaciju **planskih domena**

Planske domene su razvojni koncepti koji omogućuju preliminarno grupiranje tema i nalaza analize: za potrebe izrade svih IP-ova, definirane su sljedeće planske domene: „Okoliš, krajolik i priroda“, „Mobilnost, pristupačnost i stanovanje“; „Poljoprivreda i ruralni razvoj“, „Industrija i poduzetničko okruženje“; „Društvene djelatnosti“ i „Kultura i turizam“, koje su se u radu prilagođavale specifičnim okolnostima, nalazima i potrebama pojedinih gradova.

- o dijalog s lokalnim partnerstvom na temu razvojnih hipoteza iz analize pisanih izvora
- o preliminarno prikupljanje projektnih ideja i izradu baze projektnih ideja (u svrhu razvoja dijaloga s partnerstvom i bolje identifikacije potreba i mogućnosti)
- o izradu **SWOT analize** prema planskim domenama
- o na temelju izrađenog SWOT-a i analize stanja: identifikaciju **razvojnih tema**

Razvojne teme određene su prostorom i sadržajnim fokusom/temom. Pri prostornom definiranju tema razmatrana je koncentracija razvojnih potreba u određenom području grada te interakcija između različitih projektnih ideja, dok su teme određene sadržajem predloženih intervencija odnosno utvrđenih potreba. U gradu Vukovaru prostorno gledajući, ističu se dvije teme: Borovo naselje i šire središte grada uključujući i obale Vuke i Dunava.

Svaka razvojna tema razmatrana je kroz relevantnost odnosno probleme i potrebe, opis teme, predložene intervencije, indikativnu vrijednost i zrelost. Na kraju svake teme dan je prikaz najvažnijih prednosti i nedostataka svake od tema.

- o prezentaciju razvojnih pitanja i dijalog o opcijama s lokalnim partnerstvom
- o finalizaciju dokumenta na temelju povratnih informacija dobivenih od dionika

3) Izrada Intervencijskog plana, na temelju nalaza Analize područja:

Izrada IP-a prema Metodologiji obuhvaćala je sljedećih nekoliko koraka:


A) Strateško planiranje

- planiranje **razvojnih scenarija**, na temelju identificiranih razvojnih problema i rješenja prepoznatih u analizi područja.

Metodologija izrade analize područja i intervencijskoga plana predviđa razradu razvojnih scenarija kao prvog koraka u izradi IP-a, a na temelju identificiranih razvojnih problema i rješenja prepoznatih u analizi područja.

Tehnika scenarija (planiranje scenarija, izrada planskih scenarija) podrazumijeva konstruiranje mogućih razvojnih budućnosti lokalne zajednice (alternativnih setova razvojnih ciljeva). Svrha upotrebe ove tehnike je omogućiti lokalnom partnerstvu da stvori jasne i postojane poveznice

između percipiranih problema i željenih (i/ili favoriziranih) intervencija u nesigurnom okruženju, odnosno, da osigura konzistentnost planskog procesa i njegovih rezultata. Na ovaj način razvojne teme utvrđene kroz analizu područja se razmatraju kao rješenja teritorijalnih problema i razrađuju u smislu definiranja alternativne vizije, ciljeva i prioriteta intervensijskog plana. Scenariji razvoja trebaju dati odgovor na pitanje koja je željena budućnost, koje su alternative na raspolaganju i koje su njihove posljedice.

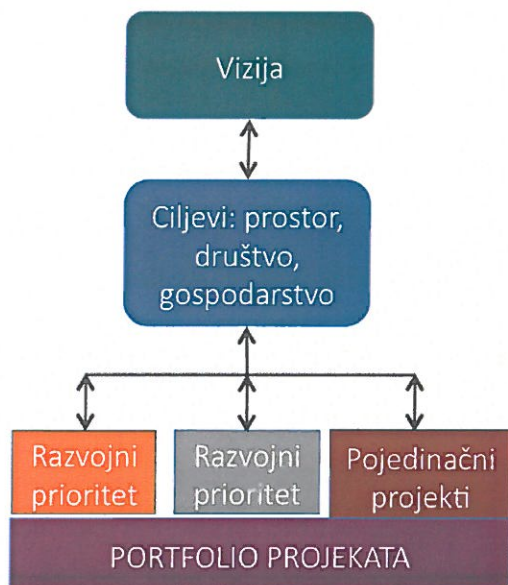

- odabir optimalnog scenarija – definicija vizije, ciljeva i razvojnih prioriteta IP-a

Ovom koraku je u praksi prethodila provjera koherentnosti intervensijske logike s nalazima analize, učinjena na način da se izradila **matrica intervensijske logike**. Međukorak je, između ostaloga, učinjen kako bi se osigurao kontinuitet između rada dvaju stručnih timova, onog koji je pripremao Analizu područja i onog koji je radio na samom IP-u.

B) Operativno planiranje

Izrada **Akcijskog plana**, što uključuje:

- **detaljnu identifikaciju** projekata prethodno prepoznatih u bazi (vidi fazu analize) i izradu detaljnih projektnih obrazaca
- **prioritizaciju i selekciju** projekata na temelju kriterija ocjene utvrđenih zadanom metodologijom a dodatno razrađenih u suradnji s JIP-om.

Projekti su kategorizirani prema njihovom doprinosu razvojnim ciljevima i prioritetima. Osim toga, razvrstani su u sljedeće kategorije:

- *Glavni, ključni* projekti su oni oko kojih postoji snažan konsenzus i obvezanost dionika na njegovu provedbu;
- *Komplementarni* projekti su bitni za ostvarenje ciljeva IP i logiku intervencije svakog prioriteta teritorijalnog razvoja, ali zbog svoje vrijednosti, širine i/ili jačine utjecaja, nisu od presudne važnosti;

- *Horizontalni* projekti su nematerijalne aktivnosti (npr. obrazovanje, pružanje usluga, unaprjeđenje učinkovitosti uprave) koje su usmjerene na ljudske resurse i institucionalno jačanje. Horizontalni projekti dio su razvojnih projekata IP-a ili su pojedinačni.


Prioritizacija projekata izvršena je ocjenjivanjem svakog od projekata prema definiranim kriterijima, od kojih svaki ima različitu težinu (doprinos ciljevima Programa, integriranost projekta, izvori financiranja, doprinos zapošljavanju i poticanje lokalnog gospodarstva, normativna zrelost, logika intervencije i metodologija provedbe projekta).

- Izrada projektnog portfelja

Izrada konačne baze projekata, s naznakama o modalitetima njihove provedbe:

- kao individualnih projekata, koji mogu, ali ne moraju biti vezani za specifični razvojni prioritet i koje priprema jedan prijavitelj
- grupe projekata koja se odnosi na jedan razvojni prioritet, tj. tematski su ili prostorno koncentrirani
- otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji podrazumijevaju prethodno identificirane teme i vrste operacija u okviru razvojnih prioriteta, no ne obuhvaćaju unaprijed definirane projekte ili pojedinačne korisnike/prijavitelje

Grafička shema u nastavku prikazuje planski proces od rezultata analize područja do izrade intervjenskog plana.

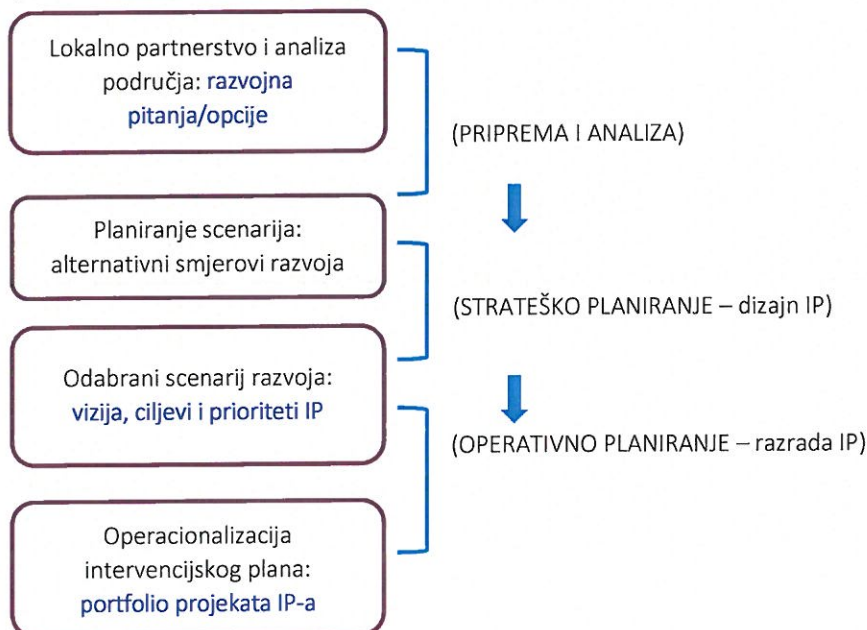

0.2 SUKLADNOST S NALAZIMA ANALIZE PODRUČJA I OPIS PROCESA STRATEŠKOG PLANIRANJA

0.2.1 Nalazi Analize područja općenito

Izrada analize područja bila je prvi korak u procesu izrade Intervencijskoga plana grada Vukovara. Jedinica za Intervencijski plan Grada Vukovara i Partnerstvo za Intervencijski plan Grada Vukovara uz stručnu podršku tehničke pomoći analitički su obradili postojeće stanje sukladno uputama Metodologije za izradu analize područja, te nalaze analize saželi u sektorskim i objedinjenoj SWOT analizi. Ovaj se proces odvijao u periodu od veljače do srpnja 2016., a završio je odabirom planskih domena odnosno razvojnih tema koje su poslužile kao podloga za provjeru intervencijske logike i strateškoga planiranja koje je uslijedilo.

Grad Vukovar se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji (VSŽ). Smjestio se na ušću rijeke Vuke u Dunav na prirodnoj granici istočne Slavonije i zapadnog Srijema te najvećim dijelom zauzima prostor na desnoj obali Dunava. Vukovar je drugi po veličini Grad u Županiji i upravno sjedište Vukovarsko-srijemske županije. Površinom obuhvaća prostor od 100,03 km² (4,4 % površine VSŽ), a prema posljednjem popisu stanovništva (2011.) Vukovar broji sveukupno 27.683 stanovnika.

Vukovarsko područje doživjelo je izrazito visok stupanj razaranja tijekom Domovinskog rata, što je ostavilo izravne posljedice na cjelokupni graditeljski fond Grada. To je rezultiralo devastacijom javnih površina i zgrada, te stambenoga fonda. Isto tako, razaranja su dovela do fizičkog i gospodarskog propadanja industrije što je za dugotrajnu posljedicu imalo povećanje broja nezaposlenih osoba u Vukovaru.

Ovi ključni problemi prepoznati u analizi područja glavni su uzrok niskog stupnja razvijenosti Grada Vukovara te nepovoljnog indeksa vitalnosti.

Nakon Domovinskog rata, Vukovar je izgubio 32,2% populacije u odnosu na prijeratno razdoblje, te je u 2001. godini u njemu živjelo 31.670 stanovnika. Demografske slika se nije popravila niti u 2011. godini kada se broj stanovnika smanjio za dodatnih 12,6% što ukazuje na negativna demografska kretanja te izostanak značajnijeg povratka izbjeglog i prognanog stanovništva. Dobna struktura stanovništva prati opća negativna kretanja na vukovarskom području o čemu svjedoči i pad mlađe populacije, odnosno porast kod starijeg dijela populacije u posljednja dva popisna razdoblja (2001./2011.). Uz nepovoljnu demografsku sliku, problem za tržište rada predstavlja i neusklađenost ponude i potražnje, odnosno nedovoljno kvalificirane radne snage za postojeće poslove.

Nalazi SWOT analize kao priliku prepoznaju ulaganje u obrazovanje odraslih, prekvalifikacije, nove programe obrazovanja za mlade, neformalno učenje o samozapošljavanju i socijalnom poduzetništvu i ulaganje u poduzetničke vještine. Mjere predložene Intervencijskim planom usklađene s tim uočenim potrebama i prilikama u području obrazovanja i tržišta rada.

Gospodarstvo na području Vukovara gotovo je u potpunosti bilo uništeno uslijed ratnih razaranja, a gospodarske su štete iznosile 4,6 mlrd. kn. Najviše su bila pogođena velika vukovarska poduzeća koja su bila nositelji gospodarskog razvoja: Borovo d.d. (1,9 mlrd. kn), Vupik d.d. (1,3 mlrd. kn) i Vuteks d.d. (0,9 mlrd. kn). Većina drugih poduzeća završila je u stečajnom postupku odnosno u procesu privatizacije. Ne mogavši pratiti suvremene razvojne trendove pojavili su se i problemi zastarjelosti opreme te nedostatak

educiranih stručnjaka. S obzirom da je u ranijem razdoblju Vukovarsko područje tradicionalno bilo orijentirano na razvoj velikih proizvodnih pogona, postupno se zanemarivao razvoj malog poduzetništva. Zbog promjene zakonske regulative postupno je unaprijeđena poduzetnička klima, a poduzetništvo je dodatno ojačano uvođenjem poticaja i olakšica.

U području jačanja gospodarstva, SWOT analiza je nastavno identificirala potrebe za daljnjim ulaganjem u razvoj poduzetničkih vještina, potporama za male i srednje poduzetnike, stvaranjem povoljnog investicijskog okruženja i poduzetničkom potpornom infrastrukturom i uslugama.

Društvene djelatnosti imaju važnu ulogu za život stanovnika i u velikoj mjeri mogu utjecati na smanjenje depopulacije. U Gradu Vukovaru postoje dobro razvijene temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje, veliki broj aktivnih organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana. Ipak, uočavaju se slabosti određenih segmenata društvene infrastrukture. Uočava se nedostatak razvijenih sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih. Potrebno je poboljšati opremljenost predškolskih i školskih objekata u skladu sa suvremenim standardima. Nedovoljan je broj i neadekvatni su sportski objekti koji nisu energetski učinkoviti te predstavljaju veliki financijski teret za proračun Grada. Na području Grada Vukovara registrirane su 342 aktivne udruge što sveukupno čini 17,9% udruga na području Vukovarsko-srijemske županije. S obzirom na broj stanovnika, zastupljenost udruga iznosi 1,21 na 100 stanovnika, što je više od županijskog prosjeka (na 100 stanovnika 1,04 udruga) te ukazuje na veću angažiranost građana u civilnom sektoru. Ipak, gospodarska kriza i nizak životni standard nepovoljno utječu na razvoj usluga u zajednici pa se predlaže korištenje dostupnih bespovratnih sredstava za poboljšanje tog segmenta.

Nalazi SWOT analize prepoznaju važnost kvalitetne društvene infrastrukture (posebice obrazovne i sportske) te programa i usluga koje je potrebno razviti i provoditi. Dobro kapacitirane ustanove i udruge koje u Vukovaru postoje i djeluju, temelj su provedbe uspješnih programa i projekata u području obrazovnih, rekreacijskih, kulturnih, turističkih i socijalnih programa i usluga za građane.

Grad Vukovar raspolaže brojnim i raznolikim kulturnim, povijesnim i prirodnim resursima koji se turistički valoriziraju, ali još uvijek ima prostora za daljnji razvoj turizma. Iako je Vukovar jedna od važnijih turističkih destinacija istočne Hrvatske, u gradu nema dovoljno turističkih sadržaja za pojedine skupine turista koje već posjećuju gradsko područje ili su potencijalno za njega zainteresirane, osobito za turiste s kruzera te cikloturiste. Razvoj novih sadržaja te intenzivna promocija doveli bi do dužeg boravka turista te povećanja prihoda od turizma. Prilikom planiranja razvoja turizma potrebno je analizirati i pratiti globalne turističke trendove, ali i ponudu konkurentskih turističkih destinacija u okruženju.

U području razvoja turizma, SWOT analiza prepoznaje veliki broj turističkih atrakcija koje je potrebno uvezati u zajedničku ponudu destinacije, te povezati s lokalnom ugostiteljskom, kulturnom i rekreativnom ponudom za posjetitelje.

0.2.2 Planske domene

Kao alat u izradi Analize područja, te kasnije intervensijskog plana, korištene su sljedeće planske domene:

Planske domene

OKOLIŠ, KRAJOLIK I PRIRODA
Vode, vodoopskrba i kanalizacija, gospodarenje otpadom, buka, tlo, zrak, prirodni resursi, bioraznolikost, krajolik, urbane/ruralne zelene mreže, namjena površina, energetika, klimatske promjene i sl.
MOBILNOST, PRISTUPAČNOST I
Upravljanje cestama i drugim prometnim putevima (željeznica, vodeni i zračni promet), intermodalni prijevoz, parkirališta i javne površine, javne zgrade i imovina, socijalno stanovanje i sl.
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Poljoprivredni proizvodi i njihovo tržište, ekološka poljoprivreda, korištenje tla, navodnjavanje, ruralni krajolik i sl.
INDUSTRIJA I PODUZETNIČKO OKRUŽENJE
Inovativnost, gospodarstvo temeljeno na znanju, javno-privatna partnerstva, valorizacija lokalnih resursa i identiteta, lanci vrijednosti, tržište rada, poduzetnička infrastruktura i sl.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Uloga i korištenje javnih prostora i usluga (škole i vrtići, kina, kazališta, slobodno vrijeme i rekreacija), socijalno uključivanje, zdravstvena i socijalna skrb, ljudska prava i građanske slobode i sl.
KULTURA I TURIZAM
Razvoj i modernizacija javne turističke infrastrukture, kulturnog nasljeđa, valorizacija povijesnih i arheoloških lokaliteta, elementi lokalnog identiteta i sl.

0.2.3 Razvojne teme

Najvažnije razvojne teme nastale na temelju detaljne analize stanja, usklađivanja sa SWOT analizom prema planskim domenama i prikupljenih projektnih ideja lokalnih dionika.

Razvojne teme određene su prostorom i temom. Pri prostornom definiranju tema razmatrana je koncentracija razvojnih potreba u određenom području grada te interakcija između različitih projektnih ideja, dok su teme određene sadržajem predloženih intervencija odnosno utvrđenih potreba. U gradu Vukovaru prostorno gledajući, ističu se dvije teme: Borovo naselje i šire središte grada uključujući i obale Vuke i Dunava.

Svaka razvojna tema razmatrana je kroz relevantnost odnosno probleme i potrebe, opis teme, predložene intervencije, indikativnu vrijednost i zrelost. Na kraju svake teme dan je prikaz najvažnijih prednosti i nedostataka svake od tema.

Opći cilj svih razvojnih tema je doprinijeti smanjenju depopulacije i siromaštva, povećanjem kvalitete života stanovnika.

Prioritetne razvojne teme Vukovara su:

1. **POBOLJŠANJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA U SVRHU POVEĆANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA,**
2. **POTPORA RAZVOJU GOSPODARSTVA KROZ KONCEPT PAMETNOG GRADA,**
3. **OBOGAĆIVANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA i**
4. **POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA**

Prve dvije razvojne teme vežu se prvenstveno uz prostor Borova naselja, a treća razvojna tema veže se za područje uz rijeke, odnosno šireg centra grada. Četvrta tema obuhvaća i Centar grada i Borovo Naselje. Kao što je već naglašeno, prioritetne teme su odabrane na temelju njihovog potencijala za generiranje zapošljavanja, novih radnih mjesta te povećanje kvalitete života stanovništva grada.

U daljnjem procesu planiranja, odlučeno je da se razvojna tema 4. **Povećanje energetske učinkovitosti grada integrira u razvojne teme 1. Poboljšanje društvene infrastrukture grada Vukovara u svrhu povećanja kvalitete života stanovnika i 2. Potpora razvoju gospodarstva kroz koncept pametnog grada** iz razloga što energetska učinkovitost nije svrha sama sebi nego doprinosi smanjenju troškova života, poboljšanju infrastrukture i kvaliteti života građana i poslovanja poduzetnika.

0.2.4 Matrica intervencijske logike

Vježba izrade matrice intervencijske logike poslužila je kao provjera usklađenosti nalaza analize područja, zaključaka SWOT analize i odabira planskih domena/razvojnih tema i pripadajućih projekata. Radionica Jedinice za Intervencijski plan i tehničke pomoći rezultirala je lekcijama za daljnji rad na intervencijskom planu na način da ukloni moguće neusklađenosti i jasnije napravi poveznicu u intervencijskoj logici. To je uključivalo:

- 1) potrebu za većim brojem projekata u području jačanja poduzetništva, te poticanje zapošljavanja;
- 2) bolju povezanost planiranih investicija u društvenu infrastrukturu s planiranjem programskoga dijela korištenja te infrastrukture posebice u području obrazovanja i zapošljavanja; te
- 3) nastavno na 2) – kreiranje otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za ustanove i udruge;
- 4) uvezivanje manjih, geografski fokusiranih turističkih projekata u zajednički strateški projekt Adica;

Zaključci radionice provjere intervencijske logike bili su podloga za promišljanje i razradu razvojnih scenarija grada Vukovara.

0.2.5 Razvojni scenariji

Razrada scenarija u okviru izrade intervencijskih planova

Tijekom izrade analize područja, JIP i PIP su kroz radionice od unaprijed ponuđenih 6 planskih domena identificirali 3 koje su relevantne za rješavanje glavnih razvojnih problema grada Vukovara. To su **1) Industrija, poduzetništvo i poduzetnička infrastruktura, 2) Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje, 3) Kulturno nasljeđe i turizam**. Te su planske domene daljnjom razradom uobličene u razvojne teme grada Vukovara:

1. **Poboljšanje društvene infrastrukture grada Vukovara u svrhu povećanja kvalitete života stanovnika;**
2. **Potporna razvoju poduzetništva;**
3. **Obogaćivanje turističke ponude grada.**

Odabrane razvojne teme činile su temelj za razradu planskih razvojnih scenarija u smislu definiranja **alternativne vizije, ciljeva i prioriteta intervensijskog plana**. Predloženi scenariji razvoja dali su različite opcije razvoja grada Vukovara uzimajući u obzir financijska i vremenska ograničenja mogućih intervencija.

S obzirom da su JIP i PIP već u ranoj fazi planiranja identificirali relativno uzak broj razvojnih tema (tri), razrada scenarija za grad Vukovar rezultirala je **dvama scenarijima**

SCENARIJ 1. Vukovar – centar društvenog života s izvrsnošću u sportu, rekreaciji i obrazovanju

RT 1 i 3

Ovaj scenarij koncentrirano rješava probleme u području društvene infrastrukture i društvenih sadržaja za građane. Naglasak je na infrastrukturi koja će osigurati kvalitetnije programe za djecu i mlade, unaprijediti prostor za sport i rekreaciju, te povećati atraktivnost javnih prostora za posjetitelje. Ovaj scenarij temelji se na izuzetno velikom interesu za financiranje društvene infrastrukture koji je vidljiv kroz više od 90 predloženih projekata u projektnoj bazi.

Tijekom promišljanja ovog scenarija, JIP i tehnička pomoć identificirali su sljedeće prednosti i nedostatke ovakve opcije razvoja grada Vukovara:

PREDNOSTI	NEDOSTACI
➤ Podizanje kvalitete života i zadovoljstva stanovništva	➤ Pojedini projekti su u inicijalnoj fazi razvoja
➤ Povećanje broja usluga koje se pružaju lokalnom stanovništvu i posjetiteljima	➤ Nedostaju CBA analize koje bi dale pravu sliku troškova i koristi predloženih rješenja
➤ Velika zainteresiranost dionika za projekte u sferi društvene infrastrukture	➤ Nedovoljna povezanost s gospodarstvom i orijentiranost samo na društvenu sferu razvoja
➤ Iskustvo u provedbi sličnih projekata i dostatni kapaciteti gradske uprave	➤ Povećano ulaganje u društvenu (sportsku) infrastrukturu povećava troškove održavanja/proračuna grada
➤ Dostatni kapaciteti udruga, sportskih klubova i škola za provedbu projekata	➤ Upitno ispunjenje pokazatelja IP i Programa regeneracije

RT 1, 2 i 3

Ovaj scenarij kombinira sve tri razvojne teme u integrirani plan ulaganja u društvenu, poduzetničku i turističku infrastrukturu. Provedbom ovakvog Intervencijskog plana postići će se sinergije u području zapošljavanja, kvalitete života i oživljavanja poduzetništva u gradu. Ovaj scenarij temelji se na ukupnom razvoju i ravnomjernom ulaganju u sve sfere i sektore prepoznate analizom područja.

Tijekom promišljanja ovog scenarija, JIP i tehnička pomoć identificirali su sljedeće prednosti i nedostatke ovakve opcije razvoja grada Vukovara:

ZA	PROTIV
➤ Podizanje kvalitete života i zadovoljstva stanovništva	➤ Pojedini projekti su u inicijalnoj fazi razvoja
➤ Potpore postojećim i novim poduzetnicima	➤ Nedostaju CBA analize koje bi dale pravu sliku troškova i koristi predloženih rješenja
➤ Integrirani pristup uređenju infrastrukture istovremeno doprinosi razvoju poduzetništva, turističke ponude i društvenog života	➤ Upitni kapaciteti poduzetnika za prijavu na natječaj za dodjelu potpora
➤ Povećanje broja usluga koje se pružaju lokalnom stanovništvu i posjetiteljima	
➤ Podignuta atraktivnost javnih prostora za lokalno stanovništvo i posjetitelje	
➤ U funkciju stavljena obnovljena infrastruktura s manjim troškovima održavanja	
➤ Iskustvo u provedbi sličnih projekata i dostatni kapaciteti gradske uprave	
➤ Dobri kapaciteti udruga, sportskih klubova i škola za provedbu projekata	

Odabir razvojnog scenarija

Na temelju rasprave članova Partnerstva i Jedinice za Intervencijski plan, odabran je scenarij 2. Dionici su prepoznali važnost sinergija koje proizlaze iz integriranog ulaganja u razvoj poduzetništva, društvenu infrastrukturu i sadržaje, te turizam. Očekivanja od takvih ulaganja su da poboljšaju poduzetničku strukturu u Vukovaru, povećaju broj radnih mjesta, osiguraju kvalitetniju javnu infrastrukturu i podignu kvalitetu života građana.

0.3 INFORMIRANJE I JAVNE KONZULTACIJE U PROCESU RAZVOJA INTERVENCIJSKOG PLANA

15. rujna 2016. održan je **sastanak Jedinice za Intervencijski plan s predstavnicima** tehničke pomoći Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, te tehničke pomoći za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar koja je nastavno za Vukovar izradila sam dokument Intervencijskoga plana te predstavnicima MRRFEU. Sastanak je bio svojevrsna „primopredaja“ dužnosti i procesa za izradu Intervencijskoga plana između dvije tehničke pomoći. JIP-u je predstavljena metodologija i hodogram za nastavak procesa planiranja i izradu Intervencijskoga plana te su isplanirani daljnji koraci.

30. rujna održana je **prva radionica** sa Jedinicom za Intervencijski plan na temu provjere intervencijske logike i osvrt na projektnu bazu. JIP-u su predstavljeni nalazi ex-ante evaluacije na ovu fazu planiranja, te nalazi provjere intervencijske logike. Na temelju predstavljanja prihvatljivih aktivnosti unutar IP-ova sukladno Metodologiji izrade IP-a, napravljen osvrt na projekte iz baze sukladno tome. Zaključeno je da je potrebno u bazi ojačati projekte u području poduzetništva i projekte u području ESF-a (zapošljavanje i obrazovanje), te su iz baze isključeni neki projekti čija je prihvatljivost bila upitna.

Nakon radionice grad je Vukovar revidirao inicijalnu bazu projekata, te je na tu temu održan sastanak s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i tehničke pomoći. Zaključeno je da projekte u riziku prihvatljivosti grad Vukovar neće uključiti u konačnu bazu projekata, te je ista revidirana i dostavljena TP 7. studenog 2016.

11. studenog održana je **druga radionica** s Jedinicom za Intervencijski plan i Partnerstvom za Intervencijski plan na temu predstavljanja i odabira razvojnih scenarija te definiranja strateškog okvira Intervencijskoga plana. Sudionici radionice aktivno su sudjelovali u radu, te je odabran drugi predloženi scenarij i razrađen strateški okvir (vizija, ciljevi, prioriteti) koji su okosnica ovog Intervencijskoga plana.

7. prosinca održana je **treća radionica** s Jedinicom za Intervencijski plan i Partnerstvom za Intervencijski plan. Na temelju ranije pripremljenih detaljnih projektnih obrazaca, te prijedloga prioritizacije projekata koji pripremila Jedinica za Intervencijski plan uz pomoć tehničke pomoći, članovi Partnerstva dali su svoj osvrt na pojedine projekte i predloženu prioritizaciju.

I. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA

I.1 RAZVOJNA VIZIJA GRADA

Razvojna vizija

Vizija grada Vukovara usmjerena je na ispunjenje preduvjeta za miran, prosperitetan i ugodan život svih njegovih građana. Takav koncept razvoja podrazumijeva integrirani pristup ulaganjima u fizičku infrastrukturu, posvećenost zaštiti prirodnih i kulturnih dobara, jačanje društvenih i socijalnih usluga za građane, te rast ulaganja u gospodarstvo i nova radna mjesta.

„Vukovar – Grad u kojem sve generacije rado i dobro žive“

Za ostvarenje vizije potrebno je planirati i provoditi integrirane razvojne mjere i projekte koji će doprinijeti ispunjenju razvojnih ciljeva u trima stupovima održivog razvoja: prostora, društva i gospodarstva. Razvojni ciljevi Intervencijskoga plana grada Vukovara su sljedeći:

I.2 RAZVOJNI CILJEVI

1. Prostor:

Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.

2. Društvo:

Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru.

3. Gospodarstvo:

Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara.



Razvojni cilj: Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.	
Relevantnost u odnosu na ključne probleme	Devastacija javnih prostora, stambenoga fonda i gospodarske infrastrukture ključni su problem razvoja gospodarstva, društva i atraktivnosti za život grada Vukovara. Regeneracija infrastrukture preduvjet je za daljnja ulaganja u oporavak i razvoj grada. Iako su u zadnjih 18 godina uložena značajna sredstva u obnovu grada, postoje specifične potrebe za daljnjim integriranim ulaganjima koja bi doprinijela atraktivnosti i povezanosti gradskih naselja. Urbanu regeneraciju grada Vukovara ostvarit ćemo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Integriranim ulaganjem u projekte u najužem centru grada; ➤ Ulaganjem u obrazovne i rekreacijske projekte za učenike, studente i mlade u Borovu Naselju; ➤ Kreiranjem turističkog prostora uz rijeke (Dunav, Vuka)
Način postizanja cilja	Vrsta ulaganja koja će doprinijeti atraktivnosti i povezanosti gradskih naselja i prema razvojnim prioritetima: 1RP: Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje: ulaganje u infrastrukturu strukovnog i visokog obrazovanja kao preduvjet za jačanje kapaciteta lokalnog tržišta rada, razvoj i

	<p>provedba programa cjeloživotnog učenja, kreiranje novih kurikuluma, razvoj kompetencija za socijalno poduzetništvo, razvoj kompetencija za samozapošljavanje.</p> <p>2RP: Izgradnja, uređenje i revitalizacija površina javne namjene, uključujući sportsku infrastrukturu: ulaganje u sportsku i rekreativnu infrastrukturu, osiguravanje dostupnog, kvalitetnog i sigurnog prostora za rad sportskih udruga, rekreaciju djece, mladih sportaša i rekreativaca, udruga invalida i branitelja; prilagodba infrastrukture za lakši pristup OSI, razvoj novih sportskih, rekreativnih i rehabilitacijskih sadržaja za različite skupine uključujući i marginalizirane skupine, razvoj rada udruga. Revitalizacija i uređenje javnih površina u gradu – ulaganje u gradske trgove prostorno povezane s revitalizacijom ostalih javnih prostora (tržnica, sportske dvorane, škole), uređenje i izgradnja javnih parkinga prostorno povezanih s važnim i atraktivnim prostorima u gradu (najuži centar grada, tržnica, sportski sadržaji i škole).</p> <p>4RP: Razvoj turizma temeljenog na valorizaciji prostora dviju rijeka u gradu Vukovaru: ulaganje u strateški projekt - šumu Adica na rijeci Vuki - koji sadrži rekreativne, edukativne, prirodne i ugostiteljske sadržaje, uređenje edukativno-zabavnog parka znanosti uz Dunav, prilagodba infrastrukture za lakši pristup OSI, razvoj ostalih turističkih sadržaja kroz otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za udruge i ustanove, te otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za male poduzetnike.</p>		
Strateška usklađenost	Razina	Strateški dokument	Ciljevi/mjere/prioriteti
	Lokalna	Strategija Vukovar 2020	1. Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara 2. Izgrađenom društvenom infrastruktururom ojačan društveni kapital grada Vukovara Uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara
	Regionalna	ŽRS VSŽ 2007 - 2013	1. Kvalitetno prostorno planiranje, moderna infrastruktura i očuvani okoliš
	Nacionalna	Strategija borbe protiv siromaštva i	Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne

		socijalne isključenosti u RH	isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba
		OPKK 2014 – 2020	9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva i
		OPULJP 2014 – 2020	9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja

Razvojni cilj: Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru.

Relevantnost u odnosu na ključne probleme

U gradu Vukovaru postoje dobro razvijene temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje, veliki broj aktivnih organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana.

Međutim, analiza područja je pokazala ozbiljne nedostatke vezane uz tržište rada i zapošljivost radno sposobnih stanovnika Vukovara (posebice malih), nepostojanje kvalitetnih i dostatnih programa cjeloživotnog učenja i novih kurikuluma uključujući kompetencije za poduzetništvo i samozapošljavanje. Uz to, značajan je nedostatak

	<p>društvenih, obrazovnih i rekreativnih sadržaja za djecu, mlade i ostale skupine građana kojima bi se podigla kvaliteta života.</p> <p>Ovi će se ključni problemi rješavati provedbom strateških projekata obnove i izgradnje infrastrukture s posebnom pažnjom za pristupačnost za osobe s invaliditetom pa će prostori biti dostupni svim skupinama građana uključujući i marginalizirane skupine.</p> <p>Razvoj kvalitetnih, dostupnih i modernih sadržaja u području obrazovanja, cjeloživotnog učenja stvorit će preduvjete za povećane kompetencija relevantnih za tržište rada, bolju zapošljivost i pokretanje vlastitog posla.</p> <p>Rekreacijski, sportski i drugi sadržaji za slobodno vrijeme koji će biti razvijeni i dostupni građanima povećat će kvalitetu života svim skupinama s posebnom brigom o sadržajima za djecu, mlade, invalide i ostale ranjive skupine.</p>		
Način postizanja	<p>Vrsta ulaganja koja će doprinijeti razvoju društvenih sadržaja i kvaliteti života prema razvojnim prioritetima:</p> <p>1RP: Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje: ulaganje u infrastrukturu strukovnog i visokog obrazovanja kao preduvjet za jačanje kapaciteta lokalnog tržišta rada, razvoj i provedba programa cjeloživotnog učenja, kreiranje novih kurikuluma, razvoj kompetencija za socijalno poduzetništvo, razvoj kompetencija za samozapošljavanje.</p> <p>2RP: Izgradnja, uređenje i revitalizacija površina javne namjene, uključujući sportsku: ulaganje u sportsku i rekreativnu infrastrukturu, osiguravanje dostupnog, kvalitetnog i sigurnog prostora za rad sportskih udruga, rekreaciju djece, mladih sportaša i rekreativaca, udruga invalida i branitelja, prilagodba infrastrukture za lakši pristup osoba s invaliditetom, razvoj novih sportskih, rekreativnih i rehabilitacijskih sadržaja za različite skupine uključujući i marginalizirane skupine, razvoj rada udruga.</p>		
Strateška usklađenost	Razina	Strateški dokument	Ciljevi/mjere/prioriteti
	Lokalna	Strategija Vukovar 2020	2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara
	Regionalna	ŽRS VSŽ 2007 - 2013	2. Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta za upravljanje razvojem
	Nacionalna	Strategija borbe protiv siromaštva i	Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv

		socijalne isključenosti u RH	siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba
		OPKK 2014 – 2020	9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
		OPULJP 2014 – 2020	9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja

Razvojni cilj: Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara.	
Relevantnost u odnosu na ključne probleme	<p>Gospodarstvo grada Vukovara devastirano je prvo razaranjima tijekom Domovinskog rata, a poslije dugogodišnjim propadanjem postojećih velikih gospodarskih subjekata na tome području.</p> <p>Malo i srednje poduzetništvo postoji, ali nije dovoljno razvijeno da bi bilo generator lokalnog razvoja. Stoga je potrebno ojačati postojeće poduzetnike kroz osiguravanje adekvatne poduzetničke infrastrukture i usluga, sufinanciranje planiranih investicija MSP-a i jačanje njihovih kompetencija. Isto tako, potrebno je, posebice među mladima, razvijati inicijativu za poduzetništvo te sufinancirati novoosnovana poduzeća.</p>

	<p>Sva planirana ulaganja usklađena su s postojećim ili novim projektima u području razvoja gospodarstva i poduzetništva koje grad Vukovar sustavno provodi.</p> <p>U gradu Vukovaru postoji turistički potencijal koji se do sada temeljio uglavnom na javnim ulaganjima (muzeji, šetnice, Adica) bez kvalitetnog popratnog privatnog sadržaja. Sufinanciranjem poduzetničkih projekata u turizmu, ojačat će se privatna inicijativa u obogaćivanju turističke ponude. Uz to, izradit će se strategija brendiranja destinacije Vukovar koja će dati strateške smjernice za daljnji razvoj Vukovara kao brenda.</p>		
Način postizanja	<p>Vrsta ulaganja koja će doprinijeti jačanju poduzetništva i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća prema razvojnim prioritetima:</p> <p>3RP: Osnažiti postojeće i potaknuti razvoj novih MSP-a: ulaganje u izgradnju nove tržnice kao centralnog mjesta trženja lokalnih proizvoda i dostupnosti kvalitetne ponude građanima, ulaganje u strateške dokumente za razvoj gospodarstva, , novi proizvodni kapaciteti, razvoj poduzetništva i nova zapošljavanja putem otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga na male i srednje poduzetnike, aktivne mjere zapošljavanja.</p> <p>4RP: Razvoj turizma temeljenog na valorizaciji prostora dviju rijeka u gradu Vukovaru: ulaganje u strateški projekt - park šumu Adica na rijeci Vuki - koji sadrži rekreativne, edukativne, prirodne i ugostiteljske sadržaje, razvoj konkurentnih turističkih sadržaja kroz otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za udruge i ustanove, te otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za male poduzetnike. Izrada strategije brendiranja grada doprinijet će uvezivanju postojeće i razvoju nove turističke ponude.</p>		
Strateška usklađenost	Razina	Strateški dokument	Ciljevi/mjere/prioriteti
	Lokalna	Strategija Vukovar 2020	1. Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara
		Strateške smjernice razvoja turizma 2016 – 2020 grada Vukovara	1. Uređenje desne obale Dunava na cijelom potezu od Borova Naselja do Vučedola
	Regionalna	ŽRS VSŽ 2007 - 2013	1. Konkurentno gospodarstvo
	Nacionalna	Strategija borbe protiv siromaštva i	Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne

		socijalne isključenosti u RH	isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba
		OPKK 2014 – 2020	Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost 9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
		OPULIP 2014 – 2020	9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja

I.3 ZAJEDNIČKI POKAZATELJI

Oznaka	Pokazatelji rezultata	Fond	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Početna godina	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2023.)
9b11 / SR202	Smanjenje gubitka stanovništva	EFRR i ESF	Vitalni indeks stanovništva	48	2015	60	70
CR04	Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja	ESF	broj	0	2016	50	120
SR201	Broj nezaposlenih sudionika koji su završili program osposobljavanja	ESF	broj	0	2016	20	50
						Ciljana vrijednost ukupno	
Oznaka	Pokazatelji neposrednih rezultata/ostvarenja	Fond	Mjerna jedinica	muškarci	žene	2019	2023
CQ01	Proizvodno ulaganje: broj poduzeća koja primaju potporu	EFRR	Poduzeća			20	40
9b11	Broj pripremljenih i provedenih intervjuskih planova	EFRR	Broj			1	1
9b12	Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice	EFRR	m2 / broj jedinica			0	0
9b13	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	EFRR	Broj jedinica			3	10
CO01	Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene	ESF	Broj			40	70
CO06	Mlađi od 25 godina	ESF	Broj			45	90
CO07	stariji od 54 godine	ESF	Broj			20	45
CO16	Sudionici s invaliditetom	ESF	Broj			15	35
SO201	Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje	ESF	Broj			0	5
SO202	Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja	ESF	Broj			20	50
SO203	Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju	ESF	Broj			5	20

SO207	Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina	ESF	Broj			35	70
	Ostali pokazatelji neposrednih rezultata						
	Broj izrađenih strateških dokumenata	EFRR	Broj			2	2
	Broj izgrađenih/obnovljenih obrazovnih objekata u kojima se provode obrazovni programi	EFRR	Broj			0	3
	Broj novih turističkih sadržaja u gradu Vukovaru (u sklopu projekta Adica)	EFRR	Broj			0	4
	Broj projekata spremnih za provedbu	EFRR	Broj			6	6
	Broj članova JIP-a osposobljeno za provedbu projekata	EFRR	broj			10	10
	Broj razvijenih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga	ESF	Broj			2	4
	Broj organizacija civilnog društva uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva	ESF	Broj			10	20
	Broj volontera uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva	ESF	Broj			20	40

I.4 HORIZONTALNE TEME

Cjelokupni dizajn i provedba IP-a vode računa o horizontalnim temama kao što su jednake mogućnosti, održivi razvoj i zaštita okoliša. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a, od ciljeva do aktivnosti unutar projekata.

Jednake mogućnosti

Ova tema odnosi se na omogućavanje jednakog pristupa svim vrijednostima, aktivnostima, rezultatima i pozitivnom utjecaju IP-a za sve društvene skupine, vodeći posebno računa o marginaliziranim skupinama te jednakim mogućnostima za žene i muškarce. Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt promiče jednake mogućnosti za marginalizirane skupine (npr. gdje god je to moguće uklonit će se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost) i/ili uzima u obzir rodno specifične potrebe (npr. kroz uključivanje rodnih informacija na lokalnom tržištu rada, kao i nastojanja projekta da se prevladaju prepreke jednakosti).

Održivi razvoj i zaštita okoliša


Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Ti će se podaci uzeti u obzir u postupku ocjene projekta i kroz kriterije za odabir. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o okolišu, što uključuje zakonsku regulativu i podzakonske akte o procjeni utjecaja na okoliš.

Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini vodi računa o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja. Cijela provedba IP-a počiva na participativnom pristupu rješavanja problema u lokalnoj zajednici. Potencijalni prijavitelji projekata bit će konzultirani tijekom pripreme natječajne dokumentacije kako bi se osigurala bolja prilagođenost lokalnim prilikama i kapacitetima dionika. Participativni pristup u provedbi IP-a podrazumijeva sudjelovanje dionika iz svih triju sektora u donošenju odluka i kontinuirano konzultiranje javnosti tijekom provedbe ključnih projekata, a kako bi se osigurala povratna informacija o stanju provedbe, potencijalnim rizicima i mogućim korektivnim akcijama za poboljšanje provedbe programa regeneracije.

II. RAZVOJNI PRIORITETI

Razvojni prioriteti opisuju metodu ostvarivanja razvojnih ciljeva intervencije. Mogu se svrstati u razvojne prioritete koji imaju uporište u prostornoj intervenciji ili drugi koji imaju uporište u tematskoj intervenciji tako ih dijelimo na *područje intervencije* ili *os razvoja*. Razvojni prioriteti stoga posjeduju prostornu i/ili stratešku dimenziju te skup konkretnih projekata koji vode prema ostvarenju ciljeva regeneracije.

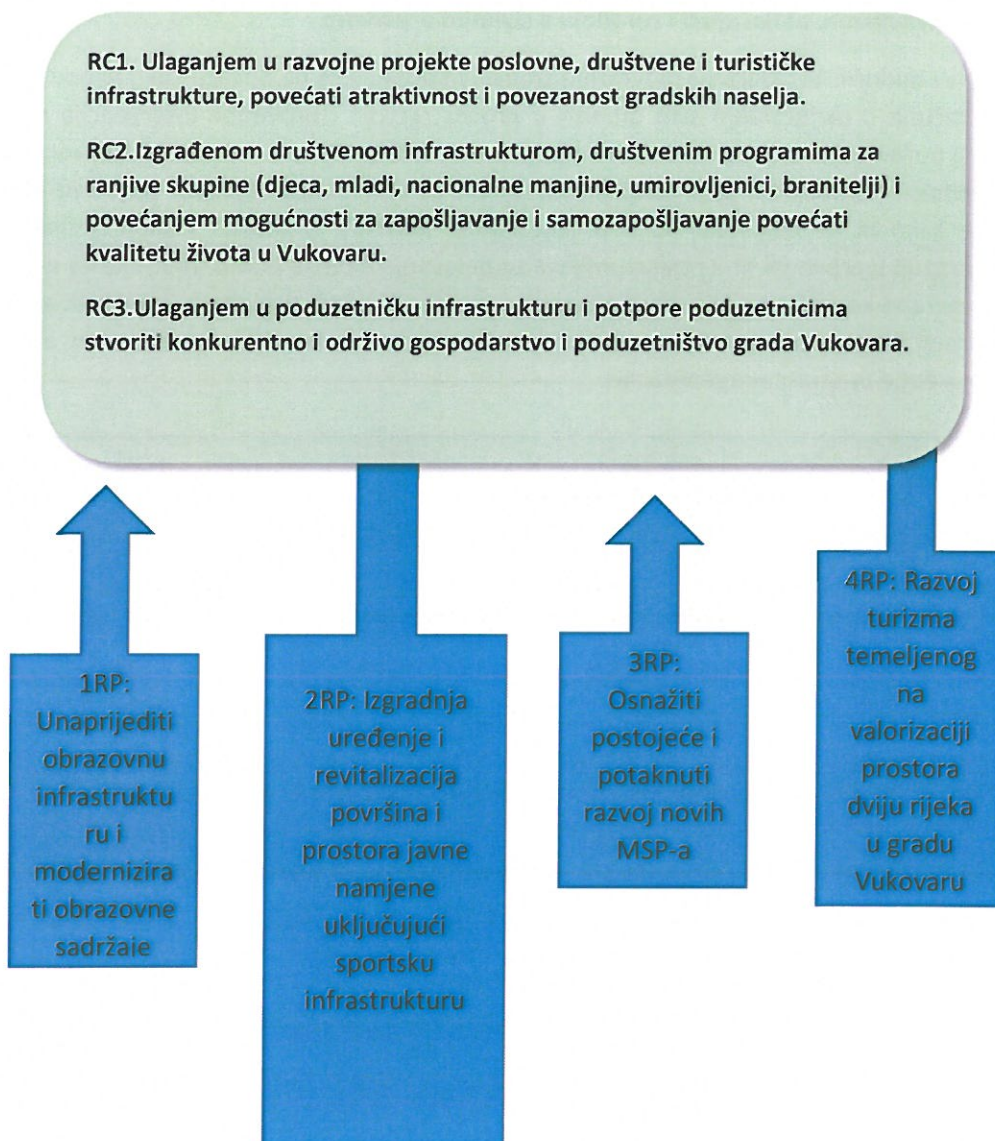

Os razvoja: Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje

Logička podloga	<p>Razvijena adekvatna obrazovna infrastruktura preduvjet je za razvoj modernih obrazovnih programa, novih kurikuluma strukovnog i visokog obrazovanja te programa cjeloživotnog učenja.</p> <p>Postojeći fond obrazovne infrastrukture u gradu Vukovaru je solidan, osim neadekvatnih prostora Srednje ekonomske škole koja ne raspolaže sigurnim i adekvatnim prostorom za nastavu i izvannastavne aktivnosti učenika. Veleučilište Lavoslav Ružička nije smješteno u vlastitom prostoru te ga je potrebno osigurati kako bi se osigurao kontinuitet i kako bi se nesmetano mogli razvijati novi sadržaji.</p> <p>Ulaganjem u izgradnju, odnosno obnovu prostora tih dviju institucija osigurat će se siguran i moderan prostor za provođenje postojećih, ali i razvoj i provedbu novih programa koji će omogućiti učenicima i studentima da steknu znanja i kompetencije potrebne za tržište rada.</p> <p>Jedan od razvojnih ciljeva RH je društvo znanja, a njega je moguće graditi samo ulaganjem u sve vrste učenja i obrazovanja uključujući cjeloživotno učenje i neformalno obrazovanje. Uređenjem i stavljanjem u funkciju Društveno-obrazovnog centra Dunav omogućit će se razvoj i provedba raznih programa osposobljavanja pojedinaca i grupa za rad, različite socijalne aktivnosti i osobni razvoj. Unapređenjem znanja, vještina i kompetencija različite će skupine građana biti konkurentnije za tržište rada, ali i steći vještine za samozapošljavanje.</p>
Glavni projekti	<p>1RP1: Društveno-obrazovni centar „Dunav“ 1RP2: Izgradnja Ekonomske škole Vukovar 1RP3: Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar</p>
Komplementarni projekti	<p>1RP4: Poziv za dostavu projektnih prijedloga za udruge i ustanove 1RP5: Parking Dunav 1 i Dunav 2 – projekt je na rezervnoj listi</p>
Nositelj (glavnih projekata)	Grad Vukovar
Komplementarnost i sinergije	<p>Sinergije s drugim razvojnim prioritetima:</p> <p>2RP – Oba prioriteta doprinose revitalizaciji i uređenju javnih prostora društvene namjene koje će omogućiti razne sadržaje za građane, udruge, ranjive skupine u gradu Vukovaru i povećati kvalitetu života.</p> <p>3RP – Modernizacija obrazovnih sadržaja predviđena ovim prioritetom, djelovat će u sinergiji s ulaganjima RP3 u razvoj poduzetništva, podizanje kvalifikacija određenih skupina građana za samozapošljavanje i pokretanje vlastitog posla. RP3 predviđa bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća.</p>

Doprinos horizontalnim temama

4RP – Obrazovni programi razvijeni pod RP1 dijelom će biti usmjereni na turističku djelatnost (turistički vodiči, management u turizmu itd).

Sinergije s drugim ulaganjima grada Vukovara u području društvene infrastrukture koji će doprinijeti ostvarenju ovog razvojnog prioriteta:

- Obnova zgrade osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru
- Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1 – područni objekt Mitnica u Vukovaru
- Izgradnja studentskog doma u Vukovaru
- Stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja i studenata grada Vukovara
- Stipendiranje postdiplomskih studija osoba s područja grada Vukovara
- Energetska obnova osnovnih škola i vrtića

Pri definiranju strateškoga okvira, a posebice provedbenog plana (uključujući i razinu pojedinačnih projekata) posebna se pozornost posvetila horizontalnim temama: **promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrani diskriminacije, pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivom razvoju**. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a.

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Pri provedbi projekata pod ovim razvojnim prioritetom, nositelji projekata vodit će računa o jednakim prilikama za žene i muškarce, posebice u planiranju i provedbi obrazovnih i socijalnih programa, te aktivnosti vezanih uz promicanje zapošljavanja i socijalnog poduzetništva.

Uz to, posebna pažnja biti će posvećena uključenju marginaliziranih skupina kao što su invalidi, nacionalne manjine, dugotrajno nezaposleni, itd. Neki od budućih programa biti će usmjereni upravo na te ranjive skupine kao krajnje korisnike projekata.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pri projektiranju, izgradnji i uređenju svih objekata i površina planiranih unutar ovog razvojnog prioriteta, uzet će se u obzir potrebe i ograničena mobilnost osoba s invaliditetom. Gdje god je to moguće uklonit će se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost kao što su osobe s invaliditetom i starije osobe.

Održiv razvoj i zaštita okoliša

Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o

<i>Doprinos postizanju razvojnih ciljeva</i>	okolišu, što uključujući zakonska rješenja i podzakonske akte koji se odnose na procjenu utjecaja na okoliš.
	<p>Provedba ovog RP doprinijet će dvama razvojnim ciljevima:</p> <p>RC1. Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja – izgradnjom i revitalizacijom gradskih prostora: Ekonomska škola, Veleučilište, Obrazovno-društveni centar Dunav - unaprijedit će se atraktivnost i sigurnost prostora.</p> <p>RC2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru – ulaganje u glavne projekte ovog RP izravno doprinosi unapređenju društvene infrastrukture i društvenoga tkiva grada Vukovara.</p>



Os razvoja: Izgradnja uređenje i revitalizacija površina i prostora javne namjene uključujući sportsku infrastrukturu

Logička podloga	<p>Uređenje gradskih površina i javnih prostora dio su obnove i revitalizacije grada Vukovara. Analiza područja je detektirala potrebe za obnovom područja javne infrastrukture, posebice sportske infrastrukture koja je trenutno zapuštena i skupa za održavanje (primarno troškovi grijanja). Ulaganjima u javne površine i sportske objekte doprinosi se povećanju rekreativnih sadržaja za sve građane s naglaskom na djecu, mlade i branitelje okupljene oko amaterskih sportskih klubova i udruga. Uz to, osigurala bi se sigurnost korisnika tih objekata koji trenutno nisu u adekvatnom stanju. Javne površine potrebno je urediti kako bi se osigurala pristupačnost javnim prostorima: npr. uređenjem Trga Dražena Petrovića uredit će se pristup sportskim dvoranama, bazenu i teniskim terenima.</p> <p>Ulaganja planirana u okviru ovog razvojnog prioriteta usmjerena su na prostore i površine u samom centru grada te na području Borova Naselja.</p>
<i>Glavni projekti</i>	<p>2RP1: Obnova nogometnog stadiona u Vukovaru 2RP4: Trg Dražena Petrovića - projekt je na rezervnoj listi</p>
<i>Komplementarni projekti</i>	<p>2RP3: Izgradnja zatvorenih teniskih terena u Borovu Naselju – projekt je na rezervnoj listi</p> <p>2RP2: Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima 2RP5: Trg na prostoru bivše tržnice – projekt je na rezervnoj listi</p>

<p>Nositelj (glavnih projekata) Komplementarnost i sinergije</p>	<p>2RP6: Trg Trpinjska cesta – projekt je na rezervnoj listi 2RP7: Boćarski dom – projekt je na rezervnoj listi</p> <p>Grad Vukovar</p> <p>Sinergije s drugim razvojnim prioritetima: 1RP – Oba prioriteta doprinose revitalizaciji i uređenju javnih prostora društvene namjene koje će omogućiti razne sadržaje za građane, udruge, ranjive skupine u gradu Vukovaru i povećati kvalitetu života.</p> <p>Sinergije s drugim ulaganjima grada Vukovara u području javne i sportske infrastrukture koji će doprinijeti ostvarenju ovog razvojnog prioriteta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Izgradnja trga oko starog vodotornja u centru grada ➤ Izgradnja bazena u Borovu naselju ➤ Uređenje šetnice uz Dunav (od luke Vukovar do Dunavske ulice) faza 1 ➤ Uređenje šetnice uz Dunav (od Dunavske ulice do ušća rijeke Vuke u Dunav) ➤ Uređenje otoka športova ➤ Uređenje korita rijeke Vuke (1. i 2. dio) ➤ Izgradnja komunalnog pristaništa marina u Vukovaru ➤ Izgradnja biciklističke staze uz cestu Priljevo ➤ Izgradnja turističko-tematske šetnice od ribarske ulice do crkve Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru ➤ Izgradnja šetnice uz Dunav od ušća rijeke Vuke u Dunav do Vučedola
<p>Doprinos horizontalnim temama</p>	<p>Pri definiranju strateškoga okvira, a posebice provedbenog plana (uključujući i razinu pojedinačnih projekata) posebna se pozornost posvetila horizontalnim temama: promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrani diskriminacije, pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivom razvoju. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a.</p> <p>Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije Pri provedbi projekata pod ovim razvojnim prioritetom, nositelji projekata vodit će računa o jednakim prilikama za žene i muškarce, posebice u planiranju i provedbi sportskih i rekreativnih sadržaja. Uz to, posebna pažnja biti će posvećena uključenju marginaliziranih skupina kao što su invalidi, djeca, mladi, branitelji itd. Neki od sportskih sadržaja biti će usmjereni upravo na te ranjive skupine kao krajnje korisnike projekata.</p> <p>Pristupačnost za osobe s invaliditetom Pri projektiranju, izgradnji i uređenju svih objekata i površina planiranih unutar ovog razvojnog prioriteta, uzet će se u obzir potrebe i ograničena</p>

<p><i>Doprinos postizanju razvojnih ciljeva</i></p>	<p>mobilitet osoba s invaliditetom. Gdje god je to moguće uklonit će se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost kao što su osobe s invaliditetom i starije osobe. Uz to, gdje bude moguće, oprema i rekviziti za rekreaciju bit će posebno prilagođeni osobama s posebnim potrebama.</p> <p>Održiv razvoj i zaštita okoliša Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o okolišu, uključujući zakonska rješenja i podzakonske akte koji se odnose na procjenu utjecaja na okoliš.</p>
	<p>Provedba ovog RP doprinijet će razvojnom cilju: RC1. Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja – izgradnjom i revitalizacijom sportskih prostora i javnih površina unaprijedit će se atraktivnost i sigurnost prostora.</p>



Os razvoja : Osnažiti postojeće i potaknuti razvoj novih MSP-a

<p>Područje intervencije <i>Logička podloga</i></p>	<p>Gospodarstvo grada Vukovara devastirano je prvo razaranjima tijekom Domovinskog rata, a poslije dugogodišnjim propadanjem postojećih velikih gospodarskih subjekata na tome području. Malo i srednje poduzetništvo postoji, ali nije dovoljno razvijeno da bi bilo generatorom lokalnog razvoja. Stoga je potrebno ojačati postojeće poduzetnike kroz osiguravanje adekvatne poduzetničke infrastrukture i usluga, sufinanciranje planiranih investicija MSP-a i jačanje njihovih kompetencija. Isto tako, potrebno je, posebice među mladima, razvijati inicijativu za poduzetništvo te sufinancirati novoosnovana poduzeća. Izgradnjom nove tržnice stvorit će se prostor za izlaganje i trženje lokalnih proizvoda obrtnika i poljoprivrednih proizvođača. Osim toga, ulaganje u gradsku tržnicu investicija je od višestrukog značaja za razvoj</p>
---	---

	<p>grada - izgradnjom tržnice regenerira se prostor grada, tržnica je mjesto okupljanja i razmjene na kojima se urbano društveno tkivo prožima, ali i povezuje sa svojim ruralnim okruženjem.</p> <p>Nadalje, izradom strategije razvoja gospodarstva, izradom baze nekretnina, te izradom modela potpore inovacijama stvorit će se novi modeli razvoja poduzetništva i gospodarstva koji mogu biti zamašnjak razvoja lokalnog gospodarstva koje stagnira. Dodatno, potporama postojećim i novoosnovanim poduzećima omogućit će se nova ulaganja i rast MSP-a.</p> <p>Ulaganjem u aktivne mjere zapošljavanja, nastavit će se naponi koje grad Vukovar poduzima kako bi ojačao tržište rada i pomogao poslodavcima da otvore nova i zadrže postojeća radna mjesta.</p>
<p><i>Glavni projekti</i></p>	<p>3RP1: Izgradnja Gradske tržnice u naselju Olajnica</p>
<p><i>Komplementarni projekti</i></p>	<p>Strategija razvoja gospodarstva</p> <p>3RP6: Izgradnja sunčanih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Vukovara – projekt je na rezervnoj listi</p> <p>3RP5: Izgradnja parkinga na Olajnici – projekt je na rezervnoj listi</p> <p>3RP3: Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima</p>
<p><i>Horizontalni projekt</i></p>	<p>3RP4: Izrada baze nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara uz izradu poslovnog portala i baze informacija – projekt je na rezervnoj listi</p> <p>3RP2: Izravna dodjela potpore zapošljavanju</p> <p>3RP7: Izrada modela potpore inovacijama – projekt je na rezervnoj listi</p>
<p><i>Nositelj (glavnih projekata)</i></p>	<p>Grad Vukovar</p>
<p><i>Komplementarnost i sinergije</i></p>	<p>Sinergije s drugim razvojnim prioritetima:</p> <p>1RP – Modernizacija obrazovnih sadržaja predviđena razvojnim prioritetom 1 djelovat će u sinergiji s ulaganjima ovog prioriteta u razvoj poduzetništva, podizanje kvalifikacija određenih skupina građana za samozapošljavanje i pokretanje vlastitog posla. RP3 predviđa bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća dok RP1 predviđa bespovratna sredstva za programe cjeloživotnog učenja, prekvalifikacija, podizanja kompetencija itd.</p> <p>4RP – Razvoj turizma gospodarski je prioritet koji komplementarno s ulaganjima putem ovog razvojnog prioriteta doprinosi jačanju poduzetništva i gospodarstva grada Vukovara. Bespovratne potpore putem ovog prioriteta bit će dijelom namijenjene i poduzetnicima koji djeluju u području turizma. Nadalje, buduća strategija brendiranja turističke destinacije koja će se izraditi u sklopu ovog razvojnog prioriteta, svakako će uključiti i razvoj turističkih potencijala.</p> <p>Sinergije s drugim ulaganjima grada Vukovara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara u 2017. godini (potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima s područja Grada Vukovara)- u planu za iduću godinu, a provodi se već prethodne dvije

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Izgradnja Poduzetničkog inkubatora (u sklopu Poslovno inovacijskog centra)-dovršen projekt ➤ Izgradnja Poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar (proizvodni centar, centar inovativnog poduzetništva i edukacijski centar)-dovršen projekt ➤ Tehnološki centar Vukovar – projekt u pripremi za prijavu na natječaj Razvoj poslovne infrastrukture
<p><i>Doprinos horizontalnim temama</i></p>	<p>Pri definiranju strateškoga okvira, a posebice provedbenog plana (uključujući i razinu pojedinačnih projekata) posebna se pozornost posvetila horizontalnim temama: promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrani diskriminacije, pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivom razvoju. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a.</p> <p>Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije Pri provedbi projekata pod ovim razvojnim prioritetom, nositelji projekata vodit će računa o jednakim prilikama za žene i muškarce, posebice pri dodjeli bespovratnih sredstava za žene poduzetnice te u provedbi aktivnosti vezanih uz promicanje zapošljavanja i socijalnog poduzetništva. Pri ocjeni kvalitete poduzetničkih projekata koji će se prijavljivati na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, bolje će biti ocijenjeni projekti koji će posebnu pažnju posvetiti uključenju marginaliziranih skupina kao što su invalidi, nacionalne manjine, dugotrajno nezaposleni, itd.</p> <p>Pristupačnost za osobe s invaliditetom Pri projektiranju, izgradnji i uređenju svih objekata i površina planiranih unutar ovog razvojnog prioriteta, uzet će se u obzir potrebe i ograničena mobilnost osoba s invaliditetom. Gdje god je to moguće uklonit će se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost kao što su osobe s invaliditetom i starije osobe.</p> <p>Održiv razvoj i zaštita okoliša Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o okolišu, uključujući zakonska rješenja i podzakonske akte koji se odnose na procjenu utjecaja na okoliš.</p>
<p><i>Doprinos postizanju razvojnih ciljeva</i></p>	<p>Provedba ovog RP doprinijet će trima razvojnim ciljevima: RC1. Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja:</p>

izgradnja nove tržnice i uređenje okolnih javnih površina izravno doprinosi atraktivnosti prostora naselja Olajnica.

RC2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru: potpore poduzetnicima i aktivne mjere zapošljavanja unutar ovog RP doprinijet će mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja te sinergijski djelovati s obrazovnim programima koji će se provoditi unutar ovog IP-a.

RC3. Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara: provedba ovog RP-a izravno doprinosi razvojnom prioritetu u smislu unapređenja infrastrukture i potpora poduzetnicima u vidu poziva na dostavu projektnih prijedloga i aktivne mjere zapošljavanja.

4RP

Prioritetna prostorna intervencija: Razvoj turizma temeljenog na valorizaciji prostora dviju rijeka u gradu Vukovaru

Logička podloga

Vukovarsko područje posjeduje velike komparativne prednosti u pogledu razvoja resursno-atraktivne osnove koju prvenstveno čine krajobrazne i prirodne vrijednosti, te jedinstvena kulturna baština. Ipak, vukovarski turizam još uvijek ne koristi svoje potencijale u potpunosti. Značajna su ulaganja učinjena u obnovu razrušene kulturne baštine, te izgradnju i/ili obnovu muzeja, no još uvijek ne postoji razvijen brand destinacije grada Vukovara koji bi uveo postojeću i dao smjer u razvoju nove komplementarne turističke ponude. Stoga će se putem ovog razvojnog prioriteta izraditi strategija brendiranja grada Vukovara kao turističke destinacije.

Uz bogatu kulturnu baštinu, Vukovar ima značajnu prirodnu baštinu temeljenu na prostoru dviju rijeka: Dunava i Vuke. Prostor park šume Adica idealan je za razvoj rekreativnog, zabavnog i edukativnog turizma, te će se uz već postojeće sadržaje putem ovog razvojnog prioriteta uložiti u nove sadržaje kroz jedinstveni Projekt Adica.

Osim putem projekata, znatna ulaganja su učinjena od strane nacionalnih razina u obnovu osnove ponude, kulturne baštine. Drugi projekt, slično sadržaja ali manjeg opsega je Park znanosti gdje će se na obavi Dunava urediti rekreacijsko-edukativni sadržaj za vukovarske školarce, ali i posjetitelje grada.

Glavni projekti

4RP1: Projekt Adica

<p><i>Komplementarni projekti</i></p>	<p>Usluge brendiranja grada Vukovara 4RP2: Park znanosti – projekt je na rezervnoj listi 4RP3: Obnova pročelja i krovista objekta Turističke zajednice Vukovar – projekt je na rezervnoj listi</p>
<p><i>Nositelj (glavnih projekata)</i></p>	<p>Grad Vukovar</p>
<p><i>Komplementarnost i sinergije</i></p>	<p>Sinergije s drugim razvojnim prioritetima: 1RP – Obrazovni programi razvijeni pod RP1 dijelom će biti usmjereni na turističku djelatnost (turistički vodiči, management u turizmu itd) i biti komplementarni s ulaganjima ovog razvojnog prioriteta. 3RP – Razvoj turizma gospodarska je grana koja komplementarno s ulaganjima putem RP 3 doprinosi jačanju poduzetništva i gospodarstva grada Vukovara. Bespovratne potpore putem RP 3 biti će dijelom namijenjene i poduzetnicima koji djeluju u području turizma. Nadalje, buduća strategija razvoja gospodarstva koja će se izraditi u sklopu tog razvojnog prioriteta, svakako će uključiti i razvoj turističkih potencijala.</p> <p>Sinergije s drugim ulaganjima grada Vukovara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kroz projekt Vukovar-Vučedol-Ilok uloženo je 30 milijuna eura u obnovu kulturne baštine vukovarskog kraja, između ostalog u obnovu dvoraca Eltz te u izgradnju Muzeja vučedolske kulture. Za razvoj cjelovitog kompleksa arheološkog parka na Vučedolu, kroz OP konkurentnost i kohezija osigurano je 130 milijuna kuna za razvoj kompleksa, a proces programiranja je u tijeku. ➤ 2012. godine završen je projekt Eko etno centar Adica (aktivnosti projekta: izgradnja kanalizacijskog sustava u Adici, spajanje plinskog sustava, izgradnja parkirališta i cesta u Adici i revitalizacija parka Adica) ➤ TZ je uspješno provela projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“(aktivnosti su se tkđ. provodile u Adici) ➤ U suradnji s Razvojnoum agencijom VURA, Grad Vukovar je na prekogranični program sa Srbijom projekt unaprjeđenja biciklizma i cikloturizma Cycle Danube te na prekogranični program s Mađarskom projekt Danube Tourist Activation koji je usmjeren na valorizaciju prostora Vukovarske ade. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi gotovo 900.000,00 eura. ➤ Gradu Vukovaru je u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture Ministarstva turizma, a koji se financira iz Fonda za razvoj turizma odobren projekt Uređenje i opremanje EuroVelo 6 biciklističke rute na potezu od Luke Vukovar do ušća Vuke u iznosu od 263.700,00 kuna. U tijeku je provedba nabave biciklističkih stajališta, spremišta za bicikle te fontane za piće. ➤ Izrađena je druga verzija mobilne aplikacije „Vukovar na dlanu“ s turističkim servisnim informacijama u vrijednosti od 37.500,00 kuna.

	<p>➤ UO za kulturu i turizam kandidirao je na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu projekt „Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala na području grada Vukovara“. Projekt je odobren, provedena je Bagatelna nabava te je sklopljen Ugovor s za nabavku i postavljanje 2 terminala s ukupno 10 bicikala te godinu dana održavanja sustava u vrijednosti od 166.975,00 kuna.</p>
<p><i>Doprinos horizontalnim temama</i></p>	<p>Pri definiranju strateškoga okvira, a posebice provedbenog plana (uključujući i razinu pojedinačnih projekata) posebna se pozornost posvetila horizontalnim temama: promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrani diskriminacije, pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivom razvoju. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a.</p> <p>Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije Pri provedbi projekata pod ovim razvojnim prioritetom, nositelji projekata vodit će računa o jednakim prilikama za žene i muškarce, posebice u planiranju i provedbi turističkih i kulturnih aktivnosti. Uz to, posebna pažnja biti će posvećena uključanju marginaliziranih skupina kao što su invalidi, nacionalne manjine, dugotrajno nezaposleni, itd. Neki od budućih programa biti će usmjereni upravo na te ranjive skupine kao krajnje korisnike projekata.</p> <p>Pristupačnost za osobe s invaliditetom Pri projektiranju, izgradnji i uređenju svih objekata i površina planiranih unutar ovog razvojnog prioriteta, uzet će se u obzir potrebe i ograničena mobilnost osoba s invaliditetom. Gdje god je to moguće uklonit će se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost kao što su osobe s invaliditetom i starije osobe.</p> <p>Održiv razvoj i zaštita okoliša Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o okolišu, što uključuje zakonodavstvo o Procjeni utjecaja na okoliš.</p>
<p><i>Doprinos postizanju razvojnih ciljeva</i></p>	<p>Provedba ovog RP doprinijeti će trima razvojnim ciljevima: RC1. Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja – uređenje turističke infrastrukture na Adici i uz rijeke izravno doprinosi atraktivnosti prostora grada. RC2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici,</p>

branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru – ulaganjem u programe vezane uz turizam, brendiranjem grada kao turističke destinacije povećat će se mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje u turističkoj i srodnim djelatnostima.

RC3.Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara – dio potpora poduzetnicima biti će i u sektoru turizma, te će shodno omogućiti rast i razvoj MSP-a i obrta u tom sektoru.

III. PLAN PROVEDBE

III.1 PRIORITIZACIJA PROJEKATA

Proces definiranja konačne liste projekata koji je započeo tijekom pripreme Analize područja pozivom na dostavu projektnih ideja u gradu Vukovaru, završio je radionicom prioritizacije održanom 7. prosinca 2016. godine. Baza projektnih ideja od 126 projekata smanjena je u prvom koraku identifikacijom i grupiranjem projekata koji će biti dio otvorenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstva za neprofitne organizacije i ustanove (ESF) te male i srednje poduzetnike kroz EFRR. Drugi korak se sastojao od dubinske analize preostalih projekata s obzirom na ograničenja koja postoje unutar provedbe IP-a (vremenska i financijska i s obzirom na moguće elemente državnih potpora) te su svi nerealni projekti za provedbu unutar tih okvira odbačeni. Daljnji proces zahtijevao je bolje definiranje opsega projekata koji su preostali za ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava te kraći period prikupljanja novih projektnih ideja. U koraku nakon strateškog planiranja pristupilo se razradi projektnih obrazaca za postupak prioritizacije tj. bodovanja.

III.1.1 Kriteriji i metodologija prioritizacije

Osnovni kriteriji i maksimalan broj bodova je u nastavku:

Kriterij	Maksimalni broj bodova
K1 Doprinos ciljevima Programa	15
K2 Integriranost projekta (potencijal za aktiviranje sinergija)	15
K3 Izvori financiranja (integracija financijskih izvora)	10
K4 Doprinos zapošljavanju i poticanje lokalnog gospodarstva	15
K5 Normativna zrelost projekta	15
K6 Logika intervencije	15

K7	Metodologija provedbe projekta	15
	UKUPNO	100

III.1.2 Ocjena projekata

Proces prioritizacije sastojao se od ocjene projekata od strane članova JIP-a, koji su zatim zajedno s detaljnim projektnim obrascima dostavljeni članovima PIP-a 5 dana prije radionice na razmatranje. Tijekom radionice, članovima se Partnerstva predstavio svaki pojedinačni projekt i obrazložila ocjena JIP-a. Nakon konstruktivne rasprave, Partnerstvo je usvojilo bodovnu listu koja slijedi:

	NAZIV	Broj bodova
3RP1	Izgradnja Gradske tržnice u naselju Olajnica	92
3RP6	Izgradnja sunčanih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Vukovara	76
	Usluge brendiranja grada Vukovara kao turističke destinacije*	73
2RP4	Trg Dražena Petrovića	70
3RP5	Parking Olajnica	70
4RP1	Projekt Adica	69
1RP1	Društveno-obrazovni centar „Dunav“	69
1RP2	Izgradnja Ekonomske škole Vukovar	67
1RP3	Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar	66
2RP2	Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima	64
	Strategija razvoja gospodarstva**	63
3RP4	Izrada baze nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara uz izradu poslovnog portala i baze informacija	63
2RP1	Obnova nogometnog stadiona u Vukovaru	63
4RP2	Park znanosti	63
2RP3	Izgradnja zatvorenih teniskih terena u Borovu Naselju	63
PP2	Izgradnja dvije stambene zgrade za potrebe stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja	63
2RP6	Trg Trpinjska cesta	61
1RP5	Parking Dunav 1 i Dunav 2	61
2RP5	Trg na prostoru bivše tržnice	60
2RP7	Boćarski dom	57
3RP7	Izrada modela potpore inovacijama	54
4RP3	Obnova pročelja i krovništa objekta Turističke zajednice Vukovar	46

*Zbog uvjeta prihvatljivosti Ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-a, ovaj se projekt ne može samostalno predlagati i financirati, pa je sadržajno i financijski integriran u strateški projekt 4RP1 Adica.

** Zbog uvjeta prihvatljivosti Ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-a, ovaj se projekt ne može samostalno predlagati i financirati, pa je sadržajno i financijski integriran u grupu B aktivnosti projekta Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu Intervencijskoga plana.

Tijekom prioritizacije projekata sukladno Metodologiji za izradu Analize područja i Intervencijskoga plana, 19 projekata u ukupnoj vrijednosti 314,562,500 HRK ocjenjeno je sa više od 60 bodova što ih čini prihvatljivim za financiranje u sklopu provedbe Intervencijskoga plana. Međutim, kako je ukupna alokacija sredstava za provedbu Intervencijskoga plana ograničena na 150 milijuna HRK sufinanciranja sredstava EFRR, dodatan odabir projekata bio je potreban. JIP je u konzultaciji sa svim relevantnim odjelima Grada Vukovara, te uz podršku tehničke pomoći odabrao 9 projekata koji imaju najveći značaj u provedbi Intervencijskoga plana te izravno doprinose fizičkoj, gospodarskoj i društvenoj regeneraciji područja. Istodobno, odabrani projekti doprinose ostvarenju svih razvojnih prioriteta i pripadajućih pokazatelja.

Odabrani projekti su:

	NAZIV	Broj bodova
3RP1	Izgradnja Gradske tržnice u naselju Olajnica	92
	Usluge brendiranja grada Vukovara kao turističke destinacije*	73
4RP1	Projekt Adica	69
1RP1	Društveno-obrazovni centar „Dunav“	69
1RP2	Izgradnja Ekonomske škole Vukovar	67
1RP3	Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar	66
2RP2	Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima	64
	Strategija razvoja gospodarstva**	63
2RP1	Obnova nogometnog stadiona u Vukovaru	63


*Zbog uvjeta prihvatljivosti Ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-a, ovaj se projekt ne može samostalno predlagati i financirati, pa je sadržajno i financijski integriran u strateški projekt 4RP1 Adica.

** Zbog uvjeta prihvatljivosti Ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-a, ovaj se projekt ne može samostalno predlagati i financirati, pa je sadržajno i financijski integriran u grupu B aktivnosti projekta Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu Intervencijskoga plana.

Uz to, sredstvima EFRR financirat će se otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzećima na području grada Vukovara.

III.2 PORTFOLIO PROJEKATA

III.2.1 Projektni obrasci

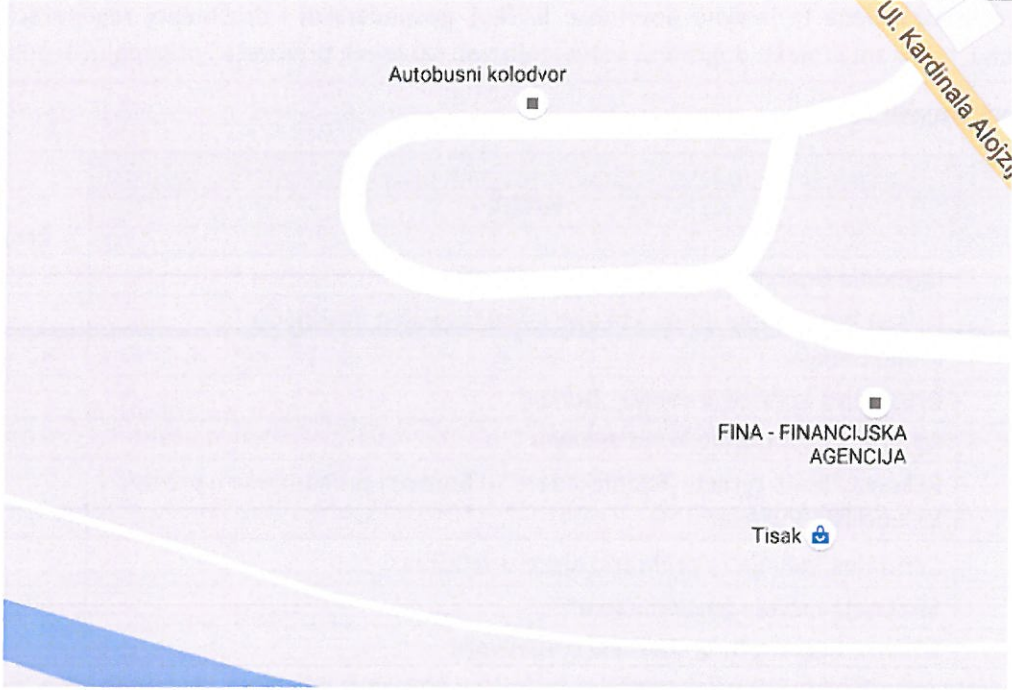NAZIV PROJEKTA	Izgradnja Gradske tržnice u naselju Olajnica
ŠIFRA PROJEKTA	3RP1
Lokacija projekta¹	 <p>Grad Vukovar, naselje Olajnica, na k.č.br. 2601/5 k.o.Vukovar</p>
Vrsta projekta:	Glavni
Razvojni prioritet:	3RP Osnažiti postojeće i potaknuti razvoj novih MSP-a
Opći cilj:	1. Prostorni:

¹ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

	<p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p> <p>2. Društveni:</p> <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p> <p>3. Gospodarski:</p> <p>Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara.</p>
Specifični cilj:	Osigurati prostor za trženje lokalnih proizvoda
Planska domena:	<p>Primarno:</p> <p>Industrija i poduzetničko okruženje</p> <p>Osim toga, projekt doprinosi i sljedećim domenama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poljoprivreda i ruralni razvoj • Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje • Kulturno nasljeđe i turizam
Vrijednost:	Trošak provedbe: 20.000.000,00
Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara) 15%
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Grad Vukovar ima značajnog iskustva u provođenju infrastrukturnih i ostalih projekata:</p> <p>1. Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar u 3 faze</p> <p>- infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara)</p> <p>- EU projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti 909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Drugom fazom je obuhvaćeno kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora.</p> <p>- EU projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“, vrijednost: 21.293.090,71 kn. Ovom fazom obuhvaćeno je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly</p>

	<p>(bruto površine 9700 m²) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar.</p> <p>2. Nearly Zero-Energy Sports Facilities (n0e-sport) – partneri na projektu financiranom putem IEE. Pilot projekt kojim se izrađuje analiza i plan smanjenje potrošnje energije u sportskim objektima te pilot implementacija na zgradama Sporska dvorana Borovo Naselje, Sportski centar Lijeva bara i HNK Vukovar 1991</p> <p>3. Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" – Vukovar (IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost; 781.777,50 €), koji je za cilj imao razvoj i poboljšanje turističke infrastrukture i stvaranje ekonomske aktivnosti oko novog turističkog proizvoda</p> <p>4. "New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar" , IPA IV, 115.139,34 €, koji je za cilj imao unaprjeđenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije putem jačanja kapaciteta partnera.</p> <p>5. Strateški partner u SEE projektu DaHar, čiji je cilj bio razvoj strategija za razvoj luka na Dunavu.</p> <p>6. "Ujedinjeni u jednu uniju", projekt financiran iz programa Europa za građane čiji je cilj bio predstavljanje EU i njene podrške i značaja sudjelovanja građanstva uključenih u procese odlučivanja kroz susrete bratimljenih gradova iz 5 zemalja.</p>
Partneri:	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<p>Ciljane skupine:</p> <p>Grad Vukovar</p> <p>Komunalac d.o.o.</p> <p>Poduzetnici s područja grada Vukovara</p> <p>Mali obrti i OPG-i s područja grada i okolice</p> <p>Krajnji korisnici:</p> <p>Svi građani grada Vukovara kao i građani okolnih mjesta</p>
Zrelost projekta²:	U provedbi, potpuno pripremljena dokumentacija
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada investicijske studije i projektne prijave <ol style="list-style-type: none"> a. Objava natječaja b. Provedba natječaja i odabir pružatelja usluge c. Izrada studije i prijave

² Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	2. Izvođenje investicije (dovršetak gradnje i opremanje)
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR.
Obrazloženje projekta	<p>Grad Vukovar je tijekom 2015. godine izradio idejno arhitektonsko rješenje gradske tržnice Vukovar nakon kojega je izrađen glavni i izvedbeni projekt.</p> <p>Tijekom 2016. godine proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova nakon kojega je započeta gradnja.</p> <p>Nova tržnica nalaziti će se u blizini naselja Olajnica, na lokaciji između rijeke Vuke, zgrade FINA-e i Autobusnog kolodvora.</p> <p>Nova tržnica na Olajnici imat će 3.396 m². Zgrada je jednoetažna, slobodno stojeća na parceli, ima kosi jednostrešni krov. Vanjske dimenzije zgrade su 106,80 x 31,80 metara , visina na početku sjevernog pročelja je 5,18 metara, a na južnom pročelju 8,60 metara. Zgrada tržnice pod jednim krovom ima sve sadržaje.</p> <p>Zgrada nove gradske tržnice na Olajnici pozicionirana je uzdužno u smjeru istok-zapad, paralelno s produžetkom prometnice. Svi sadržaji tržnice su natkriveni. Pješački pristupi omogućeni su sa svih strana, a kolni pristupi sa istočne i zapadne strane. Parkiralište je duž sjeverno pročelje, te na zapadnoj i istočnoj strani parcele. Zgrada je jednoetažna karakterističnog zakošenog presjeka. Vanjski gabariti tržnice su 107 x 32m.</p> <p>Unutar natkrivenog dijela, između komunikacijskih prodora, smještena su tri zatvorena bloka u kojima su smješteni različiti sadržaji i prateći prostori koje danas tržnica treba imati. Jedan dio zatvorenog u funkciji je poslovanja tržnice, drugi je trgovačkog sadržaja, a treći ugostiteljskog. Uzdužno i između tih objekata smještena je natkrivena „zelena tržnica“ sa štandovima.</p> <p><u>Ugostiteljski dio</u> je prostora ukupne bruto površine od 264m² i podrazumijeva prostor za cafe bar, pekarnicu, zalogajnicu i javni sanitarni prostor za posjetitelje. (Dakle, koristit će ga minimalno 3 poslovna subjekta).</p> <p>Središnji dio jest <u>zatvoreni prodajni prostor</u> bruto površine od 540m² s prodajnim prostorom za mliječne proizvode i jaja , prodavaonicama za meso , prodajnim mjestima za ribe i riblje proizvode te prodajna mjesta za odjeću, obuću, suvenire, dječje igračke i sl..</p> <p>Treći dio jest zajednički <u>poslovno-logistički kompleks</u> ukupne bruto površine 264 m², u kojem su smješteni prostor za vage, spremište-ostava, dvije hladnjače, prostor za otpad i kartonsku ambalažu te dva ureda tržnice i dva poslovna prostora za najam.</p> <p>Konačno, zatvorene prostore povezuje natkrivena „zelena tržnica“ od 1.712m², opremljena betonskim prodajnim klupama (pultovima), ugostiteljsko-konzumnom terasom, te slavinama s pitkom vodom i klupama za odmor. Jedan dio prostora koji nije uređen/organiziran, također se može organizirati u prodajna mjesta za male OPG-ove i obrtnike.</p>

Trenutno se gradska tržnica nalazi na otvorenom (natkrivenom) prostoru s lošim higijenskim uvjetima. Nova i moderna tržnica će pružiti priliku obrtnicima, malim poduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima iz Vukovara i okolice da, uz svu potrebnu poslovnu infrastrukturu, prodaju svoje proizvode i time doprinose razvoju lokalnog poduzetništva u proizvodnji i preradi hrane, tradicijskih proizvoda, ukrasa i predmeta uporabne vrijednosti. Stoga je ona primarno vezana uz plansku domenu „**Industrija i poduzetničko okruženje**“.


No, značaj gradske tržnice višestruk je. Ponajprije, budući da se radi o mjestu trženja prvenstveno poljoprivrednih i tradicijskih proizvoda, projektom se doprinosi planskoj domeni „Poljoprivreda i ruralni razvoj“. Jedan dio funkcija tržnice je i ugostiteljski, pa u tom smislu ona ima i poduzetnički i turistički značaj. No društveni i kulturni-turistički značaj (domene: „**Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje**“ i „**Kulturno nasljeđe i turizam**“) proizlazi osobito iz činjenice da su gradske tržnice u cijelom svijetu mjesto okupljanja, susreta i boravka stanovnika grada i prigradskih naselja, a sve češće i posjeta i interesa posjetitelja koji ih prepoznaju ne samo kao mjesto nabavke i konzumacije autohtonih lokalnih proizvoda i suvenira, nego i mjesto na kojem je lokalnu kulturu moguće doživjeti direktno.

Stoga je ulaganje u gradsku tržnicu investicija od višestrukog značaja za razvoj grada. Iz perspektive triju osi regeneracije, zato, možemo nedvosmisleno tvrditi da se izgradnjom tržnice regenerira prostor grada (od antičkih tržnica jest središte urbanog prostora), dakle njegova **fizička infrastruktura, kao i društveno tkivo** – tržnice su mjesto okupljanja i razmjene na kojima se urbano društveno tkivo prožima, ali i povezuje sa svojim ruralnim okruženjem. Jasno je, budući da je namjena tržnice primarno gospodarskog karaktera, da ona predstavlja važan element **gospodarske regeneracije** grada, dajući mu ključno mjesto za trženje lokalnih proizvoda.


Projekt se strateški uklapa u sve relevantne razvojne dokumente:

- Još uvijek važeća RAZVOJNA STRATEGIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE 2011.-2013., Strateški cilj 1. Konkurentno gospodarstvo, i to prioritete 1.2 Jačanje poduzetništva i privlačenje ulaganja i 1.3 Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, a posredno, jednim dijelom i 1.4. Razvoj turizma.
- Prema STRATEGIJI OBNOVE I RAZVOJA GRADA VUKOVARA 2014.-2020., koja ima za prvi strateški cilj 1. Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara, projekt, budući primarno projekt razvoja gospodarske infrastrukture, doprinosi prioritetu 1.1 Snažna potpora malom i srednjem poduzetništvu putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja
- Doprinosi razvoju gospodarstva, projekt doprinosi prioritetu 1 STRATEGIJE BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ, naslovljenom: „Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu“

Aktivnosti grupirane po EP:	<p>EP 1 Izgradnja tržnice</p> <p>1.1. Dovršetak radova izgradnje tržnice</p> <p>EP 2 Opremanje tržnice</p> <p>2.1. Provedba natječaja za dobavljače opreme</p> <p>2.2. Postavljanje opreme</p> <p>EP 3 Promocija i vidljivost</p> <p>3.1. Lokalna promotivna kampanja (radio, lokalne TV, portali, tiskani mediji, plakati)</p> <p>3.2. Svečano otvorenje tržnice</p> <p>EP4 Administracija i upravljanje</p>
Ključni rezultati:	<p>Gradska tržnica izgrađena i opremljena svim poslovnim, logističkim, trgovačkim, društvenim i ugostiteljskim sadržajima</p>
Pokazatelji:	<p>EFRR POKAZATELJ NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1</p> <p>POKAZATELJ REZULTATA PROJEKTA:</p> <p>3.396 m2 gradske tržnice izgrađeno i opremljeno</p>
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelji projekta – (Grad Vukovar, 50% radnog vremena) 2. Koordinator radova – (Grad Vukovar, 20% radnog vremena) 3. Stručni suradnik/ca za građevinske radove – (Grad Vukovar, 10% radnog vremena) 4. Stručni suradnik/ca za elektro radove – (Grad Vukovar, 10% radnog vremena) 5. Stručni suradnik/ca za strojarske radove – (Grad Vukovar, 10% radnog vremena) 6. Projektni asistent/ica - (Grad Vukovar, 50% radnog vremena) 7. Financijsko-računovodstveni referent/ica – (Grad Vukovar, 20% radnog vremena) 8. Koordinator/ica za promidžbu i vidljivost – (Grad Vukovar, 20% radnog vremena)
Trajanje:	<p>Završetak radova se očekuje sredinom 2017. godine.</p>
Održivost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financijska i upravljačka održivost: Nakon izgradnje upravljanje tržnicom će biti povjereno gradskoj tvrtki Komunalac d.o.o. koja već upravlja značajnim elementima grad komunalne infrastrukture i postojećim objektima tržišnog karaktera. Najam prostora na tržnici provodit će se po tržišnim cijenama. Očekuje se da će troškovi održavanja biti veći ili jednaki prihodima, a dodatna sredstva potrebna za održavanje osiguravat će se eventualno iz gradskog proračuna. 2. Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije kao i materijali po visokim ekološkim standardima, odnosno štedljivi.

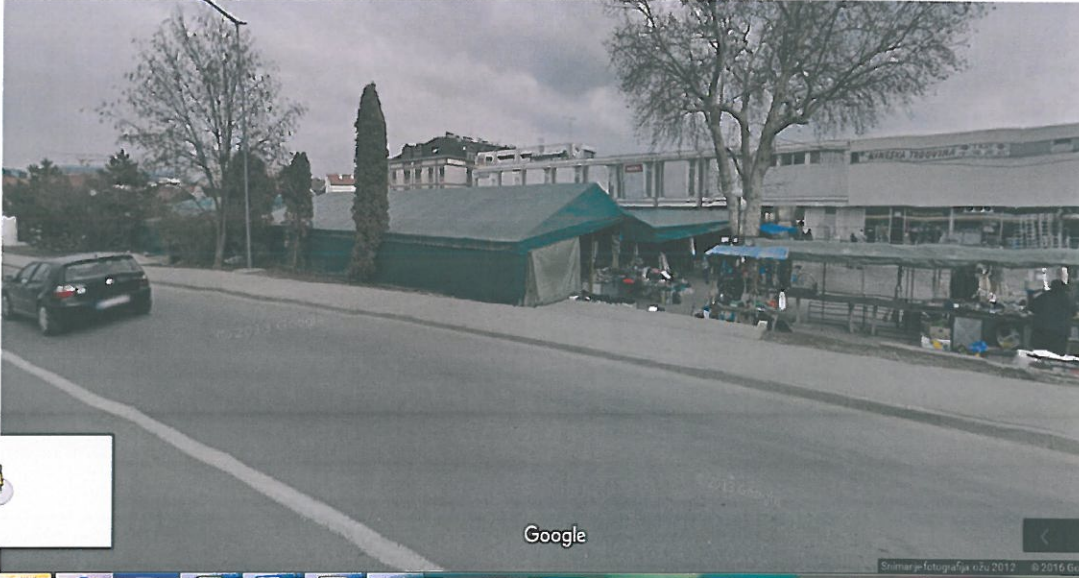Terminski plan provedbe projekta	2017				2018				2019			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
KORACI												
1. Izrada investicijske studije i projektne prijave												
a. Objava natječaja	x											
b. Provedba natječaja i odabir pružatelja usluge	x											
c. Izrada studije i prijave	x											
IZVOĐENJE INVESTICIJE												
EP 1 Izgradnja tržnice												
1.1. Dovođenje radova izgradnje tržnice		x										
EP 2 Opremanje tržnice												
2.1. Provedba natječaja za dobavljače opreme		x										
2.2. Postavljanje opreme		x										
EP 3 Promocija i vidljivost												
3.1. Lokalna promotivna kampanja (radio, lokalne TV, portali, tiskani mediji, plakati)		x										
3.2. Svečano otvorenje tržnice		x										
EP4 Administracija i upravljanje												
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja	<u>Postojeće stanje</u>											
												
	<u>Novo stanje</u>											



NAZIV PROJEKTA	Projekt ADICA
ŠIFRA PROJEKTA	4RP1
Lokacija projekta³	 <p>https://www.google.hr/maps/place/Adica+ul.,+32000,+Vukovar/@45.3513733,18.9702006,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x475c8e4de3e8cd0f:0x38d4437c3cf84dd3!8m2!3d45.3530726!4d18.9746819?hl=hr</p>
Vrsta projekta:	Glavni
Razvojni prioritet:	4RP Razvoj turizma temeljenog na valorizaciji prostora dviju rijeka u gradu Vukovaru
Opći cilj:	<p>1. Prostorni:</p> <p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p> <p>2. Društveni:</p> <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p>

³ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

	<p>3. Gospodarski:</p> <p>Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara.</p>
Specifični cilj:	Revitalizacija park šume Adica radi povećanja turističke atraktivnosti toga područja
Planska domena:	<p>Kulturno nasljeđe i turizam</p> <p>Doprinos i :</p> <p>Okoliš, krajolik i upravljanje prirodnim resursima</p> <p>Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje</p>
Vrijednost:	Provedba 20.500.000,00 kn (pripremna dokumentacija 1.000.000,00kn)
Financiranje :	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15%
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>U sektoru turizma, Grad Vukovar ima iskustva u provedbi ulaganja u prepoznatljivost destinacije na međunarodnom turističkom tržištu. Neki od važnijih turističkih projekata u gradu su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekt „Razvoj novog turističkog proizvoda Eko-etno centar Adica“, nositelj: Grad Vukovar, vrijednost projekta: 781.777,50 EUR. - Projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“, nositelj TZ Grada Vukovara, ukupna vrijednost projekta: 378.003,86 EUR od čega za TZ Grada Vukovara 178.723,39 EUR. <p>Osim putem projekata, znatna ulaganja su učinjena od strane nacionalnih razina u obnovu osnove ponude, kulturne baštine. Prvenstveno kroz projekt Vukovar-Vučedol-Ilok kroz koji je uloženo 30 milijuna eura u obnovu kulturne baštine vukovarskog kraja, između ostalog u obnovu dvoraca Eltz te u izgradnju Muzeja vučedolske kulture. Za razvoj cjelovitog kompleksa arheološkog parka na Vučedolu, kroz OP konkurentnost i kohezija osigurano je 130 milijuna kuna za razvoj kompleksa, a proces programiranja je u tijeku.</p>
Partneri:	Turistička zajednica Grada Vukovara
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<p>Ciljane skupine:</p> <p>Gradska uprava</p> <p>Obrtnici i ugostitelji na Adici</p>

	<p>Krajnji korisnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Učenici i studenti, - Turisti različitih profila, ali osobito ljubitelji adrenalinskih i kulturnih sadržaja i prirode, - Tematski povezane udruge, - turističke agencije i - stanovnici grada Vukovara u cjelini.
Zrelost projekta⁴:	Idejna faza, za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci.
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izraditi idejna rješenja <ol style="list-style-type: none"> a. Objava natječaja b. Provedba natječaja i odabir pružatelja usluge c. Izrada projekta 2. Izraditi glavne i izvedbene projekte i planove opremanja <ol style="list-style-type: none"> a. Objava natječaja b. Provedba natječaja i odabir pružatelja usluge c. Izrada projekata 3. Izrada planova opremanja s troškovnicima <ol style="list-style-type: none"> a. Objava natječaja b. Provedba natječaja i odabir pružatelja usluge c. Izrada projekta 4. Izrada investicijske studije (i projektne prijave) <ol style="list-style-type: none"> a. Objava natječaja b. Provedba natječaja i odabir pružatelja usluge c. Izrada studije (i prijave) 5. Pripremiti pravnu podlogu za koncesiju (<i>zakup</i>) 6. Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 7. Podnošenje zahtjeva i izdavanje građevinske dozvole (i drugih, ako je relevantno) 8. Izvođenje investicije 9. Koncesioniranje (<i>zakup</i>)
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Obrazloženje projekta	<p><u>Uvod: turizam u Gradu Vukovaru</u></p> <p>Vukovarsko područje posjeduje velike komparativne prednosti u pogledu razvoja resursno-atraktivne osnove koju prvenstveno čine krajobrazne i prirodne vrijednosti, jedinstvena kulturna baština (Vučedol) te povoljan geoprometni položaj (relativna</p>

⁴ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

blizina 3 susjedne države i dunavski prometni put). Ipak, vukovarski turizam još uvijek ne koristi svoje potencijale u potpunosti.

U strukturi turista ističe se nekoliko skupina turista:

1. Putnici s kruzera – uglavnom osobe starije životne dobi i u pravilu na području grada borave 1 dan. Uglavnom su zainteresirani za upoznavanje osnovnog identiteta grada, a to su Muzej Vučedolske kulture, Dvorac Eltz, povijesna barokna jezgra te memorijalna mjesta Domovinskog rata. Iz godine u godinu raste broj putnika kruzera i broja pristajanja. Primjerice u 2015. u Vukovaru je bilo 221 pristajanje sa 20.207 putnika. Za potrebe ove skupine turista nužno je urediti i obogatiti sadržajima šetnicu uz Dunav.

2. Učenici koji u okviru školskog programa posjećuju memorijalna mjesta Domovinskog rata. Program je započeo 2013. godine, a 2015. Vukovar je posjetilo 27.369 posjetitelja.

3. Cikloturisti - s obzirom da kroz Vukovar prolazi Dunavska biciklistička ruta, grad posjećuje značajan broj cikloturista čiji broj je stabilan (14.200 cikloturista u 2014. godini). U svrhu obogaćivanja ponude za ovu skupinu turista potrebno je razviti dodatne sadržaje i osigurati smještaj prilagođen potrebama cikloturizma.

4. Posjetitelji memorijalnih centara - Vukovar kao simbol obrane Hrvatske u domovinskom ratu privlači svake godine veliki broj posjetitelja čiji boravak bi se također mogao produljiti uvođenjem dodatne turističke ponude.

Broj noćenja po posjetitelju je stabilan i iznosi cca 1,5 noćenja po posjetitelju. Sa dodatnim turističkim sadržajima i ponudama moguće je produžiti boravak posjetitelja u gradu te povećati prihod od turizma.

Strateško utemeljenje:

Projekt je usklađen sa sljedećim strateškim dokumentima:

- Strateške smjernice razvoja turizma 2016.-2020. - Grad Vukovar, u kojima je identificirana potreba i prilika u pogledu razvoja turističke infrastrukture na Adici u okviru nekoliko razvojnih područja (u odnosu na smještajne kapacitete i turističke sadržaje)
- Strategija VU 2020 – projekt se uklapa u prioritetna područja 2.3 Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru, 2.4 Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora te u prioritet 3.4 Ojačana svijest o zaštiti okoliša u gradu Vukovaru
- U smislu još uvijek aktualne Županijske razvojne strategije, projekt je usuglašen s prioritetom 1.4 Razvoj turizma
- U pogledu Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, projekt će unaprijeđenjem društvenih i ekonomskih uvjeta u gradu Vukovaru doprinijeti ostvarenju njezina cilja: Osiguravanje uvjeta za

sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba

Opravdanje i opis ulaganja:

Projekt je usmjeren na dovršetak revitalizacije i ostvarenje punog potencijala Park šume Adica. Navedena lokacija idealna je kombinacija prirodnih resursa koji se nalaze praktički u urbanom dijelu Vukovara.

Na navedenoj lokaciji se već sad nalazi restoran Slavonsko-srijemske kuhinje u okviru kojeg se nalazi vinski podrum s kušaonom vina, 6 bungalova sa 12 smještajnih jedinica, 3 poslovna prostora i jedna manja multimedijalna prostorija za sastanke i predavanja. Od dodatnih sadržaja tu su i poligon za paintball, trim staza te ljetna pozornica, a građevinskim zahvatom do sad je obuhvaćen i završen dio šetnice uz Vuku u naselju Olajnica što je na pola puta do Adice. Adica je s gradom povezana i turističkim vlakom.

Na navedenoj lokaciji godišnje se organizira desetak kulturnih i turističkih sadržaja poput festivala i etno-eko sajмова.

Projektom se planira unaprijediti turistički potencijal tog prostora kroz tri aspekta:

- 1) Unaprjeđenje pristupa i turističke ponude uređenjem prostora uz staro korito Vuke
- 2) Razvoj novih turističkih sadržaja na Adici: adrenalinsko-edukativni park i čarobna šuma Adica
- 3) Uređenje smještajnih kapaciteta – bungalova i kampa

1) Unaprjeđenje pristupa Adici uz korito Vuke

Ideja je izgradnja **pješačko-biciklističke staze** uz rijeku Vuku u park šumi Adica, kao nastavku staze koju trenutno grade Hrvatske vode (u sklopu uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara, a koja će voditi uz lijevu obalu Vuke od željezničkog mosta do kraja Ulice 204. vukovarske brigade), čime bi se centar grada spojio sa park šumom Adica. Staza je **planirana od kraja Ulice 204. vukovarske brigade do izvora Dobra voda, odnosno crkve Svete Petke, u dužini od cca. 1,1 km, sa dodatnim kracima koji bi vodili na desnu obalu Vuke**, koja je trenutno zbog nepristupačnosti terena neiskorištena.

Kako planirana trasa prolazi područjem koje je za visokih voda poplavljeno, **staza bi u cijelosti bila postavljena na stupovima** čime bi se omogućila njena uporaba i kod visoke vode. Staza bi u cijelosti bila izgrađena od drveta kako bi se u što manjoj mjeri narušio prirodni krajobraz.

Pretpostavka za provedbu ovoga ulaganja jest uspješna provedba projekta Hrvatskih voda, budući da on podrazumijeva i izgradnju brane na ušću rijeke Vuke u Dunav, čime bi se sprječavalo presušivanje koje umanjuje atraktivnost područja, a i priključnu pješačko-biciklističku stazu, do kraja Ulice 204. vukovarske brigade).

2) Adrenalinsko-edukativni park i „Čarobna šuma“ Adica kao set novih turističkih sadržaja

Razvoj novih turističkih sadržaja podrazumijeva sljedeće elemente:

2.1. Adrenalinski park bio bi podijeljen na dva dijela koji se međusobno nadopunjuju – jedan bi bio namijenjen djeci i osobama mlađeg uzrasta, a drugi za odrasle. Adrenalinski park bi sadržavao različite sadržaje za djecu te poligone i teren za paintball. U izradi bi se koristili samo prirodni materijali od kojih bi bile izrađene stijene za penjanje, mreže i slično.

2.2. Tematsko-edukativne šetnice sadržajno bi obrađivale teme:

- Upoznavanje prirode na Adici - učenje u Adici (biljni i životinjski svijet prilagođen učenicima osnovnih i srednjih škola o kojem više saznaju klikom na postavljene QR code-ove),
- Vukovarski put baroka (minijature zgrada, kuća, institucija s QR code-ovima),
- Vučedolski put (minijature nastambe na Vučedolu , muzeja, alata i slično s QR code-ovima i
- Put vukovarske kulture, znanosti , poznatih ličnosti, bajki i legendi.

2.3. „Čarobna šuma“ Adica

Plan je da se u adventsko doba park pretvara u Čarobnu božićnu šumu. Ideja je da se šuma dekorira LED lampicama i brojnim božićnim ukrasima. U sklopu šume bio bi postavljen grijani šator u kojem bi se svakodnevno održavale razne manifestacije u organizaciji TZ Grada Vukovara.

3) Uređenje smještajnih kapaciteta – bungalova i kampa

Trenutačno se na tom prostoru nalazi samo šest bungalova s dvanaest smještajnih jedinica. Cilj je osigurati smještaj u kojem bi se mogao smjestiti jedan prosječan autobus djece i/ili odraslih, odnosno, **radi se o 20 bungalova s dvokrevetnim i četverokrevetnim sobama s pratećom infrastrukturom.**

Bungalovi bi bili postavljeni na drvene stupce djelom na rijeci Vuki i povezani drvenim mostićima kako bi se dobila atraktivnost, a bili bi izrađeni od drveta koje je autohtono na ovom prostoru.

Uz njih, planira se izgraditi kamp. **Kamp za šatore bio bi površine koja može zadovoljiti postavljanje 20 šatora s pratećom infrastrukturom.**

	<p>4) Izrada turističkog brenda grada Vukovara</p> <p>Jedna od većih zapreka razvoju turizma u gradu, unatoč prepoznatljivosti u simboličkom prostoru unutar pa i izvan granica RH, jest nedostatak jasno artikuliranog identiteta grada kao turističke destinacije koja objedinjuje vizure i doživljaje rijeka Dunava i Vuke kao prostornog elementa, snažna i bogata povijesna iskustva (suvremena ratna stradanja, ali i pečate prijašnjih epoha vidljive u estetici grada) kojima je vrijeme upisano u prostor grada. Uz te velike teme, brend treba osigurati prostor za promociju zabavnih i gastro-enoloških sadržaja, osobito onih koje se aktualno razvijaju na i oko Adice.</p> <p>Stoga će Grad Vukovar i njegova Turistička zajednica, uz podršku renomiranog pružatelja usluga u turističkom brendiranju, pribavljenog uz javnu nabavu, izraditi Strategiju turističkog branda grada Vukovara s osnovnim komunikacijskim smjernicama te vizualnim identitetom.</p> <p>Razradom strategije turističkog brandinga grada Vukovara, stvorit će se preduvjeti za uspješnu gospodarsku regeneraciju grada (turizam), njegovu fizičku regeneraciju (valorizaciju prostora, izgradnju infrastrukture); kao i društvenu regeneraciju kako kao posljedicu prva dva oblika (zapošljavanje, bolji uvjeti života), tako i posebno u pogledu razvoja novih, svim generacijama i društvenim skupinama bliskih identitetskih odrednica grada.</p> <p>Cijeli projekt će doprinijeti gospodarskoj i fizičkoj regeneraciji grada Vukovara, stvarajući jednu od nosivih turističkih atrakcija za koju se očekuje da će doprinijeti razvoju turizma i ostvarivanju prihoda od turizma, no koja će istovremeno valorizirati i fizički izgrađivati prostor grada na području rijeke Vuke. Očekuje se da će doprinositi i društvenoj regeneraciji, kako kroz stvaranje novih radnih mjesta (kako u samim objektima, neposredno, tako i posredno u uslužnom sektoru u gradu). Konačno, ulaganja u Adicu će predstavljati i značajnu društvenu infrastrukturu čija namjena nije samo komercijalna, i koja će biti prostor zabave, informiranja, edukacije i rekreacije za sve stanovnike grada.</p> <p>U pogledu planskih domena, koncept sadržaja na Adici usmjeren je ka objedinjavanju prirodnih značajki s turističkim i edukativnim sadržajima (o prirodnim, povijesnim i kulturnim znamenitostima) te time projekt prožima barem tri planske domene IP-a („kulturna baština i turizam“, „okoliš, krajolik i upravljanje prirodnim resursima“ te „društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje“).</p>
<p>Aktivnosti grupirane po EP:</p>	<p>EP 1 Infrastrukturni radovi</p> <p>1.1. Raspisivanje javnog natječaja za izvođača</p> <p>1.2. Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima</p>

	<p>1.3. Provedba ugovora 1.4. Nadzor nad izvođenjem radova</p> <p>EP 2 Opremanje</p> <p>2.1. Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme (staza, adrenalinsko-obrazovni park, edukativne šetnice, čarobna šuma, bungalovi) 2.2. Nabavka opreme 2.3. Opremanje objekata</p> <p>EP 3 Promidžba i vidljivost</p> <p>3.1. Priprema i provedba natječaja za oglašivačku agenciju 3.2. Izrada plana promocija novih sadržaja i kapaciteta 3.3. Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)</p> <p>EP 4 Izrada strategije turističkog brenda grada Vukovara</p> <p>1.1. Priprema natječajne dokumentacije (istraživanje tržišta) 1.2. Objava natječaja 1.3. Odabir ponuditelja 1.4. Izrada strategije</p> <p>EP 5 Promocija i vidljivost</p> <p>EP 6 Administracija i upravljanje</p> <p>EP 7 Upravljanje i administracija</p>
<p>Ključni rezultati:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izgrađene biciklističko-pješačke staze koje vode do Adice 2. Adrenalinsko- obrazovni park izgrađen na obrazovnim šetnicama. 3. Šuma opremljena za božićni sadržaj „Čarobna šuma“ 4. Bungalovi izgrađeni i opremljeni 5. Uređen i popratnom infrastrukturom opremljen kamp 6. Izrađena strategija turističkog brenda grada Vukovara
<p>Pokazatelji:</p>	<p>EFRR POKAZATELJ NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 4</p> <p>POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA:</p> <p>Broj novih turističkih sadržaja (4):</p> <p>1.5 km biciklističkih staza izgrađeno</p> <p>40.000m2 adrenalinski park izgrađeno i opremljeno</p> <p>20 bungalova izgrađeno</p> <p>20 kamp mjesta uređeno</p>

	Izrađen strateški dokument (1)
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelj/ica projekta – Grad Vukovar (100%) 2. Koordinator/ica radova – VURA (50%) 3. Stručni suradnik/ca za građevinske radove – Grad Vukovar (20%) 4. Stručni suradnik/ca za elektro radove – Grad Vukovar (20%) 5. Stručni suradnik/ca za strojarske radove – Grad Vukovar (20%) 6. Projektni asistent/ica - VURA (100%) 7. Financijsko-računovodstveni referent/ica - Grad Vukovar (20%) 8. Stručnjak/inja za javnu nabavu – Grad Vukovar (40%) 9. Stručnjak/ci za razvoj avanturističkog turizma – Planinarsko društvo Ravnica (50%) 10. Stručnjaci za pripremu programa „Čarobna šuma“ – Turistička zajednica Grada Vukovara (50%) 11. Stručnjaci za razvoj turizma i interpretaciju prirodnih i kulturnih sadržaja – Turistička zajednica stručnjak (50%) 12. Koordinator/ica za promidžbu i vidljivost – VURA (50%)
Trajanje:	<p>Priprema investicije (4 kvartala – dijelovi teku paralelno)</p> <p>Provedba investicije (6 kvartala)</p> <p>Koncesioniranje (3 kvartala, počinje krajem provedbe)</p>
Održivost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financijska i upravljačka održivost: <ul style="list-style-type: none"> • Bungalovi i kamp (u paketu) dati će se u zakup putem javnog natječaja i trošak njihovog redovitog održavanja bi snosio zakupnik, a izvanrednog/investicijskog Grad Vukovar. • Adrenalinski park bi u promotivnom razdoblju vodila udruga Planinarsko društvo Ravnica, a nakon toga bi također bilo ponuđeno u zakup putem javnog natječaja. Održavanje kao i bungalovi/kamp. • Čarobna šuma - u cijelosti u nadležnosti Grada Vukovara, uključujući upravljanje i programsko vođenje sa strane Turističke zajednice 2. Okolišna održivost: Investicija će se izvoditi korištenjem prirodnih materijala, a smisao svih sadržaja uvelike je usmjeren promociji i očuvanju prirode i prirodnih znamenitosti Adice i cijelog područja grada Vukovara.
Terminski plan provedbe projekta	

KORACI	2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	QXIII	QXIV	QXV	QXVI
Priprema investicije																
1. Izraditi idejna rješenja																
a. Objava natječajna (mjesec dana)	x															
b. Provedba natječajna i odabir pružatelja usluge (mjesec dana)	x															
c. Izrada projekta (mjesec dana)	x															
2. Izraditi glavne i izvedbene projekte i planove opremanja																
a. Objava natječajna (mjesec dana)		x														
b. Provedba natječajna i odabir pružatelja usluge (mjesec dana)			x													
c. Izrada projekta (dva mjeseca)			x	x												
3. Izrada planova opremanja s troškovnicima																
a. Objava natječajna (mjesec dana)				x												
b. Provedba natječajna i odabir pružatelja usluge (mjesec dana)				x												
c. Izrada projekta (mjesec dana)				x												
4. Izrada investicijske studije																
a. Objava natječajna (mjesec dana)				x												
b. Provedba natječajna i odabir pružatelja usluge (mjesec dana)				x												
c. Izrada projekta (dva mjeseca)				x	x											
5. Pripremiti pravnu podlogu za koncesiju (zakup), kod projekata s koncesijom (2 mjeseca)																
6. Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (mjesec dana)																
7. Podnošenje zahtjeva i izdavanje građevinske dozvole (i drugih, ako je relevantno) (mjesec dana)																
Provedba investicije																
EP 1 Infrastrukturni radovi																
1.1. Raspisivanje javnog natječajna za izvođača						x	x									
1.2. Raspisivanje javnog natječajna za nadzor nad radovima							x									
1.3. Provedba ugovora								x	x	x	x	x	x	x		
1.4. Nadzor nad izvođenjem radova								x	x	x	x	x	x			
EP 2 Opremanje																
2.1. Raspisivanje javnih natječajna za dobavljače za različite vrste opreme								x	x							
2.2. Nabavka opreme								x	x							
EP 3 Promidžba i vidljivost																
3.1. Priprema i provedba natječajna za oglašivačku agenciju									x							
3.2. Izrada plana promocija novih sadržaja i kapaciteta										x	x	x				
3.3. Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)										x	x	x				
EP 4 Upravljanje i administracija																
Poslije investicije: koncesioniranje																

Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja

N/A

NAZIV PROJEKTA	Društveno-obrazovni centar "Dunav"
ŠIFRA PROJEKTA	1RP1
Lokacija projekta⁵	
Vrsta projekta:	Glavni
Razvojni prioritet:	1RP Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje
Opći cilj:	<p>Prostorni:</p> <p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p> <p>Društveni:</p> <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturuom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p>
Specifični cilj:	Uspostavom društveno-obrazovnog centra osigurati prostor za rad, edukacije i povezivanje dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora kako bi se osigurala bolja suradnja i društveno-gospodarski napredak grada.

⁵ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Planska domena:	Društvene djelatnosti Industrija i poduzetničko okruženje (gospodarstvo) Kultura i turizam
Vrijednost:	35.000.000,00 kn od čega troškovi dokumentacije: 2.000.000,00 kn
Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15% (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara – za kupovinu, FZOEU – za obnovu)
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Od završetka Domovinskog rata u kojem je Vukovar pretrpio goleme štete proveden je veći broj projekata. Značajnu ulogu u procesu obnove i razvoja grada nakon Domovinskog rata ima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine temeljem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojenog 2001. godine. Uloga Fonda naglašena je kroz intenziviranje društvenog i ekonomskog oživljavanja grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i javne infrastrukture. Osim putem Fonda, značajan broj projekata kako infrastrukturnih, tako i ostalih, u različitim sektorima sufinanciran je sredstvima EU. Neki od značajnijih projekata, prema sektorima, su:</p> <p><i>Gospodarstvo/poduzetništvo:</i></p> <p>1) Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar u 3 faze</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara) - EU projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti 909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Drugom fazom je obuhvaćeno kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora. - EU projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“, vrijednost: 21.293.090,71 kn. Ovom fazom obuhvaćeno je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m²) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. <p>2) “New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar” , IPA IV, 115.139,34 €, koji je za cilj imao unaprjeđenje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije putem jačanja kapaciteta partnera.</p> <p>3) Strateški partner u SEE projektu DaHar, čiji je cilj bio razvoj strategija za razvoj luka na Dunavu.</p> <p><i>Turizam:</i></p>

	<p>4) Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" – Vukovar (IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost; 781.777,50 €), koji je za cilj imao razvoj i poboljšanje turističke infrastrukture i stvaranje ekonomske aktivnosti oko novog turističkog proizvoda</p> <p>5) Projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“, nositelj TZ Grada Vukovara, ukupna vrijednost projekta: 378.003,86 EUR od čega za TZ Grada Vukovara 178.723,39 EUR.</p> <p><i>Energetska učinkovitost:</i></p> <p>6) Nearly Zero-Energy Sports Facilities (n0e-sport) – partneri na projektu financiranom putem IEE. Pilot projekt kojim se izrađuje analiza i plan smanjenje potrošnje energije u sportskim objektima te pilot implementacija na zgradi HNK Vukovar</p> <p><i>Civilno društvo:</i></p> <p>7) "Ujedinjeni u jednu uniju", projekt financiran iz programa Europa za građane čiji je cilj bio predstavljanje EU i njene podrške i značaja sudjelovanja građanstva uključenih u procese odlučivanja kroz susrete bratimljenih gradova iz 5 zemalja.</p>
Partneri:	Turistička zajednica grada Vukovara
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<p>Ciljane skupine:</p> <p>Lokalna samouprava, udruge, TZ Grada Vukovara</p> <p>Krajnji korisnici:</p> <p>Udruge, vijeća nacionalnih manjina, lokalno stanovništvo, lokalna samouprava i drugi zainteresirani dionici.</p>
Zrelost projekta⁶:	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 2. Nabava i izrada potrebne dokumentacije za rekonstrukciju 3. idejni projekt 4. glavni projekt 5. izvedbeni projekt 6. Ishođenje potrebnih dozvola 7. Priprema projektne prijave 8. Izrada studije izvedivosti (CBA) 9. Projektni obrasci 10. Rekonstrukcija zgrade hotela Dunav 11. Opremanje centra

⁶ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	12. Javni natječaj za zakup komercijalnog dijela prostora (kafić, restoran i dr.)
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Obrazloženje projekta	<p>Posljedice rata najviše su traga ostavile upravo na životima stanovnika Vukovara zbog čega, uz institucije koje pružaju stručnu pomoć, velik značaj imaju i udruge koje sudjeluju u rehabilitaciji, jačanju socijalne inkluzije i edukacijama lokalnog stanovništva, a osobito ranjivih skupina. U ovoj se skupini posebno ističu udruge mladih i za mlade, udruge za rad s djecom i mladima s intelektualnim i drugim poteškoćama u razvoju, vukovarski branitelji i stradalnici te njihove obitelji. Potrebe ovih skupina najviše se povezuju s pružanjem psihosocijalne pomoći, a od velikog su značaja i aktivnosti vezane za obrazovanje radi općeg usavršavanja i prekvalifikacije (npr. informatičko osposobljavanje mladih i djece s poteškoćama u razvoju) koje se vrše putem udruga.</p> <p>Imajući u vidu sve zahtjevnije društvene trendove, brze promjene na tržištu rada, ali i sve težu gospodarsku situaciju koja utječe na cijelu populaciju, a posebice na mlade te ostavlja posljedice, područje informiranja i savjetovanja je prepoznato u svim područjima života (obrazovanje, zapošljavanje, aktivno građanstvo, socijalna politika, kultura i slobodno vrijeme, mobilnost i dr.) te kao takvo posebno naglašeno i u rezolucijama Vijeća Europe, a Info centri za mlade važni dionici u društvu u svim europskim zemljama, posebice članicama Europske unije. Kako bi isto primijenili i u Hrvatskoj, u velikim gradovima osnovani su i kroz Nacionalni program za mlade finansijski podržani Regionalni info centri za mlade, dok na lokalnim razinama to nije bio slučaj sve do prošle godine. Ipak u nekim mjestima udruge civilnog društva su i prije pokrenule samostalno projekte i/ili programe lokalnih info centara za mlade. Mladi su danas zbog nezaposlenosti u većini slučajeva dezorijentirani, ne znaju što i na koji način učiniti kako bi poboljšali svoj status i kvalitetu života pa nerijetko za svoj put odabiru odlazak u neke veće i «zdravije» sredine u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Kako bi ispunili svoju ulogu i u potpunosti bili na usluzi i od podrške mladima, voditeljima info centara za mlade treba dodatna motivacija, znanja i vještine u području informiranja i savjetovanja ove ciljane skupine. To se posebice odnosi na voditelje info centara za mlade koji svoj rad temelje na izravnom radu s onim mladima koji ostaju i pokušavaju pronaći svoje mjesto u lokalnoj zajednici željni sadržaja i mogućnosti, odnosno informacija koje im lokalna zajednica pruža. Uzimajući u obzir različite potrebe i situacije mladih, informiranje i savjetovanje mladih postalo je ključno i od presudne važnosti kako za osobni, tako i za profesionalni razvoj, ali i primarno uključivanje mladih u društvo, posebice onih koji pripadaju izraženim društveno-marginaliziranim skupinama društva. Upravo zato, u Vukovaru je potrebno osigurati jedno mjesto na kojem će i mladi, ali i njihovi savjetnici moći unaprijediti svoja znanja, informirati se te se aktivno uključivati i doprinosti razvoju lokalne zajednice.</p> <p>Osim toga, u Vukovaru djeluje i veći broj udruga koje aktivno djeluju u području zaštite ljudskih prava, socijalnog uključivanja ranjivih skupina poput umirovljenika, zapošljavanja i sl. Ove udruge provele su veći broj projekata i ostvarile značajne rezultate koje doprinose boljoj kvaliteti života u gradu. Ipak, udruge se pri provedbi svojih aktivnosti često susreću s problemima vezanim za osiguranje prostora kao i potrebe za stabilnijom finansijskom potporom za njihov rad.</p> <p>Trenutno, u Gradu Vukovaru ne postoje razvijeni mehanizmi za međufinanciranje aktivnosti udruga kao ni sustav decentralizirane podjele bespovratnih sredstava. Grad putem javnih natječaja financira</p>

rad udruga, no nedostaje financijska potpora kao i adekvatni prostori upravo za udruge koje najviše mogu dati zajednici (udruge koje pripremaju i provode ozbiljne i velike projekte i koje imaju zaposlene) kako bi se njihov rad stabilizirao.

Unatoč tome aktivne udruge i dalje posjeduju velike mogućnosti međusobnog povezivanja i suradnje, a u okviru svojih područja djelovanja čine nezamjenjivi dio društvenog segmenta, pogotovo u kontekstu poslijeratne revitalizacije ovog prostora, ali i šire. U skladu s navedenim, veliku važnost za ovo područje predstavlja nastavak razvoja civilnog društva, osobito u dijelu kojim se može unaprijediti međuetnička suradnja uz istovremeno poticanje gospodarskog i kulturnog razvitka grada Vukovara. Ovom usmjerenju naročito može doprinijeti i intenziviranje suradnje organizacija civilnog društva s predstavnicima lokalne vlasti kao i s poduzetnicima u privatnom sektoru.

Sinergijom djelovanja većeg broja udruga i lokalne samouprave, međusobnom razmjenom informacija te međusobnim pružanjem pomoći dolazi do jačanja socijalne kohezije i društvenog kapitala u zajednici. Na taj način dolazi do bržeg rješavanja problema što ujedno donosi i znatnu uštedu sredstava, a potencijalnim korisnicima znatno skraćuje put traženja rješenja problema. Zadovoljniji građani kvalitetnije mogu doprinosti stvaranju uspješne zajednice kako u društvenom tako i u gospodarskom, političkom i svakom drugom području.

Kao jedno od rješenja koje bi pridonijelo rješavanju navedenih problema i povezivanju civilnog, javnog i privatnog sektora leži u osnivanju Društveno-obrazovnog centra u kojem bi se smjestile brojne udruge, ali i privatni poduzetnici i koje bi bilo mjesto povezivanja ovih sektora putem međusobne suradnje.

Inicijativa građana i udruga da u Vukovaru zaživi centar koji bi svojim sadržajima pružao različite mogućnosti građanskog organiziranja i djelovanja postoji još od 1999. godine, a uz to je i potpisana inicijativa mladih za izgradnju jednog takvog prostora od kada su predstavnici pojedinih udruga i inicijativa koje djeluju u gradu pojedinačno pokušavali iznaći rješenje za nedostatak kvalitetnog prostora u kojem bi se realizirale već pripremljene aktivnosti.

Iz tog razloga, Grad Vukovar planira osnovati Društveno-obrazovni centar koji bi se smjestio u bivšem Hotelu Dunav koji će Grad otkupiti i rekonstruirati. Hotel Dunav, nalazi se u centru grada, u derutnom je stanju te ne samo da nagrđuje vizuru i atraktivnost grada već i predstavlja sigurnosni problem zbog propadanja te je kao takav idealno mjesto za smještaj novog centra. Kako bi prostor hotela zadovoljio sve potrebno za jedan društveno-obrazovni centar potrebno ga je prilagoditi svim potencijalnim korisnicima. U prizemlju zgrade uredit će se prostori za udruge i mlade koji će imati multifunkcionalnu dvoranu koja će se moći koristiti za prezentacije, sastanke, koncerte, projekcije i sl. U prostor centra preselit će se i Turistička zajednica Grada koja će ujedno djelovati i kao promotor samog centra i njegovih aktivnosti. Osim toga, uredit će se prostor za čuvanje i igraonica za djecu za osobe koje koriste usluge centra kako bi imali prostor za ostaviti djecu dok obavljaju poslove ili pohađaju edukacije. Centar će imati dvije kongresne dvorane za potrebe održavanja edukacija, kongresa i druge aktivnosti. Također će se osposobiti restoran koji će služiti za potrebe centra (tipa menze za zaposlene, za posjetitelje, održavanje edukacija i kongresa, posjete škola Memorijalnom centru i sl.) Osim toga, uredit će se prostori koji bi se dali uz simboličnu nadoknadu na korištenje aktivnim

udrugama u gradu (putem javnog natječaja) koje imaju zaposlene i razvijaju projekte. Također, uredit će se dio smještajnih kapaciteta koje bi koristili gosti udruga, Grad Vukovar, a posebice predavači i edukatori. Jedan dio smještaja i uredskih prostora bio bi korišten za komercijalne djelatnosti kako bi se dijelom osigurala održivost projekta. Kroz projekt bi se također izradio i plan usluga koje će se pružati u Centru. Na ovaj će se način potaknuti sinergijsko djelovanje sa širokom lepezom aktivnosti koje bi se nudile građanima na jednom mjestu (edukacije za odrasle, ranjive skupine i sl., rad s mladima, djecom, ženama, različitim manjinskim skupinama i drugo. Osim toga, udruge iz Vukovara koje imaju zapažene rezultate (osobito u sektoru edukacija i integracija manjina i skupina u nepovoljnom položaju) imale bi uštedu tzv. hladnog pogona što bi im pomoglo u razvoju. I na kraju, sam grad Vukovar imao bi jedan kvalitetan društveni centar koji bi mogao odlično prezentirati grad i služiti kao primjer dobre prakse, ne samo u Republici Hrvatskoj nego i šire. Novi prostori (komercijalni dio) mogu se ujedno koristiti i za edukativno-kongresni turizam čime bi se dodatno potaklo gospodarstvo.

Realizacija projekta Društveno-obrazovnog centra imat će značajan utjecaj na fizičku, društvenu, ali i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara – obnovom derutnog hotela u funkciju će se staviti zgrada u centru grada čime će se vizura grada učiniti atraktivnijom, ojačat će se socijalna kohezija u zajednici okupljanjem aktera civilnog društva na jednom mjestu, potaknut će se učinkovitost u društvenom pogledu, potaknuti razvoj i usvajanje novih vještina, bolje informiranje zajednice i šarolik spektar edukacije te na kraju doprinijeti i gospodarskom razvoju ne samo putem direktnog zapošljavanja u centru već i putem edukacija i pripreme građana za tržište rada putem programa koji će se u novom centru odvijati i pružanjem usluga za konferencijski turizam u prostorima centra (konferencijske dvorane, restoran, smještaj).

Projekt doprinosi realizaciji ciljeva sljedećih strateških dokumenata:

1. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije: SC 2. *Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta za upravljanje razvojem* - prioritet 2.1 Razvoj sustava obrazovanja i njegova prilagodba potrebama razvoja; SC 3. *Kvalitetno prostorno planiranje, moderna infrastruktura i očuvani okoliš* – prioritet 3.4 Ulaganja u obnovljive izvore energije i učinkovito korištenje energije; SC 4. *Unapređenje kvalitete života* – prioritet 4.2 Poboljšanje kvalitete života i razvoj socijalnih usluga


2. Strategija Vukovar 2020: SC 1. *Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara* – prioritet 1.2 Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova; SC 2. *Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara* – prioritet 2.2 Potaknuto cjeloživotno učenje i usklađeni obrazovni programi s potrebama tržišta rada, 2.3 Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru, 2.4 Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora

3. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije: cilj 1 Izgraditi sustav za identificiranje, poticanje i razvoj sposobnosti i potencijala pojedinaca te ojačati službe za cjeloživotno osobno i profesionalno usmjeravanje, cilj 4 Poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih

	<p>4. Grad Vukovar: Strateške smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godine: RC Osvremenjivanje i diverzificiranje smještane ponude, Podizanje kvalitete ljudskog kapitala i to, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru</p> <p>5. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.): prioriteti - Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu i Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba</p>
<p>Aktivnosti grupirane po EP:</p>	<p>EP 1 Infrastrukturni radovi (rekonstrukcija)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade. 1.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad radovima 1.3. Provedba ugovora o gradnji 1.4. Provedba građevinskog nadzora nad izvođenjem radova <p>EP 2 Razvoj usluga Društveno-obrazovnog centra</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Izrada plana usluga koje će se pružati u Centru 2.2. Objava Javnih poziva i natječaja za korištenje prostora 2.3. Odabir korisnika prostora <p>EP 3 Opremanje prostora</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Raspisivanje javnih nabava za opremanje prostora centra 3.2. Opremanje prostora (dvorane, uredi, smještajni kapaciteti i dr.) <p>EP 4 Promidžba i vidljivost</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Vukovara 4.2. Svečano obilježavanje useljavanja korisnika u centar i puštanja u rad centra 4.3. Izrada web stranice centra <p>EP 5 Upravljanje i administracija</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Sastanci projektnog tima 5.2. Izvještavanje 5.3. Financijsko upravljanje projektom

	5.4. Financijska revizija projekta
Ključni rezultati:	R1: Obnovljena zgrada Hotela Dunav stavljena u funkciju društveno-obrazovnog centra „Dunav“ R2: Razvijen sadržaj i usluge Društveno-obrazovnog centra R3: Proveden natječaj i odabrani korisnici prostora centra
Pokazatelji:	EFRR POKAZATELJI NEPOSREDNIH REZULTATA: Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1 POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA: Broj izgrađenih/obnovljenih obrazovnih objekata u kojima se provode obrazovni programi: 1
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	Projektini tim: <ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelj/ica projekta 100%, VURA 2. Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) 50%, Grad Vukovar 3. Stručni suradnik za građevinske poslove – 10%, Grad Vukovar 4. Stručni suradnik za elektro radove – 10%, Grad Vukovar 5. Stručni suradnik za strojarske radove – 10%, Grad Vukovar 6. Projektini asistent/ica 100%, TZ 7. Financijsko-računovodstveni referent/ica 20%, Grad Vukovar 8. Stručnjak/inja za javnu nabavu 20%, Grad Vukovar
Trajanje:	Projekt će trajati 2 godine.
Održivost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socijalno/demografska održivost: Projektom će se posredno utjecati na stabilizaciju postojećeg broja stanovnika kroz osiguranje boljih uvjeta obrazovanja i života mladih općenito. 2. Financijska i upravljačka održivost: Financijska održivost procijenit će se prema CBA. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Vukovar za što će sredstva osigurati iz proračuna. Kao što je napomenuto, dio zgrade služit će u komercijalne svrhe (najam prostora, smještaj, restoran) kako bi se osigurao barem dio sredstava za održavanje što neće biti više od 20% kapaciteta. 3. Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije kao i materijali po visokim ekološkim standardima, odnosno štedljivi.

Terminski plan provedbe projekta	Terminski plan provedbe projekta	2018				2019				2020			
		QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV
	1. Izrada projektne dokumentacije												
	Idejno rješenje	x											
	Glavni projekt		x										
	Izvedbeni projekt			x									
	2. Ishođenje dozvola												
	3. Priprema projektne prijave												
	4. Razvoj infrastrukture					x	x	x	x	x	x	x	
	5. Opremanje										x	x	x
	6. Razvoj usluga										x	x	x
	7. Promidžba i vidljivost					x	x	x	x	x	x	x	x
	8. Upravljanje projektom					x	x	x	x	x	x	x	x
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja													

NAZIV PROJEKTA	Izgradnja Ekonomske škole Vukovar
ŠIFRA PROJEKTA	1RP2
Lokacija projekta⁷	
Vrsta projekta:	Glavni
Razvojni prioritet:	1RP Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje
Opći cilj:	<p>Društveni:</p> <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturuom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p> <p>Prostorni:</p> <p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p>
Specifični cilj:	Izgradnjom nove Ekonomske škole sa sportskom dvoranom unaprijediti kvalitetu obrazovanja i društvenog sadržaja grada Vukovara što će pridonijeti većoj zapošljivosti stanovništva i društveno-gospodarskom rastu grada

⁷ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Planska domena:	Društvene djelatnosti Industrija i poduzetničko okruženje (gospodarstvo)
Vrijednost:	50.000.000,00 kn od čega troškovi dokumentacije: 2.700.000,00 kn
Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15%
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Od završetka Domovinskog rata u kojem je Vukovar pretrpio goleme štete proveden je veći broj projekata. Značajnu ulogu u procesu obnove i razvoja grada nakon Domovinskog rata ima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine temeljem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojenog 2001. godine. Uloga Fonda naglašena je kroz intenziviranje društvenog i ekonomskog oživljavanja grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i javne infrastrukture. Osim putem Fonda, značajan broj projekata kako infrastrukturnih, tako i ostalih, u različitim sektorima sufinanciran je sredstvima EU. Neki od značajnijih projekata, prema sektorima, su:</p> <p><i>Gospodarstvo/poduzetništvo:</i></p> <p>1) Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar u 3 faze</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara) - EU projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti 909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Drugom fazom je obuhvaćeno kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora. - EU projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“, vrijednost: 21.293.090,71 kn. Ovom fazom obuhvaćeno je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m2) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. <p>2) “New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar” , IPA IV, 115.139,34 €, koji je za cilj imao unaprjeđenje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije putem jačanja kapaciteta partnera.</p> <p>3) Strateški partner u SEE projektu DaHar, čiji je cilj bio razvoj strategija za razvoj luka na Dunavu.</p> <p><i>Turizam:</i></p>

	<p>4) Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" – Vukovar (IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost; 781.777,50 €), koji je za cilj imao razvoj i poboljšanje turističke infrastrukture i stvaranje ekonomske aktivnosti oko novog turističkog proizvoda</p> <p>5) Projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“, nositelj TZ Grada Vukovara, ukupna vrijednost projekta: 378.003,86 EUR od čega za TZ Grada Vukovara 178.723,39 EUR.</p> <p><i>Energetska učinkovitost:</i></p> <p>6) Nearly Zero-Energy Sports Facilities (n0e-sport) – partneri na projektu financiranom putem IEE. Pilot projekt kojim se izrađuje analiza i plan smanjenje potrošnje energije u sportskim objektima te pilot implementacija na zgradi HNK Vukovar</p> <p><i>Civilno društvo:</i></p> <p>7) "Ujedinjeni u jednu uniju", projekt financiran iz programa Europa za građane čiji je cilj bio predstavljanje EU i njene podrške i značaja sudjelovanja građanstva uključenih u procese odlučivanja kroz susrete bratimljenih gradova iz 5 zemalja.</p>
Partneri:	Ekonomska škola Vukovar
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<p>Ciljane skupine:</p> <p>Nastavno i nenastavno osoblje škole, učenici</p> <p>Krajnji korisnici:</p> <p>Nastavno i nenastavno osoblje škole, učenici, sportsko-rekreativne udruge, polaznici obrazovnih programa za odrasle</p>
Zrelost projekta⁸:	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci.
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabava i izrada potrebne dokumentacije <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Nabava i izrada arhitektonskog rješenja 1.2. Nabava i izrada tehničke dokumentacije <ul style="list-style-type: none"> - idejno rješenje - glavni projekt - projekt opremanja 2. Ishođenje dozvola 3. Priprema projektne prijave

⁸ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	<p>3.1. Izrada studije izvedivosti (CBA)</p> <p>3.2. Projektni obrasci</p> <p>4. Izgradnja nove škole i dvorane</p> <p>5. Opremanje škole i dvorane</p>
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Obrazloženje projekta	<p>U sklopu srednjoškolskog obrazovanja na području Vukovara djeluju 4 srednjoškolske ustanove: Gimnazija Vukovar, Ekonomska škola Vukovar, Strukovna škola Vukovar i Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar. Početkom školske godine 2014./2015. ove je ustanove pohađalo 1.684 učenika, dok je prethodne školske godine 2013./2014. upisano njih 1.751. Vidljivo je kako se broj učenika smanjio za čak 3,8%. Silazni trend upisa učenika u Ekonomskoj školi Vukovar teče već niz godina pa je tako u školskoj godini 2013./2014 upisano 420 polaznika, dok je u školskoj godini 2008./2009 bilo 462 polaznika upisanih u smjerove ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Razlozi za pojavom ovog trenda mogu se pronaći u iseljavanju mladih obitelji s područja grada, ali i u upisima učenika u srednje škole sa šireg područja Županije. Jedan od razloga za to svakako je i činjenica da škola djeluje u neadekvatnim uvjetima koji ne zadovoljavaju prostorne, tehničke i materijalne uvjete obrazovne ustanove, predstavljaju potencijalnu opasnost svim učenicima i uposlenicima koji u njoj rade s obzirom da pješački put do škole prelazi preko dvije benzinske crpke koje nemaju uređene nogostupe, a uz to ne postoji ni izgrađena pješačka staza. Lokacija gdje je škola trenutačno smještena naziva se "trokut" jer je sa sve tri strane omeđena cestom što je rezultiralo višestrukim prometnim nesrećama u okolici škole u posljednjih nekoliko godina. Osim toga zbog neadekvatnosti zgrade u kojoj se škola nalazi, prostori su energetske neučinkoviti te kao takvi predstavljaju dodatni teret za javni proračun.</p> <p>Projekt Izgradnja nove Ekonomske škole Vukovar, odnosi se upravo na unaprjeđenje obrazovanja kroz neophodno poboljšanje materijalnih uvjeta srednje strukovne škole, a konkretno podrazumijeva izgradnju nove, moderne i energetske učinkovite školske zgrade s pripadajućom sportskom dvoranom. Nova lokacija škole, predviđena urbanističkim planom, nalazi se u blizini autobusnog kolodvora u Vukovaru te je van glavnih velikih prometnih pravaca što je i primjereno jednoj obrazovnoj ustanovi.</p> <p>Osnovni strateški cilj škole je ići u korak s promjenama i unaprijediti dimenziju obrazovanja, poboljšati kvalitetu edukacije, bolje se povezati s europskim tržištem rada, te nastavnicima i učenicima pružiti kvalitetnu podršku za učenje, život i rad u internacionalnom okruženju što je moguće ostvariti samo uz osiguranje odgovarajućih materijalnih (infrastrukturnih) uvjeta. Na ovaj će se način stvoriti educirani mladi ljudi spremni da već nakon srednjoškolskog obrazovanja mogu preuzeti poslove na tržištu rada ili nastaviti obrazovanje na visoko obrazovnim ustanovama, a sve kako bi unaprijedili stručnost i kvalitetu života u lokalnoj zajednici. S obzirom da živimo u specifičnom europskom društveno-kulturnom kontekstu, u kojem se tržište rada neprestano mijenja, a materijalni uvjeti ne omogućuju praćenje</p>

nastavnog programa, kao ni promjena i potreba tržišta rada, potrebe za adekvatnim i suvremenim materijalnim uvjetima, te metodama učenja i poučavanja su velike.

Upravo zato, izgradnja nove škole omogućit će stvaranje vodeće strukovne škole u regiji koja pruža obrazovanje za uspješno poduzetništvo i daljnje školovanje kroz razvoj temeljnih vrijednosti znanja, odgovornosti, etičnosti i suvremenosti.

Osim toga, izgradnjom nove škole, u novim i modernim prostorima otvara se i mogućnost obrazovanja odraslih u poslijepodnevnim satima, kao i mnogim drugim aktivnostima koje imaju za cilj edukaciju i obrazovanje te pripremu stanovništva za tržište rada. Osim za školske potrebe, školska sportska dvorana će koristiti i brojnim sportskim i sportsko-rekreativnim udrugama koje će provoditi svoje aktivnosti u sportskoj školskoj dvorani, kao i za mnoge kulturne manifestacije koje će se tako moći provoditi na područja grada Vukovara. Na taj način se pridonosi široj društvenoj koristi jer pristup obrazovanju, znanstvena djelatnost, kulturna ponuda, raspoloživost športskih i drugih sadržaja u slobodno vrijeme značajno doprinose kvaliteti života i rada u gradu te su neki od važnih motiva za povratak ili ostanak u gradu, posebice mladih ljudi i obitelji s djecom.

Projekt tako doprinosi ne samo fizičkoj već i gospodarskoj i društvenoj regeneraciji grada Vukovara.

Realizacija projekta izgradnje ekonomske škole imat će značajan utjecaj na fizičku, društvenu, ali i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara – izgradnja nove škole i sportske dvorane kako bi se zadovoljile obrazovne i ostale društvene potrebe građana, stvaranje temelja za pružanje kvalitetnog obrazovanja i sportskih događanja što će doprinijeti društvenom, ali i gospodarskom rastu plasiranjem obrazovanog mladog kadra spremnog za izazove tržišta rada.

Osim toga izgradnjom nove škole riješila bi se izuzetno složena imovinsko-pravna situacija s obzirom da Ekonomska škola Vukovar kojoj je osnivač županija, trenutno djeluje u gradskom prostoru bivše osnovne škole, a vlasnik je zgrade Veleučilišta Lavoslav Ružička.

Projekt doprinosi realizaciji ciljeva sljedećih strateških dokumenata:


1. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije: SC 2. *Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta za upravljanje razvojem* - prioritet 2.1 Razvoj sustava obrazovanja i njegova prilagodba potrebama razvoja; SC 3. *Kvalitetno prostorno planiranje, moderna infrastruktura i očuvani okoliš* – prioritet 3.4 Ulaganja u obnovljive izvore energije i učinkovito korištenje energije

2. Strategija Vukovar 2020: SC 1. *Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara* – prioritet 1.2 Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova; SC 2. *Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara* – prioritet 2.1 Postignuta viša razina standarda

	<p>opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova, 2.3 Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru</p> <p>3. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije: cilj 7 Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova; cilj 1 Osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja</p> <p>4. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.): prioriteti - Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu i Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	<p>1 EP Infrastrukturni radovi</p> <p>1.1 Raspisivanje javne nabave za radove</p> <p>1.2 Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor</p> <p>1.3 Provedba ugovora o gradnji</p> <p>1.4 Provedba građevinskog nadzora nad izvođenjem radova</p> <p>EP 2 Opremanje</p> <p>2.1. Raspisivanje javnih nabava za opremanje prostora</p> <p>2.2. Opremanje prostora škole i sportske dvorane</p> <p>EP 3 Promidžba i vidljivost</p> <p>3.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Vukovara i Ekonomska škole, info o novoj sportskoj infrastrukturi za učenike, ali i stanovnike u medijima</p> <p>EP 4 Upravljanje i administracija</p> <p>4.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>4.2. Izvještavanje</p> <p>4.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>4.4. Financijska revizija projekta</p>
Ključni rezultati:	<p>R1: Izgrađena nova, moderna i energetski učinkovita škola i sportska dvorana</p> <p>R2: Osigurani infrastrukturni uvjeti za održavanje programa za obrazovanje odraslih</p> <p>R3: Osigurani infrastrukturni uvjeti za bavljenje sportom lokalnog stanovništva</p>
Pokazatelji:	<p>EFRR POKAZATELJ NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1</p>

	<p>POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA:</p> <p>Broj izgrađenih/obnovljenih obrazovnih objekata u kojima se provode obrazovni programi: 1</p>
<p>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</p>	<p>Projektни tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelj/ica projekta - 100%, VURA 2. Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) 50% – Grad Vukovar 3. Stručni suradnik za građevinske radove – 10%, Grad Vukovar 4. Stručni suradnik za elektro radove – 10%, Grad Vukovar 5. Stručni suradnik za strojarske radove – 10%, Grad Vukovar 6. Projektни asistent/ica 100% – VURA 7. Financijsko-računovodstveni referent/ica 20% – Grad Vukovar 8. Stručnjak/inja za javnu nabavu 20% – Grad Vukovar
<p>Trajanje:</p>	<p>Projekt će trajati 48 mjeseci.</p> <p>Raspisivanje javnog arhitektonskog natječaja (budući je riječ o zgradi javne namjene), izrada tehničke dokumentacije i ishodenje dozvola procjenjuje se na 18 mjeseci. Odabira izvođača i izvođenja radova procjenjuje se na 30 mjeseci.</p>
<p>Održivost:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socijalno/demografska održivost: Projektom će se doprinijeti unaprjeđenju obrazovnog sustava u gradu Vukovaru što će rezultirati većim brojem obrazovanih i kvalificiranih osoba koje će biti konkurentnije na tržištu rada, a ponudom dodatnog sadržaja (sportska dvorana) osigurat će se društveni sadržaj za građane grada koji će doprinijeti kvaliteti života. Na taj će se način posredno utjecati na stabilizaciju postojećeg broja stanovnika kroz osiguranje boljih uvjeta obrazovanja i života mladih općenito. 2. Financijska i upravljačka održivost: Financijska održivost će se procijeniti prema CBA. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužena Vukovarsko-srijemska županija koja će za to osigurati sredstva u proračunu. Nova zgrada će ujedno biti i energetska učinkovitija te će se trošiti manje energenata što će smanjiti rashode škole. K tome, novi prostori škole kao i dvorana moći će se koristiti u popodnevnim/večernjim satima i vikendom dati u zakup iz čega će se ostvariti financijski prihodi koji će se moći upotrijebiti za unaprjeđenje kvalitete (nova oprema, održavanje zgrade i sl.). 3. Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije.

Terminski plan provedbe projekta	Terminski plan provedbe projekta	2017		2018				2019				2020				2021	
		QIV	QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	
		1. Izrada projektne dokumentacije															
Arhitektonsko rješenje	x	x	x														
Izvedbeno rješenje			x	x													
Glavni projekt				x	x	x											
Projekt opremanja					x	x											
2. Ishođenje dozvola																	
3. Priprema projektne prijave																	
4. Razvoj infrastrukture								x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5. Opremanje															x	x	
6. Promidžba i vidljivost								x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7. Upravljanje projektom								x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja																	

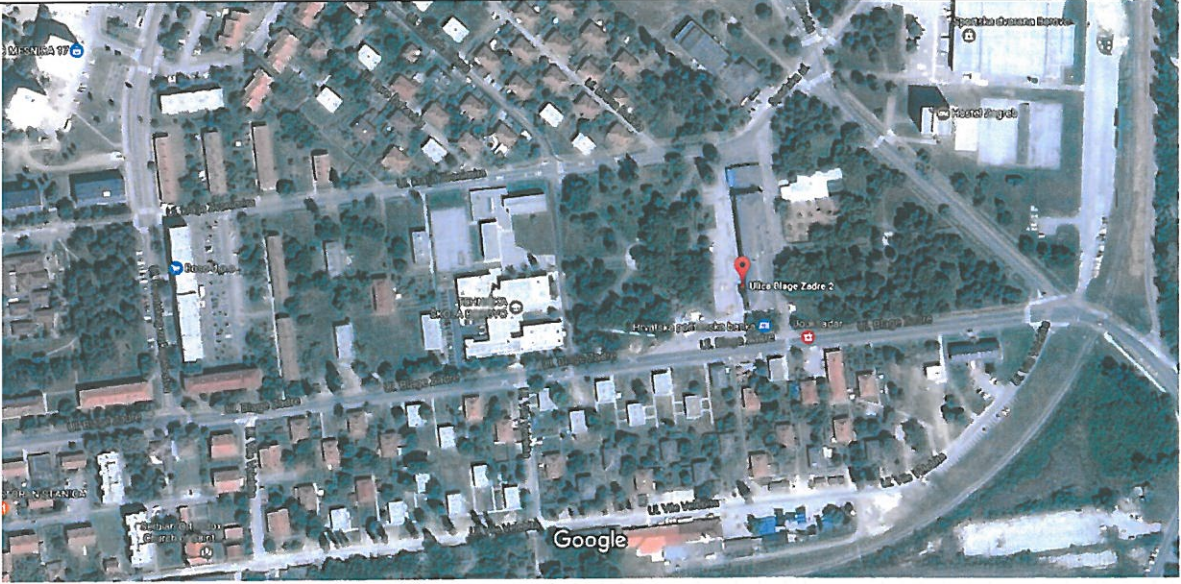NAZIV PROJEKTA	Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar
ŠIFRA PROJEKTA	1RP3
Lokacija projekta⁹	
Vrsta projekta:	Glavni
Razvojni prioritet:	1RP Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje
Opći cilj:	Društveni: Izgrađenom društvenom infrastrukturuom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.
Specifični cilj:	Rekonstrukcijom zgrade Radničkog doma stvoriti uvjete za preseljenje Veleučilišta Vukovar na prostor budućeg studentskog grada i stvaranje uvjeta za pokretanje novih studijskih programa koji će privući nove studente i osigurati konkurentnost na tržištu rada, ali i neposredno omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

⁹ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Planska domena:	Društvene djelatnosti Industrija i poduzetničko okruženje (gospodarstvo)
Vrijednost:	40.000.000,00 kn od čega troškovi dokumentacije: 2.200.000,00 kn
Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15%
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Od završetka Domovinskog rata u kojem je Vukovar pretrpio goleme štete proveden je veći broj projekata. Značajnu ulogu u procesu obnove i razvoja grada nakon Domovinskog rata ima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine temeljem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojenog 2001. godine. Uloga Fonda naglašena je kroz intenziviranje društvenog i ekonomskog oživljavanja grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i javne infrastrukture. Osim putem Fonda, značajan broj projekata kako infrastrukturnih, tako i ostalih, u različitim sektorima sufinanciran je sredstvima EU. Neki od značajnijih projekata, prema sektorima, su:</p> <p><i>Gospodarstvo/poduzetništvo:</i></p> <p>1) Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar u 3 faze</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara) - EU projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti 909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Drugom fazom je obuhvaćeno kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora. - EU projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“, vrijednost: 21.293.090,71 kn. Ovom fazom obuhvaćeno je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m²) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. <p>2) “New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar” , IPA IV, 115.139,34 €, koji je za cilj imao unaprjeđenje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije putem jačanja kapaciteta partnera.</p> <p>3) Strateški partner u SEE projektu DaHar, čiji je cilj bio razvoj strategija za razvoj luka na Dunavu.</p> <p><i>Turizam:</i></p> <p>4) Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" – Vukovar (IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost; 781.777,50 €), koji je za cilj imao razvoj i poboljšanje turističke infrastrukture i stvaranje ekonomske aktivnosti oko novog turističkog proizvoda</p> <p>5) Projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“, nositelj TZ Grada Vukovara, ukupna vrijednost projekta: 378.003,86 EUR od čega za TZ Grada Vukovara 178.723,39 EUR.</p>

	<p><i>Energetska učinkovitost:</i></p> <p>6) Nearly Zero-Energy Sports Facilities (n0e-sport) – partneri na projektu financiranom putem IEE. Pilot projekt kojim se izrađuje analiza i plan smanjenje potrošnje energije u sportskim objektima te pilot implementacija na zgradi HNK Vukovar</p> <p><i>Civilno društvo:</i></p> <p>7) "Ujedinjeni u jednu uniju", projekt financiran iz programa Europa za građane čiji je cilj bio predstavljanje EU i njene podrške i značaja sudjelovanja građanstva uključenih u procese odlučivanja kroz susrete bratimljenih gradova iz 5 zemalja.</p>
Partneri:	Veleučilište Lavoslava Ružičke Vukovar
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<p>Ciljane skupine:</p> <p>Nastavno i nenastavno osoblje veleučilišta kojima će se omogućiti bolji uvjeti za rad.</p> <p>Studenti kojima će se omogućiti bolji uvjeti za studiranje.</p> <p>Krajnji korisnici:</p> <p>Osoblje veleučilišta, studenti, poduzetnici (studentski restoran, kafić, kopiraona i sl. sadržaji).</p>
Zrelost projekta¹⁰:	za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više do 6 mjeseci
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabava i izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju 2. idejni projekt 3. glavni projekt 4. izvedbeni projekt 5. projekt opremanja 6. Ishođenje dozvola 7. Priprema projektne prijave <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Izrada studije izvedivosti (CBA) 7.2. Priprema prijavnih obrazaca 8. Rekonstrukcija zgrade Radničkog doma 9. Opremanje prostora veleučilišta, restorana, i dr. 10. Javni natječaj za zakup komercijalnog dijela prostora (kafić i dr.)
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Obrazloženje projekta	Djelatnost visokoškolskog obrazovanja na području Vukovara provodi se na Veleučilištu Lavoslav Ružička. Veleučilište je osnovano 2005. godine, a trenutno se provode 3 studijska programa: studij trgovine, fizioterapeutske te upravni studij. U akademskoj je godini 2014./2015. upisano sveukupno 877 studenata, što

¹⁰ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

u odnosu na prethodnu akademsku godinu, kada je bio upisan 941 student, predstavlja pad od 6,8%. Riječ je o značajnom smanjenju broja upisanih studenata u odnosu na promatrani trend posljednjih 5 godina koji na godišnjoj razini bilježi negativnu prosječnu stopu promjene od 1%. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru trenutno svoju djelatnost obavlja u unajmljenoj zgradi u Vukovaru, Županijska 50, koja udovoljava potrebama održavanja nastave i administrativnih djelatnosti veleučilišta, ali nema uvjete za planirano proširenje studijskih programa kao ni popratnog sadržaja poput parkirališta, studentskog doma, studentskog restorana i dr.

Grad Vukovar stipendijama potiče visokoškolsko obrazovanje svojih građana no velik broj mladih na studij odlazi u druge gradove gdje postoji veća ponuda studijskih programa. Proširenjem programa i kapaciteta Veleučilišta omogućio bi se ostanak većeg broja mladih u gradu Vukovaru, privukli bi se i novi studenti iz drugih krajeva Hrvatske te bi se otvorila nova radna mjesta u visokom obrazovanju. Sukladno tom cilju, Grad Vukovar planira Borovo naselje pretvoriti u studentski grad s dostatnim obrazovnim, sportskim i ostalim popratnim sadržajima za mlade.

Zgrada Radničkog doma u Borovo Naselju, sa 7748 m² bruto površine na 4 etaže, nakon ratnih razaranja samo je parcijalno popravljana i kao takva služila je za privremeni smještaj tijela državne uprave te drugih tijela javne vlasti, a sada je većim dijelom izvan funkcije. Njenom obnovom i rekonstrukcijom trajno i kvalitetno bi se riješio prostor za rad Veleučilišta Lavoslav Ružička, budući u istoj postoji prostor pogodan za smještaj Veleučilišta, studentski restoran i druge potrebne sadržaje, a uz zgradu je i odgovarajuće javno parkiralište. Preseljenjem Veleučilišta u nove prostore omogućilo bi se proširenje programa Veleučilišta te upis većeg broja studenata, a samo Veleučilište (moderni prostori, omogućen smještaj, restoran i novi studijski programi) bilo bi znatno privlačnije studentima što bi rezultiralo ostankom mladih u Vukovaru, pa čak i dolaskom novih studenata u grad. Osim toga potaknula bi se i nova zapošljavanja/samozapošljavanja, što u visokom obrazovanju na novim studijskim programima, što u novim popratnim studentskim sadržajima kao što su studentski restoran, kafići, kopiraone i sl. koje će biti u sklopu zgrade. Na taj način, projekt doprinosi fizičkoj, ali i društvenoj te gospodarskoj regeneraciji grada Vukovara.

Ako uzmemo u obzir činjenicu da je obrazovna struktura stanovništva najviše povezana i sa uspješnim ulaskom na tržište rada, odnosno s razinom konkurentnosti radne snage koja se nudi na predmetnom području, ali i samom konkurentnosti gospodarstva određenog područja od velike je važnosti osigurati kvalitetne visokoobrazovne programe i popratne sadržaje kako bi se čim veći broj mladih obrazovao i tako doprinio razvoju gospodarstva područja po ulasku na tržište rada. Analiza strukture radno sposobnog stanovništva (od 15 do 64 godine) ukazuje na to da na vukovarskom području svega 15,8% radnog kontingenta čine visokoobrazovane osobe što potvrđuje potrebu za modernom i kvalitetnom ponudom programa i sadržaja vezanih za visoko obrazovanje što je moguće ostvariti samo uz osigurane odgovarajuće materijalne (infrastrukturne) uvjete.


Pristup obrazovanju, znanstvena djelatnost, kulturna ponuda, raspoloživost športskih i drugih sadržaja u slobodno vrijeme značajno doprinose kvaliteti života i rada u gradu te su neki od važnih motiva za povratak ili ostanak u gradu, posebice mladih ljudi i obitelji s djecom.

Realizacija projekta parking rekonstrukcije Radničkog doma imat će tako značajan utjecaj na fizičku, društvenu, ali i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara – obnovom zgrade radničkog doma u funkciju

	<p>staviti zgradu kulturne baštine, otvaranjem komercijalnih sadržaja u sklopu Veleučilišta (kafić, restoran, kopiraona i sl.) direktno doprinijeti zapošljavanju, preseljenjem Veleučilišta u nove prostore osigurati bolje uvjete za obrazovanje i proširiti obrazovnu ponudu Veleučilišta.</p> <p>Projekt doprinosi realizaciji ciljeva sljedećih strateških dokumenata:</p> <p>1. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije: SC 2. <i>Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta za upravljanje razvojem</i> - prioritet 2.1 Razvoj sustava obrazovanja i njegova prilagodba potrebama razvoja, 2.3 Unapređenje upravljanja razvojem; SC 3. <i>Kvalitetno prostorno planiranje, moderna infrastruktura i očuvani okoliš</i> – prioritet 3.4 Ulaganja u obnovljive izvore energije i učinkovito korištenje energije; SC 4. <i>Unapređenje kvalitete života</i> – prioritet 4.3 Razvoj i unapređenje kulture te očuvanje kulturne baštine,</p> <p>2. Strategija Vukovar 2020: SC 1. <i>Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara</i> – prioritet 1.2 Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova; SC 2. <i>Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara</i> – prioritet 2.1 Postignuta viša razina standarda opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova, 2.3 Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru</p> <p>3. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije: cilj 5 Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko komunikacijske resurse visokih učilišta; cilj 6 Unaprijediti studentski standard uz posebnu skrb za socijalnu dimenziju studiranja</p> <p>4. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.): prioriteti - Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu i Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba</p>
<p>Aktivnosti grupirane po EP:</p>	<p>EP 1 Infrastrukturni radovi (sanacija i rekonstrukcija)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije zgrade 1.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad radovima 1.3. Provedba ugovora o gradnji 1.4. Provedba građevinskog nadzora nad izvođenjem radova 1.5. Ugovaranje konzervatorskog nadzora <p>EP 2 Opremanje prostora</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Raspisivanje javne nabave za opremanje prostora Veleučilišta 2.2. Opremanje prostora (kabineti, učionice, restoran)

	<p>EP 3 Odabir popratnih sadržaja Veleučilišta</p> <p>3.1. Raspisivanje javnog natječaja za studentski restoran, kafić, kopiraonu i dr. sadržaje</p> <p>EP 4 Promidžba i vidljivost</p> <p>4.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Vukovara</p> <p>4.2. Priprema letaka i materijala za buduće studente</p> <p>4.3. Ažuriranje/izrada nove stranice Veleučilišta</p> <p>EP 5 Upravljanje i administracija</p> <p>5.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>5.2. Izvještavanje</p> <p>5.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>5.4. Financijska revizija projekta</p>
Ključni rezultati:	<p>R1 Zgrada Radničkog doma stavljena u funkciju Veleučilišta</p> <p>R2 Stvoreni preduvjeti za proširenje programa Veleučilišta i upis većeg broja studenata</p> <p>R3 Ostvareni preduvjeti za nova zapošljavanja (odabir zakupaca za studentski restoran, kafić, kopiraonu i dr.)</p>
Pokazatelji:	<p>EFRR POKAZATELJ NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1</p> <p>POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA:</p> <p>Broj izgrađenih/obnovljenih obrazovnih objekata u kojima se provode obrazovni programi: 1 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1</p>
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelj/ica projekta - 100%, VURA 2. Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) 50% – Grad Vukovar 3. Stručni suradnik za građevinske radove – 10%, Grad Vukovar 4. Stručni suradnik za elektro radove – 10%, Grad Vukovar 5. Stručni suradnik za strojarske radove – 10%, Grad Vukovar 6. Projektni asistent/ica 100%– Grad Vukovar 7. Financijsko-računovodstveni referent/ica 20%– Grad Vukovar 8. Stručnjak/inja za javnu nabavu 20% – Grad Vukovar

Trajanje:	<p>Projekt će trajati 33 mjeseca.</p> <p>Za izradu dokumentacije potrebno je 9 mjeseci (uključujući i prikupljanje potrebnih suglasnosti i posebnih uvjeta), a izvođenje radova (uključujući i postupak odabira izvođača) 24 mjeseca.</p>												
Održivost:	<ol style="list-style-type: none"> Socijalno/demografska održivost: Projektom bi se posredno moglo utjecati na stabilizaciju postojećeg broja stanovnika kroz osiguranje boljih uvjeta obrazovanja i života mladih općenito Financijska i upravljačka održivost: Financijska održivost procijenit će se prema CBA. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, bit zaduženo Veleučilište (upravljat će zgradom u dijelu koji će koristiti) te će za to osigurati sredstva u proračunu. Prostorije za komercijalne svrhe (kafić, kopiraona i dr.) davat će se u zakup po tržišnim cijenama i njima će upravljati Grad. Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije koliko će to biti moguće s obzirom da se radi o rekonstrukciji zgrade koja je zaštićeno kulturno dobro. 												
Terminski plan provedbe projekta	<p>Terminski plan provedbe projekta</p>	2018				2019				2020			
		QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV
	1. Izrada projektne dokumentacije		x	x	x								
	Idejno rješenje		x										
	Glavni projekt		x	x									
	Izvedbeni projekt				x								
	Projekt opremanja				x								
	2. Ishođenje dozvola			x	x								
	3. Priprema projektne prijave				x								
	4. Razvoj infrastrukture					x	x	x	x	x	x	x	
	5. Opremanje										x	x	x
	6. Odabir popratnih sadržaja											x	x
	7. Promidžba i vidljivost					x	x	x	x	x	x	x	x
	8. Upravljanje projektom					x	x	x	x	x	x	x	x
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja													

NAZIV PROJEKTA	Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima
ŠIFRA PROJEKTA	2RP2
Lokacija projekta¹¹	Ulica Kardinala Alojzija Stepinca 46, 32000 Vukovar 
Vrsta projekta:	komplementarni
Razvojni prioritet:	2RP: Izgradnja uređenje i revitalizacija površina i prostora javne namjene uključujući sportsku infrastrukturu
Opći cilj:	Društveni: <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturuom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p> Prostorni: <p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p>
Specifični cilj:	Opremanjem centralne kuhinje osigurati siguran i zdrav topli obrok za djecu u vrtićima
Planska domena:	Društvene djelatnosti

¹¹ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Vrijednost:	300.000,00 kn
Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15%
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Od završetka Domovinskog rata u kojem je Vukovar pretrpio goleme štete proveden je veći broj projekata. Značajnu ulogu u procesu obnove i razvoja grada nakon Domovinskog rata ima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine temeljem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojenog 2001. godine. Uloga Fonda naglašena je kroz intenziviranje društvenog i ekonomskog oživljavanja grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i javne infrastrukture. Osim putem Fonda, značajan broj projekata kako infrastrukturnih, tako i ostalih, u različitim sektorima sufinanciran je sredstvima EU. Neki od značajnijih projekata, prema sektorima, su:</p> <p><i>Gospodarstvo/poduzetništvo:</i></p> <p>1) Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar u 3 faze</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara) - EU projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti 909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Drugom fazom je obuhvaćeno kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora. - EU projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“, vrijednost: 21.293.090,71 kn. Ovom fazom obuhvaćeno je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m2) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. <p>2) “New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar” , IPA IV, 115.139,34 €, koji je za cilj imao unaprjeđenje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije putem jačanja kapaciteta partnera.</p> <p>3) Strateški partner u SEE projektu DaHar, čiji je cilj bio razvoj strategija za razvoj luka na Dunavu.</p> <p><i>Turizam:</i></p> <p>4) Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" – Vukovar (IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost; 781.777,50 €), koji je za cilj imao razvoj i</p>

	<p>poboljšanje turističke infrastrukture i stvaranje ekonomske aktivnosti oko novog turističkog proizvoda</p> <p>5) Projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“, nositelj TZ Grada Vukovara, ukupna vrijednost projekta: 378.003,86 EUR od čega za TZ Grada Vukovara 178.723,39 EUR.</p> <p><i>Energetska učinkovitost:</i></p> <p>6) Nearly Zero-Energy Sports Facilities (n0e-sport) – partneri na projektu financiranom putem IEE. Pilot projekt kojim se izrađuje analiza i plan smanjenje potrošnje energije u sportskim objektima te pilot implementacija na zgradi HNK Vukovar</p> <p><i>Civilno društvo:</i></p> <p>7) "Ujedinjeni u jednu uniju", projekt financiran iz programa Europa za građane čiji je cilj bio predstavljanje EU i njene podrške i značaja sudjelovanja građanstva uključenih u procese odlučivanja kroz susrete bratimljenih gradova iz 5 zemalja.</p>
Partneri:	Dječji vrtić Vukovar 1
Ciljane skupine / krajnji korisnici	Ciljane skupine / Krajnji korisnici: Djeca DV Vukovar I i Vukovar II (670 djece)
Zrelost projekta¹²:	Nije primjenjivo *Radi se o kupnji opreme za kuhinju, nabavi vozila i uređenja prostorija pa tehnička dokumentacija nije potrebna
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprema projektne prijave 2. Nabava i izvođenje radova za unutarnje uređenje prostora kuhinje (krečenje, postavljanje pločica) 3. Nabava kuhinjske opreme 4. Nabava dostavnog vozila
Provedbeni mehanizam:	- Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Obrazloženje projekta	DV Vukovar I i DV Vukovar II koriste zajedničku kuhinju za pripremu 1300 obroka dnevno. DV 1 i DV 2 rade na 5 lokacija u gradu Vukovaru (Mitnica, Borovo naselje, sajmište, Sotin i centar). Centralna kuhinja nalazi se u sklopu DV 1 te je od tamo potrebno dostavljati obroke za djecu u ostalim objektima vrtića. Rad u kuhinji se odvija u veoma teškim uvjetima jer je sav inventar dotrajavao i stalno se kvari. S

¹² Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

obzirom da kvaliteta hrane koja se poslužuje djeci ne smije biti upitna, kuhinju je potrebno opremiti adekvatnim uređajima ne bi li se osigurala brža i sigurna priprema, ali i dostava obroka. Trenutna dostava obavlja se u dotrajalom vozilu koje je potrebno zamijeniti novim.

Kroz ovaj projekt grad Vukovar planira riješiti oba identificirana problema. Uređenjem i osiguravanjem potrebnih uvjeta centralne kuhinje grad će riješiti problem pripreme obroka za djecu DV Vukovar 1 i 2, a nabavom dostavnog vozila osigurati i kvalitetniju i bržu dostavu.

Kroz projekt planira se urediti prostorija centralne kuhinje (krečenje, obnavljanje pločica), nabaviti dostavno vozilo za dostavu hrane kao i nabaviti potrebnu kuhinjsku opremu koja podrazumijeva: profesionalni multipraktik; profesionalni štapni mikser; profesionalna gulilica krumpira (mogućnost guljenja cca 20kg krumpira odjednom); električna konvekciona pečenjara s postoljem i omekšivačem za vodu (mogućnost pečenja 16 tepsija odjednom); kiper plinski (80l); profesionalna friteza sa 2 rupe (2x12l); lonci sa poklopcem 30l (4kom); lonci sa poklopcem 70l (4kom-rostfraj);

Na taj način, podigla bi se kvaliteta kvalitete prehrane djece u vrtićima, kao i uvjeti rada u kuhinji.

Projekt doprinosi fizičkoj, društvenoj i gospodarskoj regeneraciji grada Vukovara – obnovom kuhinje ostvaruju se uvjeti za pripremu obroka za dječje vrtiće u gradu Vukovaru, unaprjeđuje se kvaliteta života građana, osobito onih najmlađih, a samim time osigurava se kvalitetnija usluga građanima Vukovara koji plaćaju vrtić. Obnovom kuhinje doprinosi se i mogućnosti novog zapošljavanja te poticanja gospodarske regeneracije grada.

Projekt doprinosi realizaciji ciljeva sljedećih strateških dokumenata:


1. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije: SC 4. Unapređenje kvalitete života - prioritet 4.2 Poboljšanje kvalitete života i razvoj socijalnih usluga

2. Strategija Vukovar 2020: SC 2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara – prioritet 2.1 Postignuta viša razina standarda opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova SC 4. *Sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice* – prioritet 4.2 Kvalitetna socijalna skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove

3. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.): prioriteti - Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu i Osiguravanje uvjeta za

	sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba
Aktivnosti grupirane po EP:	<p>EP 1 Soboslikarski/keramički radovi</p> <p>1.1. Raspisivanje javne nabave za radove</p> <p>1.2. Provedba ugovora o radovima</p> <p>EP 2 Opremanje</p> <p>2.1. Raspisivanje javne nabave za kupnju opreme za kuhinju i nabavu vozila</p> <p>2.2. Opremanje kuhinje</p> <p>2.3. Nabava vozila</p> <p>EP 3 Promidžba i vidljivost</p> <p>3.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Vukovara i dječjih vrtića</p> <p>EP 4 Upravljanje i administracija</p> <p>4.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>4.2. Izvještavanje</p> <p>4.3. Financijsko upravljanje projektom</p>
Ključni rezultati:	<p>R1: Opremljena kuhinja za potrebe dječjih vrtića</p> <p>R2: Osigurana dostava obroka za sve vrtiće</p>
Pokazatelji:	<p>EFRR POKAZATELJ NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1</p>
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelj/ica projekta – 40%, Grad Vukovar 2. Projektni asistent/ica – 50%, Grad Vukovar 3. Financijsko-računovodstveni referent/ica – 10%, Grad Vukovar 4. Stručnjak/inja za javnu nabavu – 10% Grad Vukovar

Trajanje:	Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci.																																		
Održivost:	<ol style="list-style-type: none"> Socijalno/demografska održivost: Projektom će se doprinijeti unaprjeđenju obrazovno-odgojnog sustava te socijalnog zbrinjavanja u gradu Vukovaru čime će se osigurati veća kvaliteta života. Na taj će se način posredno utjecati na stabilizaciju postojećeg broja stanovnika kroz osiguranje boljih uvjeta za život. Financijska i upravljačka održivost: Po provedbi projekta upravljanje nabavljenom opremom i vozilom prebacit će se na DV1 koji će u svom proračunu osigurati sredstva za održavanje opreme i vozila. Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. 																																		
Terminski plan provedbe projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Terminski plan provedbe projekta</th> <th colspan="4">2017</th> </tr> <tr> <th>QI</th> <th>QII</th> <th>QIII</th> <th>QIV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Priprema projektne prijave</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Radovi i opremanje kuhinje</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>3. Nabava vozila</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>4. Promidžba i vidljivost</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>5. Upravljanje projektom</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Terminski plan provedbe projekta	2017				QI	QII	QIII	QIV	1. Priprema projektne prijave		x			2. Radovi i opremanje kuhinje			x	x	3. Nabava vozila			x	x	4. Promidžba i vidljivost			x	x	5. Upravljanje projektom			x	x
Terminski plan provedbe projekta	2017																																		
	QI	QII	QIII	QIV																															
1. Priprema projektne prijave		x																																	
2. Radovi i opremanje kuhinje			x	x																															
3. Nabava vozila			x	x																															
4. Promidžba i vidljivost			x	x																															
5. Upravljanje projektom			x	x																															
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja																																			

NAZIV PROJEKTA	Obnova nogometnog stadiona u Vukovaru
ŠIFRA PROJEKTA	2RP1
Lokacija projekta¹³	<p>Nogometni stadion, 204. vukovarske brigade na k.č. 1575 u k.o. Vukovar.</p> 
Vrsta projekta:	Komplementarni
Razvojni prioritet:	2RP Izgradnja, uređenje i revitalizacija površina i prostora javne namjene uključujući sportsku infrastrukturu
Opći cilj:	<p>Prostorni:</p> <p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p> <p>Društveni:</p> <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturuom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p>

¹³ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Specifični cilj:	Obnovom stadiona omogućiti građanima Vukovara, i šire, mjesto za sportska druženja i aktivan život te promovirati Vukovar kao turističku destinaciju za sport i rekreaciju
Planska domena:	Društvene djelatnosti Kultura i turizam
Vrijednost:	4.000.000,00 kn od čega troškovi dokumentacije: 400.000,00 kn
Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15% (Grad Vukovar)
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Od završetka Domovinskog rata u kojem je Vukovar pretrpio goleme štete proveden je veći broj projekata. Značajnu ulogu u procesu obnove i razvoja grada nakon Domovinskog rata ima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine temeljem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojenog 2001. godine. Uloga Fonda naglašena je kroz intenziviranje društvenog i ekonomskog oživljavanja grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i javne infrastrukture. Osim putem Fonda, značajan broj projekata kako infrastrukturnih, tako i ostalih, u različitim sektorima sufinanciran je sredstvima EU. Neki od značajnijih projekata, prema sektorima, su:</p> <p><i>Gospodarstvo/poduzetništvo:</i></p> <p>1) Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar u 3 faze</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara) - EU projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti 909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Drugom fazom je obuhvaćeno kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora. - EU projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“, vrijednost: 21.293.090,71 kn. Ovom fazom obuhvaćeno je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m²) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. <p>2) “New MAP – Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar” , IPA IV, 115.139,34 €, koji je za cilj imao unaprjeđenje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije putem jačanja kapaciteta partnera.</p>

	<p>3) Strateški partner u SEE projektu DaHar, čiji je cilj bio razvoj strategija za razvoj luka na Dunavu.</p> <p><i>Turizam:</i></p> <p>4) Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" – Vukovar (IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost; 781.777,50 €), koji je za cilj imao razvoj i poboljšanje turističke infrastrukture i stvaranje ekonomske aktivnosti oko novog turističkog proizvoda</p> <p>5) Projekt „Formiranje centra za unaprjeđenje znanja u ruralnom turizmu“, nositelj TZ grada Vukovara, ukupna vrijednost projekta: 378.003,86 EUR od čega za TZ grada Vukovara 178.723,39 EUR.</p> <p><i>Energetska učinkovitost:</i></p> <p>6) Nearly Zero-Energy Sports Facilities (n0e-sport) – partneri na projektu financiranom putem IEE. Pilot projekt kojim se izrađuje analiza i plan smanjenje potrošnje energije u sportskim objektima te pilot implementacija na zgradi HNK Vukovar</p> <p><i>Civilno društvo:</i></p> <p>7) "Ujedinjeni u jednu uniju", projekt financiran iz programa Europa za građane čiji je cilj bio predstavljanje EU i njene podrške i značaja sudjelovanja građanstva uključenih u procese odlučivanja kroz susrete bratimljenih gradova iz 5 zemalja.</p>
Partneri:	/
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<p>Ciljane skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 osnovnih i 4 srednje škole, Veleučilište Lavoslav Ružička, sportski klubovi i udruge iz Vukovara, Turistička zajednica grada Vukovara - obrti i ugostitelji tj. svi oni koji mogu pružati dodatne usluge u sklopu novog objekta <p>Krajnji korisnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - učenici osnovnih i srednjih škola - građani Vukovara, kroz rekreaciju i obrazovne programe, kroz komercijalne programe organizacije slobodnog vremena - osobe s poteškoćama u razvoju i invalidi Domovinskog rata i civilni invalidi - športski klubovi iz države i inozemstva
Zrelost projekta¹⁴:	za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci

¹⁴ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	*Nema dokumentacije
Investicijski ciklus projekta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabava i izrada tehničke dokumentacije <ul style="list-style-type: none"> - idejno rješenje - glavni projekt 2. Ishođenje dozvola 3. Priprema projektne prijave <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Izrada studije izvedivosti (CBA) 3.2. Priprema projektnih obrazaca 4. Raspisivanje nabave za radove i obnova stadiona 5. Raspisivanje nabave za opremanje i opremanje stadiona 6. Javni natječaj za zakup komercijalnog dijela prostora (kafić i dr.)
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Obrazloženje projekta	<p>Društvene djelatnosti imaju važnu ulogu za život stanovnika i u velikoj mjeri mogu utjecati na smanjenje depopulacije. U gradu Vukovaru postoje temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje, veliki broj aktivnih organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana. Ipak, uočavaju se slabosti određenih segmenata društvene infrastrukture, prije svega kroz nedovoljne i neadekvatne sportske objekte koji nisu energetske učinkoviti te predstavljaju veliki financijski teret za proračun Grada. Također se uočava nedostatak razvijenih sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih.</p> <p>Na to se veže i činjenica da današnji način života tjera ljude na lošu prehranu, a premalo je onih koji se uspiju oduprijeti, brinuti o zdravlju i biti aktivni, što dodatno opterećuje i javni zdravstveni sustav. Temeljem međunarodnih istraživanja Hrvati spadaju među najpretilije europske nacije, a svaki peti stanovnik ima previše kilograma i to je najveći javno zdravstveni problem.</p> <p>Kao jedno od rješenja ovih problema, grad Vukovar vidi u obnovi gradskog stadiona koji je nedovoljno održavan, nema svu potrebnu infrastrukturu ni kapaciteta za aktivnosti lokalnih škola i sportskih klubova i udruga te je energetske neučinkovit što predstavlja dodatni teret za gradski proračun.</p> <p>Obnovom stadiona želi se uključiti što veći broj građana, osobito djece i mladih, osoba s invaliditetom i osoba treće životne dobi u sport i sportsku rekreaciju te ulagati u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete vukovarskog sporta. Osim toga cilj je i promovirati sport u školama organizacijom sportskih natjecanja, liga, i dr. kako bi se sport snažnije inkorporirao u programe osnovnih škola. Na taj će način</p>

projekt znatno utjecati i na fizičko i psihičko zdravlje djece i odraslih te neposredno doprinijeti smanjenju troškova u zdravstvu.

Osim toga, novi, funkcionalni i atraktivni stadion omogućit će organizaciju brojnih događanja i na taj način proširiti i turističku ponudu grada Vukovara odnosno imat će značajan učinak na prezentaciju grada Vukovara kao turističke destinacije za sport i rekreaciju.

Kako bi se prostor stadiona čim efikasnije iskoristio napraviti će se i detaljni plan korištenja prostora i organizacije događanja i sportskih aktivnosti. Od planiranih aktivnosti na stadionu predviđeno je:

- nastava tjelesne i zdravstvene kulture – obvezna nastava za osnovne škole i srednje škole te za potrebe Veleučilišta

- dodatni sportsko-rekreacijski i turistički sadržaji i ponuda (organizacije natjecanja, koncerata i dr.)

Kako bi se omogućila dodatna održivost stadiona, omogućit će se zakup prostora za organizaciju događanja, ali će dio prostora biti predviđen i za pružatelje usluga (npr. ugostiteljski objekti – restoran i kafić)

Obnova gradskog stadiona tako će imati značajan utjecaj na fizičku, društvenu, ali i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara – obnovom stadiona osigurat će se atraktivna sportska infrastruktura koja će se koristiti za održavanje sportskih događanja, ali i sportsku rekreaciju građana te na taj način osigurati i turističku posjećenost sportskim događanjima, ali i olakšati pristup društvenim/sportskim sadržajima građanima Vukovara (tjelesni odgoj, sportski klubovi i sl.). Na stadionu će biti i komercijalni sadržaji kojima će se direktno pridonijeti novom zapošljavanju i poticanju gospodarstva.

Projekt doprinosi realizaciji ciljeva sljedećih strateških dokumenata:

1. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije: SC 1. *Konkurentno gospodarstvo* – prioritet 1.4 Razvoj turizma; SC 2. *Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta za upravljanje razvojem* - prioritet 2.4 Jačanje međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti županije; SC 3. *Kvalitetno prostorno planiranje, moderna infrastruktura i očuvani okoliš* – prioritet 3.4 Ulaganja u obnovljive izvore energije i učinkovito korištenje energije; SC 4. *Unapređenje kvalitete života* – prioritet 4.4 Unapređenje sportske infrastrukture i razvoj sportskih programa

2. Strategija Vukovar 2020: SC 2. *Izgrađenom društvenom infrastrukturuom ojačan društveni kapital grada Vukovara* – prioritet 2.3 Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru, 2.4 Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora;

	<p>3. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije: cilj 7 Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova;</p> <p>4. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.): prioriteti - Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu i Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba</p>
<p>Aktivnosti grupirane po EP:</p>	<p>EP 1 Infrastrukturni radovi (obnova)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova 1.2. Raspisivanje javne nabave za nadzor nad radovima 1.3. Provedba ugovora o gradnji 1.4. Provedba nadzora nad izvođenjem radova <p>EP 2 Opremanje stadiona</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Raspisivanje javnih nabava za opremanje prostora stadiona 2.2. Opremanje prostora stadiona <p>EP 3 Razrada sadržaja na stadionu</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Razrada detaljnog plana sadržaja/događanja na stadionu 3.2. Raspisivanje javnog natječaja za zakup komercijalnih prostora (restoran, kafić) <p>EP 4 Promidžba i vidljivost</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Promocija projekta –objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Vukovara i u lokalnim/nacionalnim medijima 4.2. Svečano obilježavanje otvorenja stadiona 4.3. Izrada/ažuriranje web stranice Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima <p>EP 5 Upravljanje i administracija</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Sastanci projektnog tima 5.2. Izvještavanje 5.3. Financijsko upravljanje projektom 5.4. Financijska revizija projekta

Ključni rezultati:	<p>R1: Obnovljen i funkcionalan stadion</p> <p>R2: Uspostavljen plan korištenja stadiona</p> <p>R3: Odabrani zakupci komercijalnih prostora</p>
Pokazatelji:	<p>EFRR POKAZATELJ NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (broj jedinica): 1</p> <p>POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA:</p> <p>Broj izgrađenih/obnovljenih obrazovnih objekata u kojima se provode sportske aktivnosti: 1</p>
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voditelj/ica projekta – 30%, Grad Vukovar 2. Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) – 20%, Grad Vukovar 3. Projektni asistent/ica – 40%, Grad Vukovar 4. Financijsko-računovodstveni referent/ica – 10%, Grad Vukovar 5. Stručnjak/inja za javnu nabavu – 10%, Grad Vukovar
Trajanje:	<p>Projekt će trajati 1 godinu. Priprema projekta (dokumentacije) zahtjeva također 1 godinu.</p>
Održivost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socijalno/demografska održivost: Projektom će se urediti sportska infrastruktura u gradu Vukovaru čime će se osigurati društveni sadržaj za građane koji će doprinijeti kvaliteti života nudeći im mjesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i poticati ih na zdrav i aktivan život. Na taj će se način posredno utjecati na stabilizaciju postojećeg broja stanovnika kroz osiguranje boljih uvjeta za život. 2. Financijska i upravljačka održivost: Financijska održivost će se procijeniti prema CBA. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, bit zadužena Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima koja će upravljati novim stadionom za što će se osigurati sredstva u proračunu s obzirom da se korištenje terena ne naplaćuje. Nova infrastruktura će ujedno biti i energetski učinkovitija te će se trošiti manje energenata što će smanjiti rashode grada. K tome, novi stadion moći će se davati u zakup (po tržišnim cijenama) za održavanje sportskih ili kulturnih (koncerti) sadržaja iz čega će se ostvariti dodatni financijski prihodi koji će se moći upotrijebiti za unaprjeđenje kvalitete (nova oprema, održavanje zgrade i sl.).

3. **Okolišna održivost:** projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije (solarni paneli).

Terminski plan provedbe projekta	2017				2018				2019
	QI	QII	QIII	QIV	QI	QII	QIII	QIV	QI
1. Izrada projektne dokumentacije		x	x	x	x				
Idejno rješenje		x	x						
Glavni projekt			x	x					
2. Ishođenje dozvola				x	x				
3. Priprema projektne prijave					x				
4. Razvoj infrastrukture						x	x		
5. Opremanje						x	x	x	
6. Razrada sadržaja							x	x	x
7. Promidžba i vidljivost						x	x	x	x
8. Upravljanje projektom						x	x	x	x
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja									

NAZIV PROJEKTA	Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu Intervencijskoga plana
Šifra projekta:	PP1
Lokacija projekta¹⁵	N/P
Vrsta projekta:	Horizontalni
Razvojni prioritet:	Ovaj projekt nije vezan uz provedbu pojedinog RP nego doprinosi učinkovitoj provedbi Intervencijskoga plana i preduvjet je za ispunjenje svih razvojnih ciljeva.
Opći cilj:	<p>Prostorni:</p> <p>Ulaganjem u razvojne projekte poslovne, društvene i turističke infrastrukture, povećati atraktivnost i povezanost gradskih naselja.</p> <p>Društveni:</p> <p>Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru i smanjiti iseljavanje stanovnika.</p> <p>Gospodarski:</p> <p>Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo Grada Vukovara.</p>
Specifični cilj:	Osigurati učinkovitu provedbu Intervencijskoga plana ulaganjem u izradu projektne (tehničke dokumentacije) i jačanje ljudskih resursa grada Vukovara.
Planska domena:	<p>Društvene djelatnosti</p> <p>Industrija i poduzetničko okruženje (gospodarstvo)</p> <p>Kultura i turizam</p>
Vrijednost:	<p>Grupa A: 8.747.125,00 HRK</p> <p>Grupa B: 3.000.000,00 HRK</p> <p>Ukupno: 11.747.125,00 HRK</p>

¹⁵ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Financiranje:	EFRR 85%, drugi nacionalni izvori 15%
Prijavitelj:	Grad Vukovar
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	<p>Grad Vukovar ima značajne kapacitete u pripremi i provedbi infrastrukturnih i razvojnih projekata, posebice zbog obnove infrastrukture koja je devastirana tijekom Domovinskog rata. Grad je do sada pripremao i provodio projekte u području komunalne infrastrukture, stambenih zgrada, javne infrastrukture raznih namjena i poslovne infrastrukture, te za takvu vrstu investicija postoje kapaciteti u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama.</p> <p>Izazov provedbe projekata unutar IP-a je u činjenici da će biti potrebni dostatni kapaciteti u upravljanju projektima financiranim ESIF sredstvima za koje grad nema dovoljan broj osposobljenog osoblja.</p> <p>Stoga je putem ovog projekta potrebno zaposliti nove i osposobiti postojeće kadrove za kvalitetnu i učinkovitu provedbu projekata iz Intervencijskoga plana.</p>
Partneri:	Vura d.o.o.
Ciljane skupine / krajnji korisnici	Ciljane skupine: Grad Vukovar (odjeli i zaposlenici), VURA d.o.o. (zaposlenici)
Zrelost projekta¹⁶:	Tehnička dokumentacija nije potrebna.
Investicijski ciklus projekta:	<p>Grupa A:</p> <p style="padding-left: 40px;">Priprema i provedba javne nabave za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrade studija izvedivosti (CBA) - Izrade projektne i tehničke dokumentacije <p>Grupa B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u gradu Vukovaru (5 osoba) 2. Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika) 3. Izrada strategija gospodarstva grada Vukovara
Provedbeni mehanizam:	Ograničeni poziv 9b1.2.1
Obrazloženje projekta	Kao preduvjet uspješne realizacije razvojnih projekata iz Intervencijskoga plana, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku

¹⁶ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

dokumentaciju, te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta grada Vukovara za provedbu IP-a.

Veliki broj infrastrukturnih projekata koji će se sufinancirati sredstvima EFRR-a na razini su projektne ideje, odnosno u vrlo ranoj fazi razvoja, te je kao prvi korak u njihovoj provedbi potrebno pripremiti svu potrebnu projektnu i tehničku dokumentaciju. To će, detaljnije definirano za svaki projekt ponaosob, uključivati:

Grupa A aktivnosti:

- **Priprema tehničke dokumentacije** uključujući idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme i projekt uklanjanja
- **Reguliranje potrebnih doprinosa** (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi za dobivanje dozvole za infrastrukturni projekt (glavni projekt))
- **Izrada Studija izvedivosti** i analiza troškova i koristi
- **Izrada natječajne dokumentacije** za nabavu radova, robe ili usluga
- **Izrada studije utjecaja na okoliš** gdje je to potrebno (uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode)
- **Razrada investicijskog ciklusa** (analiza postojeće dokumentacije, utvrđivanje dokumentacije potrebne za razvoj i provedbu projekta, procjena financijske vrijednosti projekta)
- **Izrada strateških i planskih dokumenata** (strategije, planovi, analize strategija, detaljni plan uređenja, poslovni planovi, marketing planovi i sl.) Izradit će se Strategija gospodarstva grada Vukovara koja će omogućiti planirani i strukturirani razvoj gospodarstva, novih ulaganja i trendova koji će privući što više privatnoga kapitala.
- **Ostala dokumentacija** i aktivnosti nužne za razvoj i početak provedbe projekta iz odobrenog Intervencijskog plana.
- Ostale usluge koje se tiču pripreme projektne dokumentacije (npr. revizija projekta)

Provedba Intervencijskoga plana podrazumijeva dostatne i kvalitetne upravljačke kapacitete na razini jedinice lokalne samouprave. Naime, grad će Vukovar biti nadležan za provedbu projekata u vrijednosti većoj od 25 milijuna eura u šestogodišnjem periodu. Uz to, biti će potrebno pratiti provedbu cijelog IP-a i voditi brigu o ispunjavanju njegovih pokazatelja. Izazov provedbe projekata unutar IP-a je u činjenici da će biti potrebni dostatni kapaciteti u upravljanju projektima financiranim ESIF sredstvima za koje grad nema dovoljan broj osposobljenog osoblja.

Stoga je putem ovog projekta potrebno zaposliti nove i osposobiti postojeće kadrove za kvalitetnu i učinkovitu provedbu projekata iz Intervencijskoga plana.

	<p>Grupa B aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukacije i srodne aktivnosti u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje Intervencijskim planom (edukacije iz područja upravljanja projektima, javne nabave, edukacije iz područja različitih alata za planiranje poput GIS sustava i sl.) • Savjetodavne usluge u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje Intervencijskim planom (aktivnosti praćenja i upravljanja projektima IP-a, provedbe javne nabave, uspostava i korištenje različitih alata za planiranje i provedbu lokalnih razvojnih projekata poput GIS i sl.) • Zapošljavanje novih zaposlenika kod prijavitelja i partnera za potrebe upravljanja Intervencijskim planom (predviđeno 5 novih osoba) • Izrada strategije gospodarstva grada Vukovara koja će omogućiti jačanje kapaciteta za planirani i strukturirani razvoj gospodarstva. • Revizija projekta
<p>Aktivnosti grupirane po EP:</p>	<p>EP1</p> <p>Grupa aktivnosti A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raspisivanje javne nabave za izradu projektne i tehničke dokumentacije. 2. Provedba ugovora o izradi projektne i tehničke dokumentacije. <p>EP2</p> <p>Grupa aktivnosti B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u gradu Vukovaru (5 osoba) 2. Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika) 3. Priprema i provedba javne nabave za pripremu strategije razvoja gospodarstva 4. Izrada strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara <p>EP 3 Upravljanje i administracija</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sastanci projektnog tima 2. Izvještavanje 3. Financijsko upravljanje projektom 4. Financijska revizija projekta
<p>Ključni rezultati:</p>	<p>R1: Izrađena projektne i tehničke dokumentacija za projekte Intervencijskoga plana</p>

	R2: Provedena nova zapošljavanja i angažirana tehnička pomoć R3: Izrađena strategija razvoja gospodarstva grada Vukovara																																																
Pokazatelji:	POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA: 6 projekata pripremljeno 10 djelatnika osposobljeno za voditelja projekata za EU fondove Osnaženi kapaciteti osoblja za provedbu IP-a Izrađen strateški dokument (1)																																																
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	Projektni tim: 1. Voditelj/ica projekta 100%, grad Vukovar 2. Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) 50%, grad Vukovar 3. Stručni suradnik za građevinske poslove – 10%, grad Vukovar 4. Stručnjak/inja za javnu nabavu 20%, grad Vukovar																																																
Trajanje:	<ul style="list-style-type: none"> • 31. prosinca 2019. godine za Grupu aktivnosti A, • 30. lipnja 2023. za Grupu aktivnosti B. 																																																
Održivost:	Stvoreni ljudski kapaciteti za provedbu kompleksnih programa i projekata, omogućit će gradu da ubuduće provodi veliki broj projekata financiranih ESIF sredstvima i poveća apsorpciju EU fondova.																																																
Terminski plan provedbe projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Terminski plan provedbe projekta</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priprema i provedba javne nabave za izrade studija izvedivosti</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Priprema i provedba javne nabave za izrade tehničke dokumentacije</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u gradu Vukovaru</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Izrada strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Terminski plan provedbe projekta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Priprema i provedba javne nabave za izrade studija izvedivosti	x	x	x					Priprema i provedba javne nabave za izrade tehničke dokumentacije	x	x	x					Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u gradu Vukovaru	x	x						Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)	x	x	x	x	x	x		Izrada strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara	x	x					
Terminski plan provedbe projekta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																										
Priprema i provedba javne nabave za izrade studija izvedivosti	x	x	x																																														
Priprema i provedba javne nabave za izrade tehničke dokumentacije	x	x	x																																														
Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u gradu Vukovaru	x	x																																															
Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)	x	x	x	x	x	x																																											
Izrada strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara	x	x																																															
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja																																																	

NAZIV PROJEKTA	Poziv na dostavu projektnih prijedloga za udruge i ustanove (bespovratna sredstva)
Šifra projekta:	1RP4
Lokacija projekta¹⁷	Područje grada Vukovara
Vrsta projekta:	Program dodjele bespovratnih sredstava
Razvojni prioritet:	1RP: Unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i modernizirati obrazovne sadržaje 3RP: Osnažiti postojeće i potaknuti razvoj novih MSP-a 4RP: Razvoj turizma temeljenog na valorizaciji prostora dviju rijeka u Gradu Vukovaru
Opći cilj:	RC2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru. RC3. Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo Grada Vukovara.
Specifični cilj:	Poboljšati društvene i socijalne usluge i sadržaje za bolju kvalitetu života građana Vukovara te povećati mogućnosti za zapošljavanje na području grada Vukovara. Povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, povećati razinu znanja i vještina poduzetnika i povećanje zapošljavanja
Planska domena:	<ul style="list-style-type: none"> • Industrija i poduzetničko okruženje, • Društvene djelatnosti
Vrijednost:	15 milijuna HRK
Financiranje:	ESF 85%, nacionalno sufinanciranje 15%
Posredničko tijelo razine 1:	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Korisnik:	Grad Vukovar
Potencijalni prijavitelji:	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacije civilnog društva • Zadruga • Ustanove • Grad Vukovar

¹⁷ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

	<ul style="list-style-type: none"> • Tijela javne vlasti • Vijeća nacionalnih manjina • Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište odnosno poslovni nastan na području grada Vukovara • Subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost • Potporne poduzetničke institucije • Fizičke osobe s registriranom kućnom/domaćom radinosti, sporednim zanimanjem i iznajmljivači obiteljskog smještaja
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<ul style="list-style-type: none"> • Nezaposleni • Korisnici mjera za poticanje zapošljavanja • Djeca i mladi • Branitelji • Polaznici programa obrazovanja (uključujući i obrazovanje odraslih) • Pripadnici nacionalnih manjina • Starije osobe • Osobe s invaliditetom • Korisnici minimalne zajamčene naknade
Zrelost projekta¹⁸:	<p>Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci.</p> <p>Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.</p> <p>Projekt je razvijen na programskoj razini.</p>
Provedbeni mehanizam:	Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Obrazloženje projekta	<p>Društvene djelatnosti imaju važnu ulogu za život stanovnika i u velikoj mjeri mogu utjecati na smanjenje depopulacije. U Gradu Vukovaru postoje dobro razvijene temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje, veliki broj aktivnih organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana. Ipak, uočavaju se slabosti određenih segmenata društvenog života i usluga: nedostatak razvijenih sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih te s tim povezano loša opremljenost predškolskih i školskih objekata u skladu sa suvremenim standardima, nepostojanje programa cjeloživotnog učenja koji bi pozitivno utjecali na tržište rada, nedostatne usluge za ranjive skupine itd. Isto tako, gospodarska kriza i nizak životni standard nepovoljno utječu na razvoj usluga u zajednici pa se predlaže korištenje dostupnih bespovratnih sredstava za poboljšanje socijalnih usluga u zajednici.</p> <p>Dobna struktura stanovništva prati opća negativna kretanja na vukovarskom području o čemu svjedoči i pad mlađe populacije, odnosno porast kod starijeg dijela</p>

¹⁸ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	<p>populacije u posljednja dva popisna razdoblja (2001./2011.). Uz nepovoljnu demografsku sliku, problem za tržište rada predstavlja i neusklađenost ponude i potražnje, odnosno nedovoljno kvalificirane radne snage za postojeće poslove. S druge strane, velik je broj dugotrajno nezaposlenih – posebice marginaliziranih skupina kao što su žene ili mladi. Gospodarstvo grada Vukovara devastirano je prvo razaranjima tijekom Domovinskog rata, a poslije dugogodišnjim propadanjem postojećih velikih gospodarskih subjekata na tome području. Malo i srednje poduzetništvo postoji, ali nije dovoljno razvijeno da bi bilo generator lokalnog razvoja. Stoga je potrebno ojačati postojeće poduzetnike kroz osiguravanje adekvatne poduzetničke infrastrukture i usluga, sufinanciranje planiranih investicija MSP-a i jačanje njihovih kompetencija. Isto tako, potrebno je, posebice među mladima, razvijati inicijativu za poduzetništvo te sufinancirati novoosnovana poduzeća.</p> <p>Ključni akteri koji bi mogli pozitivno utjecati na navedene probleme su ustanove, organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, poduzetnici i poduzetničke potporne institucije na području grada Vukovara. Dobra kapacitiranost navedenih aktera temelj je provedbe uspješnih programa i projekata u području obrazovnih, rekreacijskih, kulturnih, turističkih i socijalnih programa i usluga za građane, kao i temelj za stvaranje održivih radnih mjesta i poticanje razvoja gospodarstva na širem području grada.</p>
<p>Prihvatljive aktivnosti:</p>	<p>U okviru predloženog programa dodjele bespovratnih sredstava sljedeće aktivnosti se smatraju prihvatljivima. Lista aktivnosti nije konačna te prijavitelji mogu predložiti slične aktivnosti koje doprinose navedenim specifičnim ciljevima. Uz obvezne aktivnosti <i>Upravljanje projektom i administracija</i> te <i>Promidžba i vidljivost</i>, prihvatljive aktivnosti podijeljene su u 4 prioritetna područja kako slijedi:</p> <p>1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE / RAZVOJ IZVANINSTITUCIONALNIH SOCIJALNIH USLUGA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Organizacija pomoći u kući za starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć, b. Osiguravanje usluge osobne asistencije u okviru svakodnevnih aktivnosti osoba s invaliditetom, c. Organiziranje i rad dnevnih i poludnevnih boravaka ili klubova za osobe s invaliditetom i za starije osobe, d. Organizacija dodatnih sadržaja za djecu s poteškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju, e. Razvoj i organizacija aktivnosti volontiranja za socijalno isključene skupine, f. Razvoj kulturnih, društveno-korisnih te sportskih aktivnosti za socijalno isključene skupine,

- g. Razvoj mreže pružatelja socijalnih usluga i jačanje njihovih kapaciteta,
- h. Razvoj i/ili provedba postojećih ili novih socijalnih usluga,
- i. Radionice za poticanje socijalne uključenosti usmjerene posebice na osobe s invaliditetom i dugotrajno nezaposlene osobe.

2. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

- a. Unaprjeđenje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada uz promociju cjeloživotnog učenja,
- b. Razvoj i provedba individualiziranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljne skupine,
- c. Aktivnosti razvoja i pružanja individualiziranih radionica za razvoj socijalno-interpersonalnih vještina potrebnih za podizanje razine zapošljivosti,
- d. Razvoj i uvođenje novih obrazovnih programa za potrebe razvoja turističko – ugostiteljske djelatnosti,
- e. Poticanje samozapošljavanja kroz razvoj poslovnih planova, edukacije o poduzetništvu, pomoć pri pokretanju poslovanja i marketingu i sl.,
- f. Aktivnosti osposobljavanja nezaposlenih osoba ciljanih skupina za turističkog vodiča/pratioca,
- g. Razvoj aktivnosti usmjerenih na profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere.

3. POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH VJEŠTINA I DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

- a. Razvoj programa poticanja razvoja poduzetničkih vještina i društvenog poduzetništva,
- b. Poticanje i organiziranje društvenog poduzetništva kao oblika zapošljavanja ciljanih skupina,
- c. Promidžba poduzetništva i obrtništva,
- d. Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika,
- e. Poticanje osmišljavanja i izrade novih proizvoda domaće radinosti
- f. Razvoj novih vještina,
- g. Osiguranje sredstava za stručno osposobljavanje fizičkih osoba koje se bave kućnom/domaćom radinosti,
- h. Poticanje uslužnih djelatnosti,
- i. Polaganje majstorskog ispita ili ishođenje uvjerenja o osposobljenosti,
- j. Povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,
- k. Postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti obiteljskog smještaja,
- l. Promidžba obiteljskog smještaja i njihova specijalizacija za različite ciljne skupine.

4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

- a. Promicanje volonterizma i volonterskog rada u zajednici,

	<ul style="list-style-type: none"> b. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihove usluge u lokalnoj zajednici, c. Razvoj i podržavanje partnerskih inicijativa između javnih/privatnih organizacija i organizacija civilnog društva, d. Aktivnosti regeneracije kroz društveno koristan rad i participaciju građana u svrhu doprinosa kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara, e. Podrška udrugama u razvoju i implementaciji novih sadržaja i aktivnosti za aktivno uključivanje građana u zajednicu, f. Razvoj i organizacija sadržaja za promociju aktivnog starenja, g. Promicanje zdravih stilova života za sve dobne skupine.
Ključni rezultati:	<p>R1: Provedeno minimalno 70 aktivnosti socijalnog uključivanja ciljanih skupina Razvijene 4 izvaninstitucionalne socijalne usluge</p> <p>R2: Provedeno minimalno 30 aktivnosti usmjerenih obrazovanju i osposobljavanju ciljanih skupina Ojačane kompetencije 80 pripadnika ciljanih skupina</p> <p>R3: Provedeno minimalno 20 aktivnosti poticanja razvoja poduzetničkih vještina i društvenog poduzetništva</p> <p>R4: Provedeno minimalno 20 aktivnosti usmjerenih razvoju civilnog društva Ojačani kapaciteti minimalno 10 organizacija civilnog društva</p>
Pokazatelji:	<p>ESF POKAZATELJI NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene ➤ Mlađi od 25 godina ➤ stariji od 54 godine ➤ Sudionici s invaliditetom ➤ Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje ➤ Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja ➤ Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju ➤ Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina <p>POKAZATELJI REZULTATA PROJEKTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Broj razvijenih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga ➤ Broj volontera uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva ➤ Broj organizacija civilnog društva uključenih u aktivnosti podizanja kapaciteta

Trajanje:	Do iskorištenja sredstava.
Održivost:	Financiranje rezultata projekta nakon njegovog završetka osigurat će organizacije i institucije koje će provoditi projekte i to iz vlastitih sredstava, sredstava JLS i EU fondova. Očekuje se da će kreirane usluge i programi biti dalje provođeni od strane organizacija koje su zadužene za provedbu projekata te da će razina kompetencija za provedbu istih kao i za traženje sredstava za njihovu održivost biti na adekvatnoj razini.
Terminski plan provedbe projekta	Priprema projekta/natječajne dokumentacije: 12 mjeseci Raspisivanje natječaja/Ugovaranje: 6 mjeseci Provedba projekata: do 31.12.2021.g.
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja	

NAZIV PROJEKTA	Izravna dodjela potpore zapošljavanju
Šifra projekta:	3RP2
Lokacija projekta¹⁹	Područje grada Vukovara
Vrsta projekta:	Program dodjele bespovratnih sredstava
Razvojni prioritet:	3RP: Osnažiti postojeće i potaknuti razvoj novih MSP-a
Opći cilj:	RC2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom, društvenim programima za ranjive skupine (djeca, mladi, nacionalne manjine, umirovljenici, branitelji) i povećanjem mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje povećati kvalitetu života u Vukovaru. RC3. Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo Grada Vukovara.
Specifični cilj:	Povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti i povećati zapošljavanja
Planska domena:	<ul style="list-style-type: none"> • Industrija i poduzetničko okruženje, • Društvene djelatnosti
Vrijednost:	15 milijuna HRK
Financiranje:	ESF 85%, nacionalno sufinanciranje 15%
Posredničko tijelo razine 1:	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Korisnik:	Grad Vukovar
Potencijalni prijavitelji:	<ul style="list-style-type: none"> • Mala i srednja poduzeća • Nezaposlene osobe
Ciljane skupine / krajnji korisnici	<ul style="list-style-type: none"> • Nezaposleni • Korisnici mjera za poticanje zapošljavanja • Branitelji • Pripadnici nacionalnih manjina • Osobe s invaliditetom •

¹⁹ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Zrelost projekta²⁰:	<p>Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci.</p> <p>Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.</p> <p>Projekt je razvijen na programskoj razini.</p>
Provedbeni mehanizam:	Izravna dodjela bespovratnih sredstava
Obrazloženje projekta	<p>Dobna struktura stanovništva prati opća negativna kretanja na vukovarskom području o čemu svjedoči i pad mlađe populacije, odnosno porast kod starijeg dijela populacije u posljednja dva popisna razdoblja (2001./2011.). Uz nepovoljnu demografsku sliku, problem za tržište rada predstavlja i neusklađenost ponude i potražnje, odnosno nedovoljno kvalificirane radne snage za postojeće poslove. S druge strane, velik je broj dugotrajno nezaposlenih – posebice marginaliziranih skupina kao što su žene ili mladi. Gospodarstvo grada Vukovara devastirano je prvo razaranjima tijekom Domovinskog rata, a poslije dugogodišnjim propadanjem postojećih velikih gospodarskih subjekata na tome području. Malo i srednje poduzetništvo postoji, ali nije dovoljno razvijeno da bi bilo generator lokalnog razvoja. Stoga je potrebno ojačati postojeće poduzetnike kroz osiguravanje adekvatne poduzetničke infrastrukture i usluga, sufinanciranje planiranih investicija MSP-a i jačanje njihovih kompetencija. Isto tako, potrebno je, posebice među mladima, razvijati inicijativu za poduzetništvo te sufinancirati novoosnovana poduzeća.</p>
Prihvatljive aktivnosti:	<p>U okviru predloženog programa dodjele bespovratnih sredstava sljedeće aktivnosti se smatraju prihvatljivima. Lista aktivnosti nije konačna te prijavitelji mogu predložiti slične aktivnosti koje doprinose navedenim specifičnim ciljevima.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje, 2. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih osoba, 3. Potpore za novo zapošljavanje.
Ključni rezultati:	<p>R1. Otvoreno 30 novih radnih mjesta</p> <p>R2. Minimalno 15 osoba zadržalo posao 12 mjeseci nakon izlaska iz mjere poticanja zapošljavanja</p> <p>R2. Dodijeljeno 20 potpora za zapošljavanje</p>
Pokazatelji:	<p>ESF POKAZATELJI NEPOSREDNIH REZULTATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene ➤ Mlađi od 25 godina

²⁰ Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ stariji od 54 godine ➤ Sudionici s invaliditetom ➤ Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
Trajanje:	Do iskorištenja sredstava
Održivost:	Financiranje rezultata projekta nakon njegovog završetka osigurat će organizacije i institucije koje će provoditi projekte i to iz vlastitih sredstava, sredstava JLS i EU fondova
Terminski plan provedbe projekta	<p>Priprema projekta/natječajne dokumentacije: 12 mjeseci</p> <p>Raspisivanje natječaja/Ugovaranje: 6 mjeseci</p> <p>Provedba projekata: do 31.12.2021.g.</p>
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja	

NAZIV PROJEKTA	Otvoreni poziv na dostavu projektnih ideja za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima
Šifra projekta:	3RP3
Lokacija projekta²¹	Područje grada Vukovara
Vrsta projekta:	Program dodjele bespovratnih sredstava
Razvojni prioritet:	3RP: Osnažiti postojeće i potaknuti razvoj novih MSP-a
Opći cilj:	RC3.Ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potpore poduzetnicima stvoriti konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo Grada Vukovara.
Specifični cilj:	Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz ulaganja u infrastrukturu i unaprjeđenje usluga i proizvoda
Planska domena:	<ul style="list-style-type: none"> • Industrija i poduzetničko okruženje • Turizam
Vrijednost:	<p>LOT 1: 5 mil.kn</p> <p>LOT 2: 5 mil.kn</p> <p>UKUPNO: 10 mil.kn</p>
Financiranje:	<p>LOT 1: min. 5.000 kn – max. 200.000 kn (de minimis)</p> <p>Sufinanciranje: 85% EFRR</p> <p>LOT 2: min 200.000 kn – max. 2.000.000 kn (regionalne potpore)</p> <p>Sufinanciranje: 45% mala poduzeća</p> <p>35% srednja poduzeća</p>
Prijavitelj:	MSP i obrti sa područja grada Vukovara
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	np
Partneri:	np

²¹ Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

Ciljane skupine / krajnji korisnici	MSP i obrti sa područja grada Vukovara
Zrelost projekta²²:	Projekt je razvijen na programskoj razini. Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije. Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci.
Investicijski ciklus projekta:	np
Provedbeni mehanizam:	Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Obrazloženje projekta	<p>Pokazatelj indeksa razvijenosti postavlja Grad Vukovar, s indeksom od 70,63%, u II. Skupinu po razvijenosti.</p> <p>Gospodarstvo na području Vukovara gotovo je u potpunosti bilo uništeno uslijed ratnih razaranja, a gospodarske su štete iznosile 4,6 mlrd. Kn. Osnovni problemi nakon rata odnosili su se na nemogućnost otplate dugova te na gubitak dijela tržišta uslijed novonastale gospodarske situacije. Ne mogavši pratiti suvremene razvojne trendove pojavili su se i problemi zastarjelosti opreme te nedostatak educiranih stručnjaka. Osnovni gospodarski pokazatelji ukazuju kako se u posljednjih nekoliko godina na vukovarskom području uočava postupan oporavak, uključujući i porast broja poduzeća, ali primjetan je i negativan trend kod zaposlenih osoba čiji se broj smanjuje po prosječnoj godišnjoj stopi od -5,58%. U 2014. godini na vukovarskom je području bilo registrirano 408 tvrtki s 4.101 zaposlenikom dok je ukupan broj nezaposlenih iznosio 2.803.</p> <p>Vukovarsko obrtništvo na širem području Grada (Vukovar, Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja) bilježi kontinuirani pad unatoč tome što je poznato po izrazito dugoj tradiciji. Od 785 obrta koliko ih je bilo registrirano 2010. godine, trenutno ih posluje svega 430 što predstavlja smanjenje broja obrta za visokih 45,2%.</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	np
Ključni rezultati:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povećani proizvodni kapaciteti i poslovna konkurentnost poduzetnika na području Vukovara 2. Pripremljena infrastruktura za razvoj novoosnovanih poduzeća 3. Podignuta razina opremljenosti i kompetentnost obrtnika za kvalitetniji nastup na tržištu 4. Nadopunjena i dodatno razvijena turistička ponuda
Pokazatelji:	EFRR POKAZATELJI NEPOSREDNIH REZULTATA:

²² Upišite jednu od ove tri izjave uz pojašnjenje dokumentacije: za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci; za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; tehnička dokumentacija je spremna

	40 poduzetnika primilo potporu
Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulaganje u materijalnu imovinu 2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu 3. Ulaganje u marketing i promociju proizvoda 4. Ulaganje u edukaciju 5. Savjetodavne usluge neophodne za projekt
Prihvatljivi troškovi:	<ul style="list-style-type: none"> - troškovi gradnje/rekonstrukcije poslovnih prostora - troškovi novih strojeva, postrojenja i opreme - troškovi uređenja i opremanja objekta/radionice - troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) - troškovi nabave patenata, autorskih prava i sl. - troškovi marketinških aktivnosti - troškovi usavršavanja - troškovi upravljanja projektom, provedbe nabave, revizije projekta, nadzor gradnje <p>(detaljno će prihvatljivi troškovi biti opisani u Uputama za prijavitelje)</p>
Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):	np
Trajanje:	Do iskorištenja sredstava
Održivost:	Sve zaprimljene projektne prijave moraju dokazati sve elemente održivosti.
Terminski plan provedbe projekta	<p>Priprema projekta/natječajne dokumentacije: 6 mjeseci</p> <p>Raspisivanje natječaja/Ugovaranje: 6 mjeseci</p>
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja	

III.3 UPRAVLJANJE

III.3.1 Odgovornosti u provedbi IP-a

Ključna tijela u provedbi

Sustav upravljanja i kontrole programa oslanja se na raspodjelu funkcija i odgovornosti koje su za nacionalnu razinu okvirno definirane Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014) i relevantnim Uredbama o tijelima u sustavima upravljanja za pojedine fondove, odnosno ciljeve. U odnosu na Operativni program „Kohezija i konkurentnost“ i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, relevantna je Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem *Ulaganje za rast i radna mjesta* (NN 107/2014, 23/2015).

Detaljna podjela odgovornosti između upravljačkih tijela i gradova nositelja IP-a regulirat će se internim aktima dvaju ministarstava koja vrše funkciju upravljačkih tijela te tripartitnim **sporazumima o provedbi intervencijskih planova**.


Upravljačko tijelo (UT) za OPKK je MRRFEU, dok OPULJP-om upravlja MRMS.

Prema gore spomenutoj Uredbi (NN 107/2014, 23/2015), za provedbu specifičnog cilja OPKK 9b1 *Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva* nadležno posredničko tijelo prve razine (PT1) je također sam MRRFEU. Tu funkciju u MRRFEU vrši Uprava za regionalni razvoj koja ima ulogu koordinatora Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije, kako prema MRMS, tako i spram gradova nositelja IP-ova. Funkciju posredničkog tijela razine 2 (PT2) za cilj 9b1 vrši Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU). Za cilj 9.i.2 OPULJP-a (*Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja*) funkciju posredničkog tijela prve razine vrši također sam MRMS, dok je za provedbu na razini PT2 nadležan Hrvatski Zavod za zapošljavanje (HZZ).

Uloga Upravljačkih tijela (MRRFEU/MRMS) u provedbi IP-a:

- priprema i objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za portfelj projekata IP-a, uključujući aktivnosti informiranja i komunikacije na nivou Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije
- sufinanciranje provedbe IP-a u skladu s pravnim okvirom za korištenje ESI fondova
- uspostava i upravljanje radom koordinacijskog tijela Programa – Koordinacijskog odbora, koji će koordinirati i sustavno pratiti provedbu IP-a
- pružanje informacija nositelju intervencijskog plana (Gradu) o tijeku provedbe projekata za koje on nije ujedno i korisnik projekta, a u svrhu upravljanja i izvještavanja o napretku u provedbi IP-a u cjelini
- praćenje izvršenja ciljeva i pokazatelja IP-a, te upravljanje i kontrola nad eventualnim izmjenama planova provedbe IP-a u suradnji s gradovima

Glavni instrument koordinacije tijekom provedbe je **Koordinacijski odbor Programa**, čiji pridruženi članovi su i predstavnici 5 pilot područja, tj. gradova nositelja IP-ova.

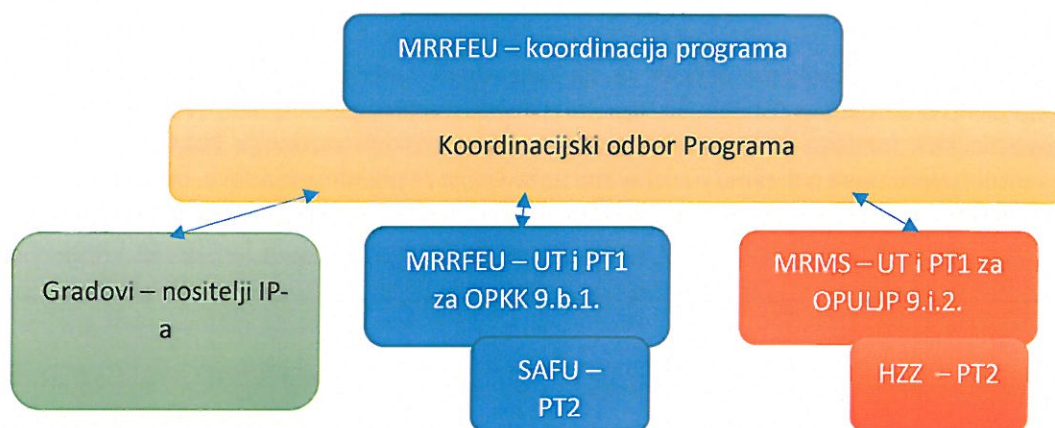

Grad Vukovar

Kao nositelj IP-a, Grad Vukovar na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom snosi odgovornost za provedbu svih projekata unutar Akcijskog plana te odgovornost za ostvarenje pokazatelja na razini razvojnih ciljeva i prioriteta.

Kao nositelj IP-a, Grad će imati sljedeće odgovornosti:

- sustavno prikupljanje i obrada podataka o napretku provedbe IP-a, praćenje fizičkog i financijskog napretka provedbe projekata za koje je grad korisnik kao i za IP u cjelini
- izvještavanje o provedbi IP-a prema Koordinacijskom odboru i Partnerstvu za IP
- predlaganje izmjena i/ili dopuna Akcijskog plana – Plana praćenja u konzultaciji s Partnerstvom za IP
- sustavno izgrađivanje sposobnosti, posebnih znanja i vještina djelatnika koji rade na poslovima provedbe i praćenja provedbe IP-a
- provođenje mjera informiranja i vidljivosti za IP
- prema potrebi sudjelovanje u radu Koordinacijskog odbora

U provedbi pojedinačnih projekata, Grad, ali i drugi potencijalni nositelji projekata nadležni su za:

- ispravna i pravovremena priprema projektnih prijedloga i prijava na pozive
- upravljanje individualnim projektima u skladu s uvjetima ugovora (financijski i tehnički management)

- praćenje i ocjenu izvršenja projekta te izvještavanje prema PT2

Na razini pojedinih projekata sve gore navedene funkcije Grada i drugih korisnika/nositelja projekata bit će operacionalizirane u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i u obliku detaljnih planova rada.

Stvaranje mreže suradničkih institucija je dio šire uloge informiranja i promidžbe koju Grad ima, a koja je naročito važna. Naime, Grad zbog svojih zakonom određenih ovlasti ima mogućnost prikupljanja i pristupa informacijama koji dugima nisu dostupni, pa stoga nosi i odgovornost za kanaliziranje informacija i/ili projektnih ideja. Ovo uključuje i potporu potencijalnim korisnicima ugovora o bespovratnim sredstvima koji će se provoditi u sklopu IP-a.

Jedinica za IP operativno je zadužena za izvođenje svih gore navedenih funkcija Grada u odnosu na provedbu i praćenje Intervencijskoga plana. Tijekom pripreme IP-a, JIP Grada Vukovara bio je sastavljen od zaposlenika Grada i razvojne agencije VURA d.o.o, čiji je Grad osnivač. JIP je za obavljanje svojih funkcija u ime Grada odgovorna gradonačelniku. Gradonačelnik imenovanja i zaduženja članova JIP-a definira Odlukom (aktualna odluka o imenovanju članova donesena je 18.02.2016), koja će se, sukladno odredbama Sporazuma o provedbi IP-a i provedenoj analizi radnoga opterećenja te planu zapošljavanja, po potrebi revidirati.

Partnerstvo za IP koje je osnovano na početku procesa pripreme IP-a, a čine ga relevantni dionici, bit će uključeno u praćenje provedbe IP-a. PIP sudjeluje u praćenju provedbe IP-a kao savjetodavno tijelo, redovito zaprimajući izvješća o provedbi IP-a.

Ostali dionici uključeni u proces organizacije i odgovornosti za provedbu individualnih projekata

Za provedbu individualnih razvojnih projekata Grad Vukovar uključit će i operativna tijela kao što su upravni odjeli Grada, različite lokalne javne institucije i poduzeća. U svakom projektom prijedlogu definirana su tijela koje će upravljati aktivnostima i nabavom kao nositelj i/ili kao partner.

III.3.2 Organizacija i odgovornosti za provedbu individualnih projekata

Intervencijski plan provodit će se kao niz projekata/operacija. Pojedinačni projekti potencijalno će se sastojati od jednog ili više ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Njihov odabir provodit će UT-i posredstvom svojih posredničkih tijela, i to dvama ključnim provedbenim mehanizmima:

1. **Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga** – mehanizam namijenjen u IP-u već identificiranim projektima (projekti u portfelju), kod kojih su korisnici definirani u samome IP-u i stoga će poziv biti ograničen na njih. Uz projekte iz portfelja, priprema tehničke dokumentacije i izgradnja kapaciteta koji će Gradu omogućiti da financira pripremu projektne dokumentacije te ojača kapacitete za provedbu IP-a također će se implementirati ograničenim pozivom na dostavu.
2. **Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga** - mehanizam poziva na dostavu prijedloga prvenstveno namijenjen onim IP projektima čiji korisnici nisu unaprijed definirani u IP-u.

III.3.3 Plan praćenja provedbe IP-a i održivost projektnih rezultata

Praćenje obuhvaća financijski i fizički napredak provedbe IP-a. Svrha praćenja jest provjeriti je li provedba IP-a – mjerena pomoću nekoliko vrsta i razina pokazatelja – u skladu s predviđenim planom provedbe te hoće li prethodno postavljen skup ciljeva biti ispunjen u planiranom opsegu i vremenu.

Za Intervencijske planove, praćenje provedbe provodite će se na trima razinama:

- **Projektna razina:** korisnik (potpisnik ugovora) prema PT2 (SAFU za projekte OPKK i HZZ za OPULJP). Izvještavanje na ovoj razini definirano je ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
- **Programska (IP) razina:** Grad je obveznik izvještavanja Koordinacijskom odboru Programa, kojeg čine predstavnici MRRFEU i MRMS i svi uključeni gradovi, ali i prema svojem partnerstvu za IP. Obaveze, frekvencija i formati izvješća za ovu razinu izvještavanja bit će definirani Sporazumom o provedbi IP-a. Za funkciju izvještavanja u Gradu nadležan je JIP.
- **Razina OP-a:** ustrojstvene jedinice unutar MRRFEU i MRMS (jedinice koje obavljaju funkcije PT1, prema upravljačkim tijelima, uključujući i prema Odborima za praćenje OP-ova i ultimativno Europskoj komisiji). Izvještavanje na ovoj razini definirano je Pravilnicima o postupanju MRRFEU i MRMS.

Sustav praćenja IP-a obuhvatit će sljedeće korake:

Plan praćenja

Plan praćenja izrađivat će se na godišnjoj razini kao dio Akcijskog Plana (prilog IP-u). Obuhvatit će popis planiranih projekata, pokazatelje provedbe, zaduženja oko prikupljanja podataka i izvještavanja, dinamiku izvedbe praćenja te troškove aktivnosti praćenja.

Objektivno provjerljivi pokazatelji

Praćenje se provodi unutar definiranog okvira za praćenje provedbe, što podrazumijeva uspostavu sustava kvantificiranih pokazatelja i odgovarajućih izvora provjere kojima utvrđujemo jesu li sadržaj i proces realizirani u sklopu zadanih razvojnih prioriteta. Pokazatelji u IP-u definirani se na razini učinka, rezultata/neposrednih rezultata i ostvarenja IP-a, čime se omogućuje uvid u napredak na operativnoj razini, ali i stanje provedbe u okviru dugoročne realizacije IP-a. Pokazatelji na razini ciljeva imaju dugoročnu dimenziju i prikazuju ciljane vrijednosti do kraja 2023. godine, što znači da će stvarnu ocjenu uspješnosti biti moguće odrediti tek nakon završene konačne evaluacije, odnosno nakon isteka planiranog provedbenog perioda.

Prikupljanje, obrada i analiza podataka o provedbi projekata IP-a

Ovaj korak u procesu praćenja obuhvaća prikupljanje podataka o provedbi razvojnih prioriteta, odnosno projekata koji su dio Akcijskog plana. Podaci će od nositelja projekata tijekom provedbe prikupljati JIP te će ih sistematizirati i analizirati u skladu s Planom praćenja. Ova aktivnost provodit

će se kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe IP-a. Metode za prikupljanje podataka uključit će:

- prikupljanje podataka kroz sustav izvještavanja na razini projekta (korisnici izvještavaju prema JIP-u, koji prikuplja podatke),
- sistematizaciju i analizu podataka iz provedbe projekata u Gradu, tj. JIP-u,
- analizu izvješća o provedbi, razgovore s dionicima i ciljanim skupinama i prikupljanje i analizu podataka iz formalnih izvora podataka i/ili evidencije različitih institucija uključenih u provedbu (u nadležnosti JIP-a).

Izvještavanje o provedbi

Podaci o provedbi će se nakon analize strukturirati u izvješća o napretku provedbe IP-a, koja će Jedinica za IP slati na pregled i odobrenje Koordinacijskom odboru za provedbu IP-a, a prethodno na uvid i odobrenje PIP-u. Izvješća će biti podloga za procjenu uspjeha IP-a te donošenje odluka o potencijalnim korektivnim mjerama te daljnjoj provedbi razvojnih smjerova. Jednom godišnje, izvještaj o provedbi IP-a (na kraju kalendarske godine) bit će prezentiran Partnerstvu kako bi se dobilo mišljenje i potpora za daljnju provedbu.

Detaljni plan i dinamika izvještavanja, kao i propisani obrasci, bit će sastavni dio Sporazuma o provedbi IP-a.

Izmjene Intervencijskoga plana

Tijekom provedbe Intervencijskoga plana bit će moguće izmjene plana na način da se ne mijenja definirani strateški okvir, nego po potrebi plan provedbe (relevantno poglavlje dokumenta) i Akcijski plan. Detaljni uvjeti i procedure za izmjenu IP-a biti će definirane u **Sporazumu o provedbi IP-a**.

III.3.4 Kapaciteti za provedbu

Jedinica za IP grada Vukovara osnovana je sa zadatkom izrade Intervencijskoga plana. Tijekom pripreme IP-a činilo ju je 6 zaposlenika Grada Vukovara i razvojne agencije grada VURA d.o.o., a njihove kompetencije pokrivaju sve relevantne sektore Intervencijskoga plana (poduzetništvo, društvene djelatnosti, izgradnja, komunalna infrastruktura, turizam).

Provedba IP-a podrazumijeva značajne kapacitete na razini nositelja IP-a i tu u područjima:

- Pripreme projekata
- Upravljanja projektima (poznavanje ESIF procedura)
- Financijskog upravljanja projektima
- Izvještavanja na razini projekata
- Praćenja i izvještavanja na razini Intervencijskoga plana
- Sektorska znanja za svaki projekt

Stoga su u provedbi IP-a za rad u u JIP-u temeljem preliminarne analize radne opterećenosti (vidi tablicu niže) predviđene sljedeće funkcije:

- A) U provedbi pojedinačnih projekata
 - Voditelji/ce projekta (4 izvršitelja)
 - Koordinator/ce radova (3 izvršitelja)
 - Projektni asistenti/ce (3 izvršitelja)
 - Financijsko-računovodstveni referent/ica (1 izvršitelj)
 - Stručnjak/inja za javnu nabavu (1 izvršitelj)
 - Koordinator/ica za promidžbu i vidljivost (1 izvršitelj)
 - Sektorski stručnjaci/kinje (po pojedinačnim projektima, ukupno do maksimalno 2 ekvivalenta punog radnog vremena)
- B) U provedbi IP-a (funkcije koordinacije i praćenja provedbe):
 - Stručnjak/inja za praćenje i izvještavanje (1 izvršitelj)
 - Sektorski stručnjak/inja za MSP (ekvivalent 0.5 punog radnog vremena)
 - Sektorski stručnjak/inja za ESF (ekvivalent 0.5 punog radnog vremena)

Prema preliminarnoj analizi radnoga opterećenja, broj izvršitelja trebao bi narasti do maksimalno 17, no točan broj, kao i omjer osoblja koje postoji u Gradu te ga treba funkcionalno preusmjeriti na provedbu funkcija JIP-a i onog koje će biti trajno ili privremeno angažirano sredstvima iz IP-a ili dodatnim zapošljavanjem o trošku Grada, utvrdit će se tijekom provedbe IP-a Planom zapošljavanja.

Postojeća Jedinica za IP dobra je polazišna točka u stvaranju kapaciteta za provedbu IP-a, te tehnička pomoć predlaže njihovo zadržavanje, međutim, njihovi postojeći kapaciteti nisu dostatni te ih je potrebno značajno ojačati. Plan zapošljavanja bit će izrađen temeljem analize radne opterećenosti i analize postojećih kapaciteta i poslužiti kao osnova za planiranje dodatnog zapošljavanja u okvirima horizontalnog projekta IP-a „Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana“. Kroz horizontalni projekt, bit će dostupna sredstva gradu Vukovaru za jačanje kapaciteta i stvaranje kvalitetnog i dobro kapacitiranog tima za provedbu IP-a.

Jačanje kapaciteta za aktivnosti pripreme i provedbe projekata, te praćenja provedbe IP-a, mogu uključivati:

- Imenovanje postojećih zaposlenika Grada i VURE u JIP;
- Zapošljavanje novih osoba u Gradu i VURI i njihovo imenovanje u JIP;
- Edukacija i jačanje kapaciteta svih članova JIP-a.

Preliminarna analiza radne opterećenosti za provedbu IP Vukovar pripremljena je na temelju detaljnih projektnih obrazaca u kojima je opisan projektni tim, te vremenskoga plana provedbe IP-a. U pripremi horizontalnog projekta, tablica će biti dodatno revidirana, uz diferencijaciju postojećih i potrebnih kapaciteta i poslužiti će kao temelj za plan zapošljavanja i pripremu horizontalnog projekta. Tablica koja slijedi sumira broj i količinu pozicija potrebnih za provedbu IP-a:

PROJEKTNA RAZINA	Brej osoba ukupn o	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023									
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q						
Voditelj/ica projekta	4	2.8	3.5	4.3	3.5	4.2	5.6	5.3	5	4.4	4.4	2.9	2	2	2	2	2	1																	
Koordinator/ica radova	3	0	1.4	1.9	1.7	2.2	4.6	4.1	4.3	4.4	4.4	2.4	2	2	2	2	2	1																	
Projektni asistent/ica	3	1.2	2.1	2.6	1.7	2.2	4.6	4.1	4.3	4.4	4.4	2.4	2	2	2	2	2	1																	
Financijsko-računovodstveni referent/ica	1	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.2	0.9	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2																	
Stručnjak/inja za javnu nabavu	1	0.8	0.8	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.3	0.9	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2																	
Koordinator/ica za promidžbu i vidljivost	1	0.5	1.1	1.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0																	
Sektorski stručnjaci (turizam, znanost, civilno društvo, sport, obrazovanje)	0.5		2	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0																	
RAZINA IP-a																																			
Stručnjak za praćenje i izvještavanje	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Sektorski stručnjak za MSP (bespovratna sredstva)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5										
Sektorski stručnjak za ESF (bespovratna sredstva)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5										

PRILOZI

PRILOG 1: ANALIZA PODRUČJA GRADA VUKOVARA

PRILOG 2: POSTER PLAN GRADA VUKOVARA

PRILOG 3: AKCIJSKI PLAN IP-A GRADA VUKOVARA

Sadržaj intervensijskog plana isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Vukovara.

Više o ESI fondovima na stranicama www.razvoj.gov.hr i portalu www.strukturnifondovi.hr

II.

Ovaj Intervencijski plan stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 302-01/15-01/11
URBROJ: 2196/01-01-17-26
Vukovar, 22. veljače 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

1 Igor Gavrić, mag.ing.



